

## **INDICADORES DA SPRINT**

		202	313			202	401	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	133h00m	160h00m	176h00m	143h20m	287h12m	388h00m	388h00m	388h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	135h22m	169h48m	185h42m	164h19m	319h24m	419h37m	404h52m	409h44m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	109h50m	124h55m	102h10m	52h05m	227h42m	315h30m	315h30m	314h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	88h55m	116h42m	114h30m	96h17m	214h56m	276h53m	278h49m	288h03m
05. Pontos planejados	25,0	48,0	43,0	30,5	68,0	65,0	68,0	81,0
06. Pontos entregues	16	52	33,5	32,5	67,5	101	51,5	118
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	9,00	45,50	30,00	22,50	54,50	78,00	36,50	92,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	7,00	6,50	3,50	10,00	13,00	23,00	15,00	26,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	5	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	4	9	9	6	19	22	10	23
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	6	4	2	3	12	18	12	22
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	2	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	0	0	2,5	0
15. Produtividade planejada	0,228	0,385	0,421	0,586	0,299	0,207	0,216	0,258
16. Produtividade realizada	0,180	0,446	0,293	0,338	0,315	0,365	0,185	0,410
17. % Pontos NP / Pontos entregues	43,8	12,5	10,5	30,8	19,3	22,8	29,2	22,1

PROD - Produtividade

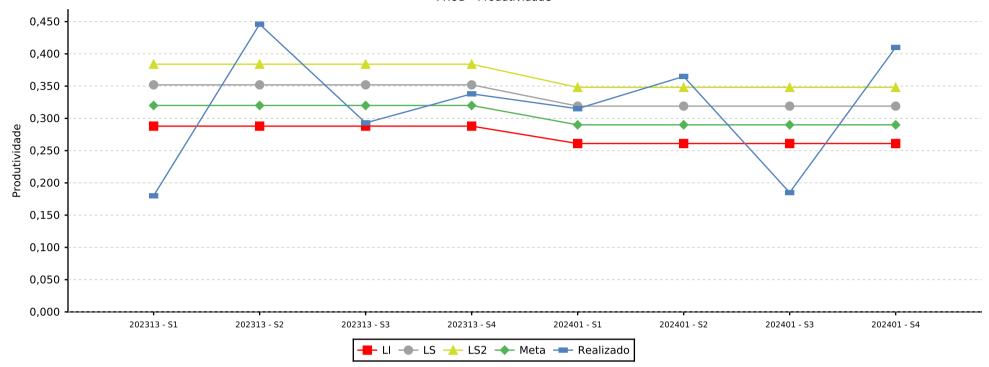


		202	313			202	401	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,180	0,446	0,293	0,338	0,315	0,365	0,185	0,410
Meta	0,320	0,320	0,320	0,320	0,290	0,290	0,290	0,290
LS2	0,384	0,384	0,384	0,384	0,348	0,348	0,348	0,348
LS	0,352	0,352	0,352	0,352	0,319	0,319	0,319	0,319
LI	0,288	0,288	0,288	0,288	0,261	0,261	0,261	0,261

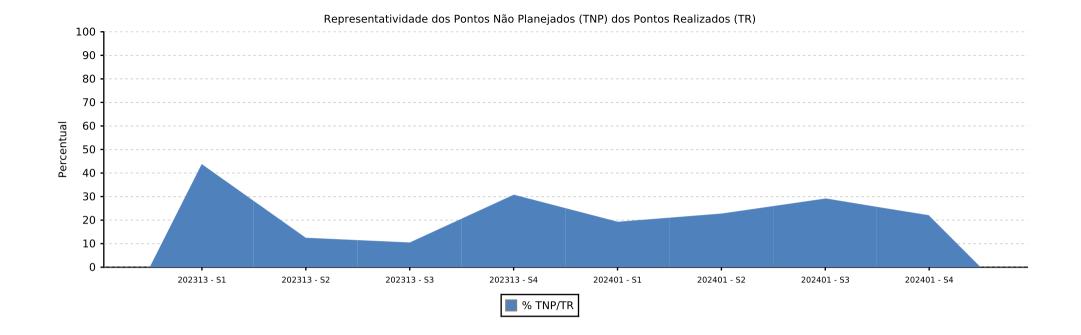


		202	313			202	401	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	16	52	33.5	32.5	67.5	101	51.5	118
TNP - Pontos Não Planejados	7	6.5	3.5	10	13	23	15	26
% TNP/TR	43,8	12,5	10,5	30,8	19,3	22,8	29,2	22,1

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

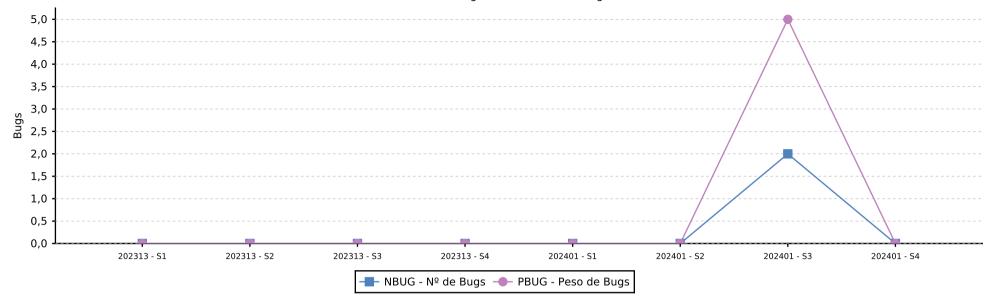

		202	313			202	401	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	0	0	2	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	5	0
Pontos Entregues	16	52	33.5	32.5	67.5	101	51.5	118
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	0,00

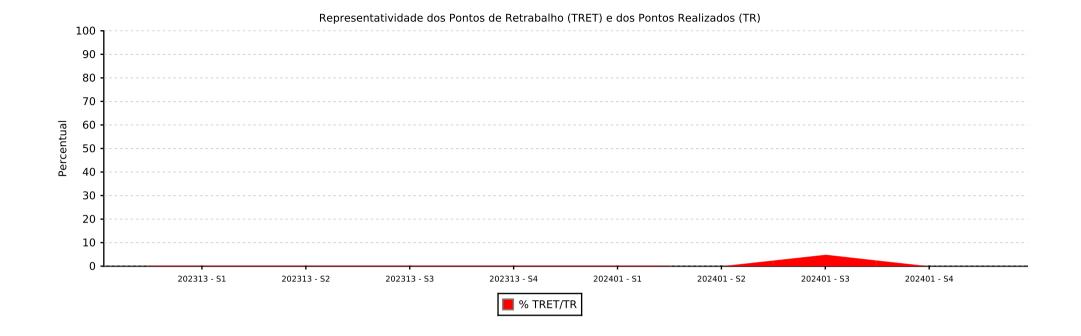


		202	313			202	401	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	16	52	33.5	32.5	67.5	101	51.5	118
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0	0	0	2.5	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0

## **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	147,87	184,07	219,58	236,7	218,08	242,78	216	253,5	801,53	917,05	114,4 %
Outros	0	15,1	0	35,63	0	21,77	0	39,82	0	112,32	0,0 %
Analise de Sistema	37,5	16,52	49,58	21,55	49,58	11,9	48,83	19,37	185,49	69,34	37,4 %
Code Review	9,67	8,8	11,5	41,08	11,5	38,58	11,5	17,13	44,17	105,59	239,1 %
Daily Scrum	15,83	4,17	23,17	9,95	23,17	13,87	23,17	11,08	85,34	39,07	45,8 %
Retrospectiva	10,5	6,43	10,5	6,87	12	8	10,5	8,8	43,5	30,1	69,2 %
Treinamento	7	6,18	9,67	9,27	9,67	15,28	9,67	8,65	36,01	39,38	109,4 %
Cafe	7,5	6,15	8,75	8,27	8,75	7,88	8,75	8,33	33,75	30,63	90,8 %
Ausencia	0	0	0	0	0	10,5	0	6,95	0	17,45	0,0 %
Sprint Planning 1	13,17	9	13,17	5,25	13,17	4,67	13,17	5,75	52,68	24,67	46,8 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1	3,47	1	5,93	1	4,4	1	4,33	4	18,13	453,3 %
Ginastica Laboral	5,83	2,57	8	3,85	8	4,18	8	4,32	29,83	14,92	50,0 %
Atestado	0	8	0	0	0	0	0	4	0	12	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	1,17	0	0,28	0	0,42	0	3,83	0	5,7	0,0 %
Verificando apontamento	4,83	2,33	5,67	2,98	5,67	2,53	5,67	2,6	21,84	10,44	47,8 %
Atualizacao de Versao	1,5	1,92	1,5	6,6	1,5	3,35	1,5	2,33	6	14,2	236,7 %
Reuniao	1,5	2,22	2	3,92	2	4,2	3,5	2,08	9	12,42	138,0 %
Sprint Planning 2	4,33	5	4,33	5,17	4,33	1,17	4,33	2	17,32	13,34	77,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	3	3,22	3,08	5,08	3,08	1,98	3,08	1,38	12,24	11,66	95,3 %
Sizing	6	3,83	6	2,75	6	4,67	6	1,02	24	12,27	51,1 %
Particular	0	0	0	0,8	0	0	0	0,92	0	1,72	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0,62	0	0,62	0,0 %
Preparando ambiente	0	0,72	0	4,35	0	1,08	0	0,58	0	6,73	0,0 %
Clean Code	3,33	0,25	3,5	0,42	3,5	0,58	3,5	0,25	13,83	1,5	10,8 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,5	0	0,5	0	0,5	0,47	0,5	0,08	2	0,55	27,5 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0,42	0,25	0,33	0,25	0,25	0,25	0	1	1	100,0 %
Atividades Gerenciais	0,5	2	0,5	1,53	0,5	0	0,5	0	2	3,53	176,5 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0,13	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,32	0	0,0 %


Feriado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores		0	0,03	0	0	0	0	0	0	0	0,03	0,0 %
Recursos Humanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline		0	0,6	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0,6	120,0 %
Atividade Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo		2,25	0	2,33	0	2,33	0	2,33	0	9,24	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga		0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0,0 %
Checklist dos Backups		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	2,33	0	2,33	0	0,0 %
Recesso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno		2	0	2,08	0	2,08	0	2,08	0	8,24	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao		1	0,25	1	0,92	1	0,35	1	0	4	1,52	38,0 %
Teste Automatizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	287,19	319,42	387,99	419,61	387,99	404,86	387,99	409,72	1.451,16	1.553,61	107,1 %

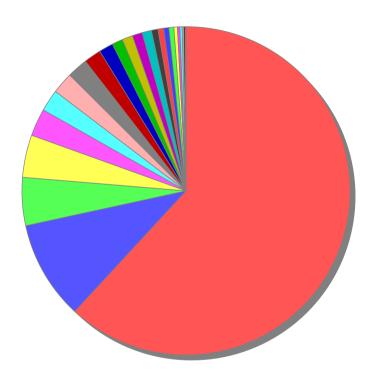

- Desenvolvimento [61.87%]
- Outros [9.72%]
- Analise de Sistema [4.73%]
- Code Review [4.18%]
- Daily Scrum [2.7%]
- Retrospectiva [2.15%]
- Treinamento [2.11%]
- Cafe [2.03%]
- Ausencia [1.7%]
- Sprint Planning 1 [1.4%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.06%]
- Ginastica Laboral [1.05%]
- Atestado [0.98%]
- Analise Retorno O.S. [0.93%]
- Verificando apontamento [0.63%]
- Atualizacao de Versao [0.57%]
- Reuniao [0.51%]
- Sprint Planning 2 [0.49%]
- Oriacao de Ambiente de Desenv. [0.34%]
- Sizing [0.25%]
- Particular [0.22%]
- Analise de O.S [0.15%]
- Preparando ambiente [0.14%]
- Clean Code [0.06%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.02%]

# HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	159,95	191	232,08	248,13	230,58	250,22	228,5	259,55	851,11	948,9	111,5 %
DIV - Diversos*		16,33	28,28	20,25	54,12	20,25	48,88	21,75	61,5	78,58	192,78	245,3 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	36	19,4	45,17	57,9	46,67	60,45	45,17	37,02	173,01	174,77	101,0 %
REQM - Gestao de Requisitos		61	36,23	73,08	39,35	73,08	23,9	72,33	32,55	279,49	132,03	47,2 %
PI - Integracao de Produto		1,5	1,92	1,5	6,6	1,5	3,35	1,5	2,33	6	14,2	236,7 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	2,33	0	2,33	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		0,33	0,6	0,33	0	0,33	0	0,83	0	1,82	0,6	33,0 %
	Total Geral	275,11	277,43	372,41	406,1	372,41	386,8	372,41	392,95	1.392,34	1.463,28	105,1 %

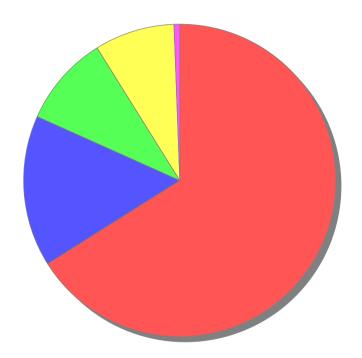


- Desenvolvimento de Requisitos [66.05%]
- Diversos\* [15.65%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [9.42%]
- Oestao de Requisitos [8.28%]
- Integracao de Produto [0.59%]

## **INDICADORES DO PROJETO**


	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401
01. Horas planejadas de todas atividades	880h00m	880h00m	792h00m	880h00m	800h00m	840h00m	612h20m	1451h12m
02. Horas realizadas de todas atividades	938h39m	950h28m	824h44m	940h16m	845h36m	909h31m	655h11m	1553h37m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	696h35m	653h50m	580h10m	583h00m	457h20m	470h44m	389h00m	1172h42m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	690h49m	708h03m	518h09m	579h39m	468h37m	493h13m	416h24m	1058h41m
05. Pontos planejados para o projeto	208,0	200,0	176,0	180,0	144,0	148,0	142,0	339,5
06. Pontos planejados	209,0	244,0	187,0	173,5	153,0	168,5	146,5	282,0
07. Pontos entregues	220	220	166,5	192,5	165,5	164,5	134	338
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	168,00	167,50	142,50	129,50	121,50	134,50	107,00	261,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	52,00	52,50	24,00	63,00	44,00	30,00	27,00	77,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	1	4	0	3	0	2	0	5
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	73	60	50	44	35	32	28	74
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	45	57	36	68	39	31	15	64
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	4	0	3	0	1	0	2
14. Horas de correção de bug	0h00m							
15. Pontos de retrabalho	0,5	1,5	0	6	0	0,5	0	2,5
16. Produtividade planejada	0,301	0,374	0,323	0,298	0,335	0,358	0,377	0,241
17. Produtividade realizada	0,319	0,311	0,322	0,333	0,354	0,334	0,322	0,320
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	105,8	110	94,7	107	115	111,2	94,4	99,6
19. % Pontos NP / Pontos entregues	23,7	23,9	14,5	32,8	26,6	18,3	20,2	22,8

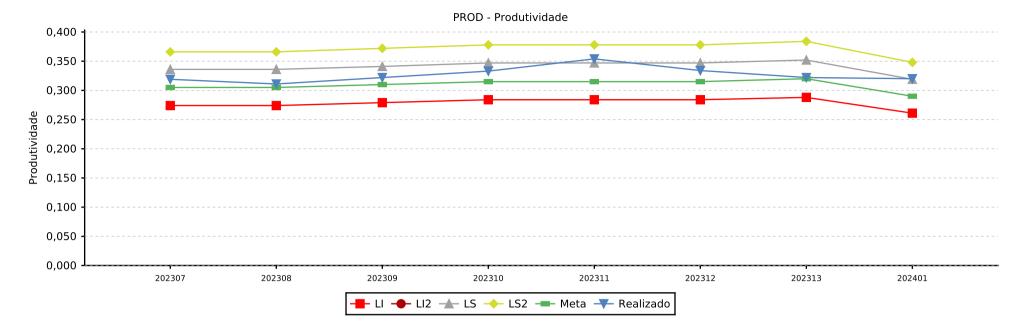


	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401
Realizado	0,319	0,311	0,322	0,333	0,354	0,334	0,322	0,320
Meta	0,305	0,305	0,310	0,315	0,315	0,315	0,320	0,290
LS2	0,366	0,366	0,372	0,378	0,378	0,378	0,384	0,348
LS	0,336	0,336	0,341	0,347	0,347	0,347	0,352	0,319
LI2								
LI	0,274	0,274	0,279	0,284	0,284	0,284	0,288	0,261

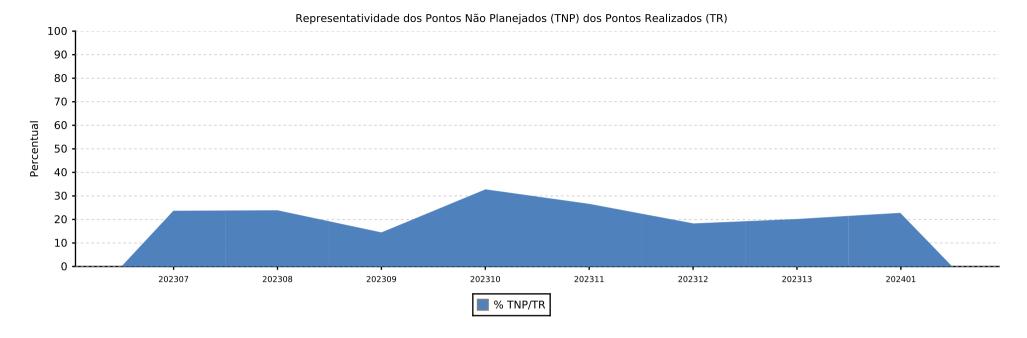


	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401
TR - Pontos Realizados	220	220	166.5	192.5	165.5	164.5	134	338
TNP - Pontos Não Planejados	52	52.5	24	63	44	30	27	77
% TNP/TR	23,7	23,9	14,5	32,8	26,6	18,3	20,2	22,8

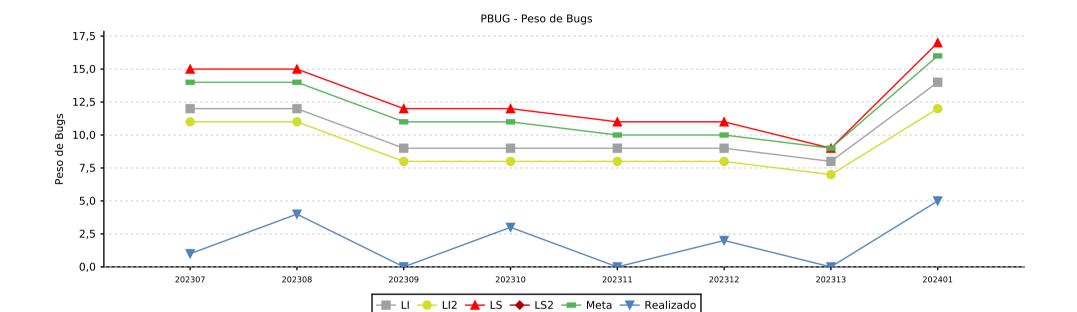


	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401
Realizado	1	4	0	3	0	2	0	5
Meta	14	14	11	11	10	10	9	16
LS2								
LS	15	15	12	12	11	11	9	17
LI2	11	11	8	8	8	8	7	12
LI	12	12	9	9	9	9	8	14
Pontos Entregues	220	220	166.5	192.5	165.5	164.5	134	338
% PBUG / TR	0,46	1,82	0,00	1,56	0,00	1,22	0,00	1,48

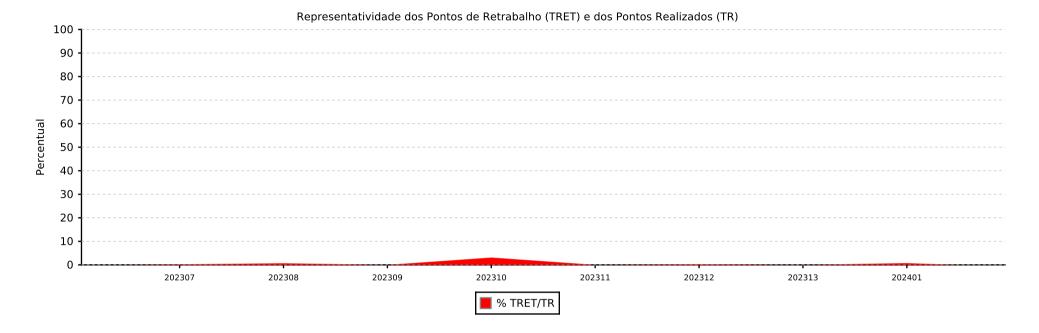

	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401
TR - Pontos Realizados	220	220	166.5	192.5	165.5	164.5	134	338
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	1.5	0	6	0	0.5	0	2.5
% TRET/TR	0,2	0,7	0,0	3,1	0,0	0,3	0,0	0,7

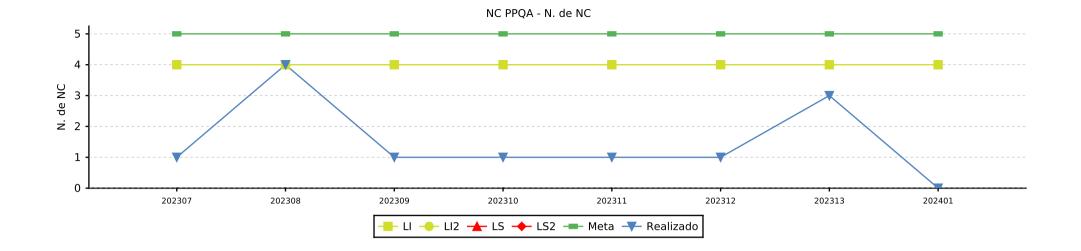

	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401
Realizado	1	4	1	1	1	1	3	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

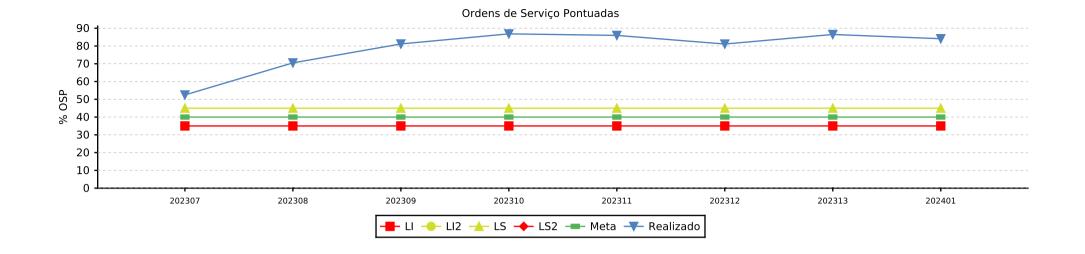


	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401
Realizado	52.46	70.5	81.15	86.83	85.96	81.11	86.49	84.09
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

#### % de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [59.03%]
- Outros [7.23%]
- Code Review [6.8%]
- O Analise de Sistema [4.46%]
- Treinamento [2.53%]
- Daily Scrum [2.51%]
- Cafe [1.97%]
- Retrospectiva [1.94%]
- Folga [1.61%]
- Sprint Planning 1 [1.59%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.17%]
- Ausencia [1.12%]
- Ginastica Laboral [0.96%]
- Atualizacao de Versao [0.91%]
- Sprint Planning 2 [0.86%]
- Reuniao [0.8%]
- Sizing [0.79%]
- Atestado [0.77%]
- Oriacao de Ambiente de Desenv. [0.75%]
- Verificando apontamento [0.67%]
- Preparando ambiente [0.43%]
- Analise Retorno O.S. [0.37%]
- Atividades Gerenciais [0.23%]
- Particular [0.11%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.1%]
- Clean Code [0.1%]
- Geração de Atas [0.06%]
- Analise de O.S [0.04%]

- Geracao de Baseline [0.04%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.04%]
- Atraso / Saida antecipada [0.01%]
- Manutenção de Servidores [0%]

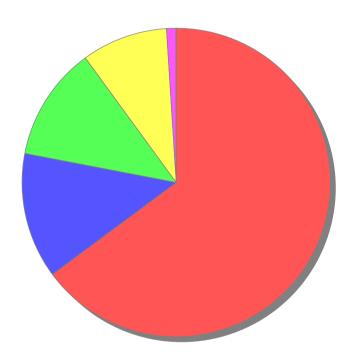

- Desenvolvimento de Requisitos [61.08%]
- Diversos\* [12.41%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [11.25%]
- Gestao de Requisitos [8.5%]
- Integracao de Produto [0.91%]
- Gerencia de Configuração [0.04%]
