



INDICADORES DA SPRINT


	202511				202512			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m	128h00m	144h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	248h36m	219h47m	239h29m	237h54m	227h49m	153h27m	152h39m	240h58m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	149h12m	151h55m	154h55m	154h45m	154h35m	74h50m	94h05m	154h25m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	145h31m	107h35m	136h03m	155h00m	136h56m	67h19m	74h52m	117h54m
05. Pontos planejados	52,5	60,0	57,0	66,0	45,0	29,0	37,0	50,0
06. Pontos entregues	37,5	41,5	30,5	62	48,5	16,5	16,5	42
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	32,50	36,00	26,00	60,00	44,00	16,00	13,00	36,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	5,00	5,50	4,50	2,00	4,50	0,50	3,50	6,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	3	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	11	7	6	14	8	7	7	9
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	5	7	5	3	4	1	3	2
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	1	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	1	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,352	0,395	0,368	0,427	0,292	0,388	0,394	0,324
16. Produtividade realizada	0,258	0,386	0,225	0,400	0,355	0,246	0,221	0,357
17. % Pontos NP / Pontos entregues	13,4	13,3	14,8	3,3	9,3	3,1	21,3	14,3

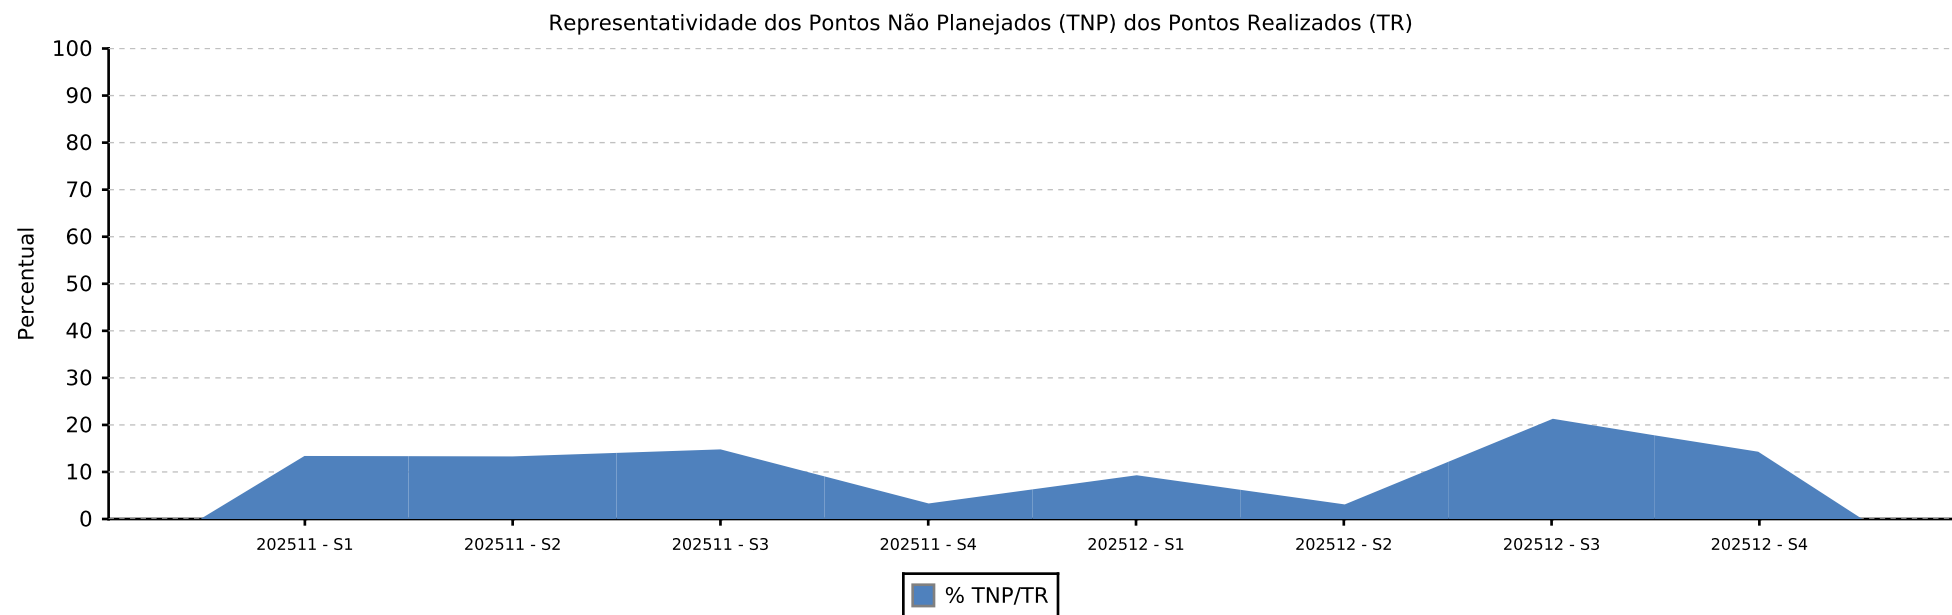

	202511				202512			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	37.5	41.5	30.5	62	48.5	16.5	16.5	42
TNP - Pontos Não Planejados	5	5.5	4.5	2	4.5	0.5	3.5	6
% TNP/TR	13,4	13,3	14,8	3,3	9,3	3,1	21,3	14,3

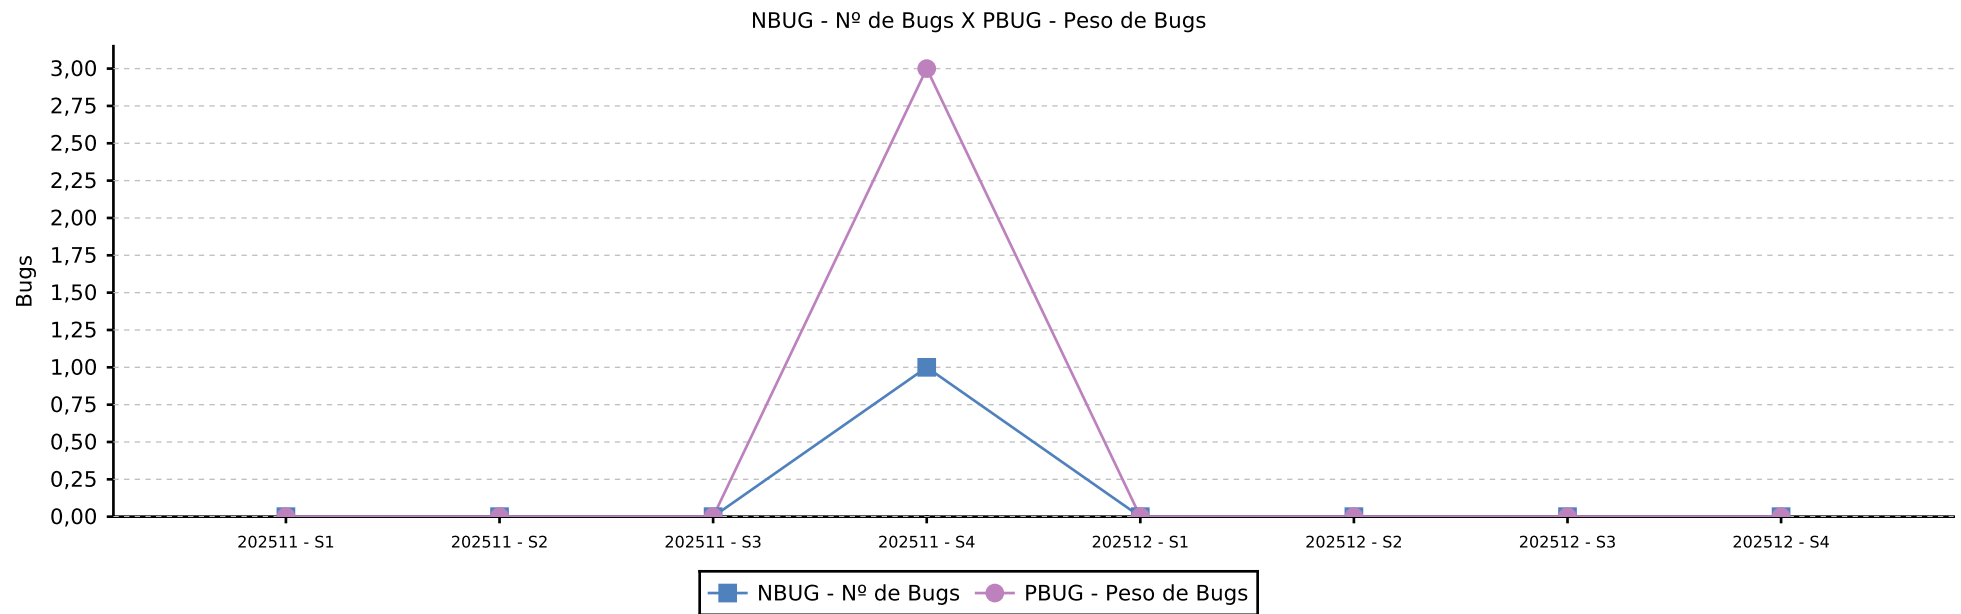

	202511				202512			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	1	0	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	3	0	0	0	0
Pontos Entregues	37.5	41.5	30.5	62	48.5	16.5	16.5	42
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00

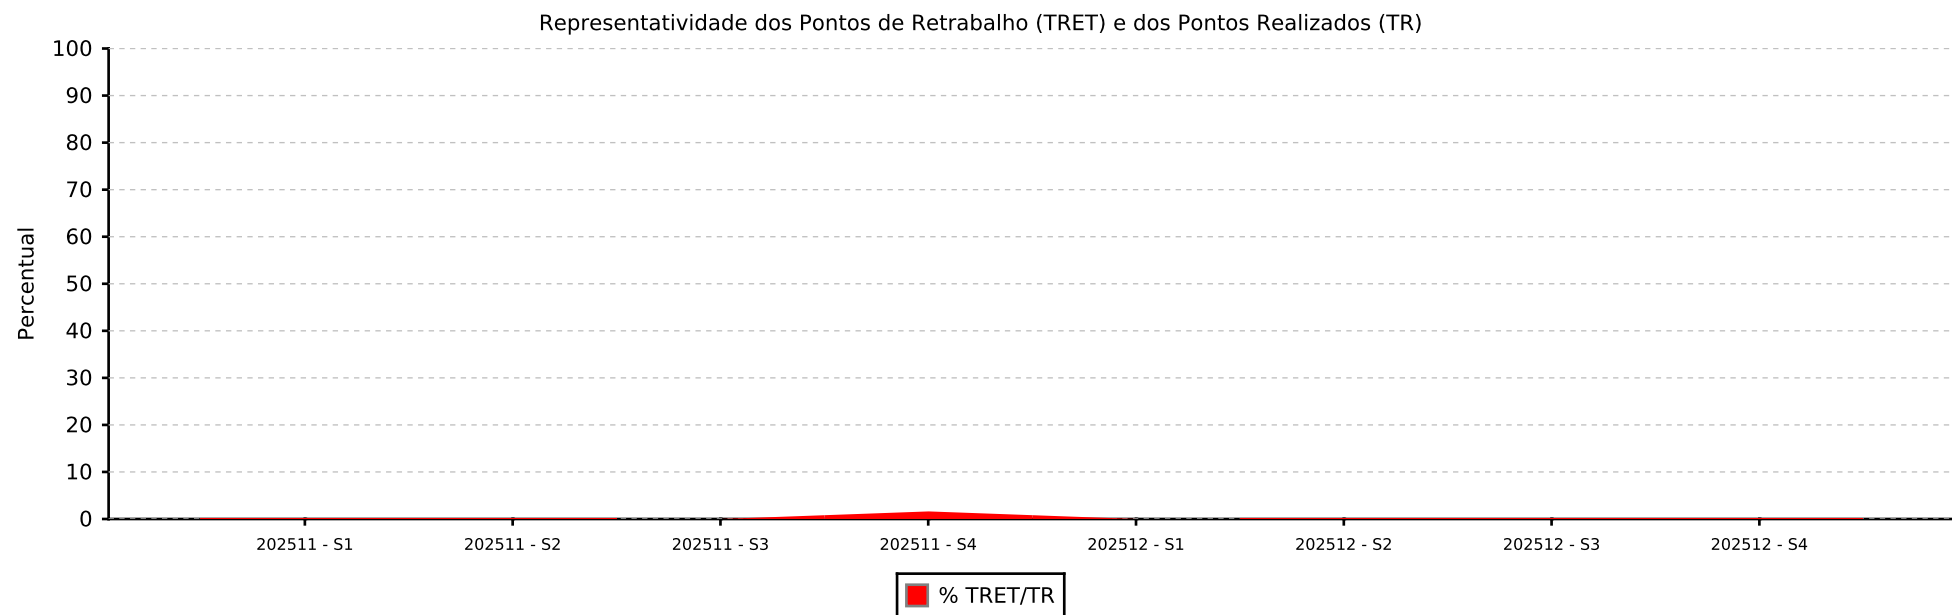



	202511				202512			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	37.5	41.5	30.5	62	48.5	16.5	16.5	42
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	1	0	0	0	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Particular	0	0,6	0	0	0	0	0	0	0	0,6	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0,33	0	0	0	0	0	0,33	0	0,66	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0,15	0,0 %
Documentação	0	0,38	0	0	0	0	0	0	0	0,38	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Total Geral	219,99	227,8	127,99	153,44	144,01	152,65	219,99	240,98	711,98	774,87	108,8 %


% de Horas por Atividade

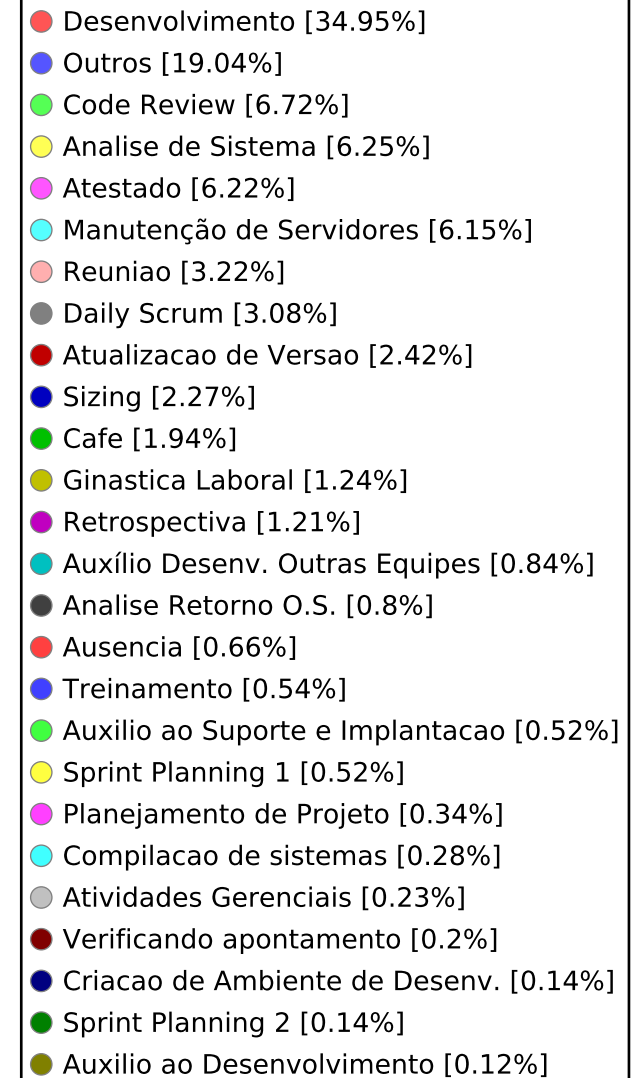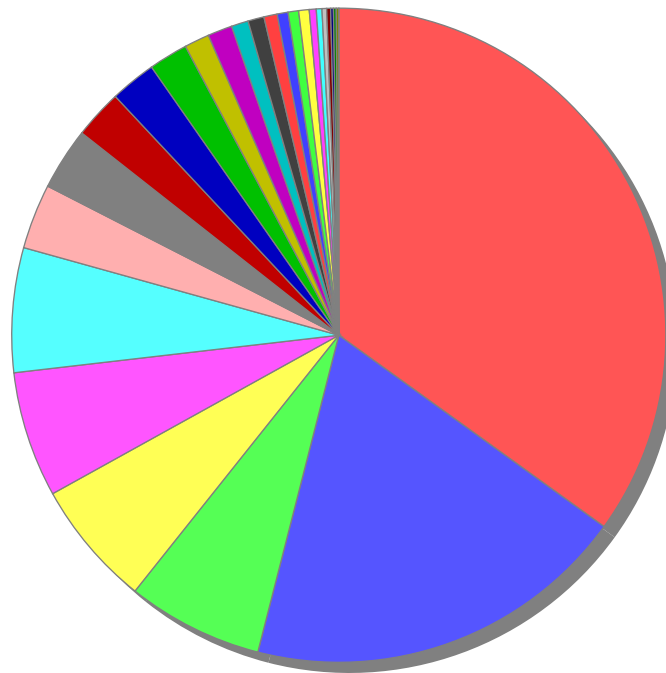

HORAS POR ÁREA DO CMMI


Area CMMI	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	
RD - Desenvolvimento de Requisitos	134,17	127,08	61,17	50,08	79,75	69,13	132,75	86,88	407,84	333,17	81,7 %
DIV - Diversos*	16,92	23,13	12	20,1	12,58	18,18	17,08	64,65	58,58	126,06	215,2 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	32,58	22,48	25	29,98	24,17	26,72	32,58	26,53	114,33	105,71	92,5 %
REQM - Gestao de Requisitos	29	29,15	23	36,23	22,5	32,23	29	24,02	103,5	121,63	117,5 %
PI - Integracao de Produto	4	0	4	10,73	2	0,25	4	5,82	14	16,8	120,0 %
PP - Planejamento de Projeto	0	0,42	0	0	0	0	1,25	0,83	1,25	1,25	100,0 %
CM - Gerencia de Configuracao	0,5	6	0,5	3,87	0,5	1,42	0,5	0,67	2	11,96	598,0 %
OT - Treinamento na Organizacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	217,17	208,26	125,67	150,99	141,5	147,93	217,16	209,4	701,5	716,58	102,1 %

% de Horas por Área do CMMI

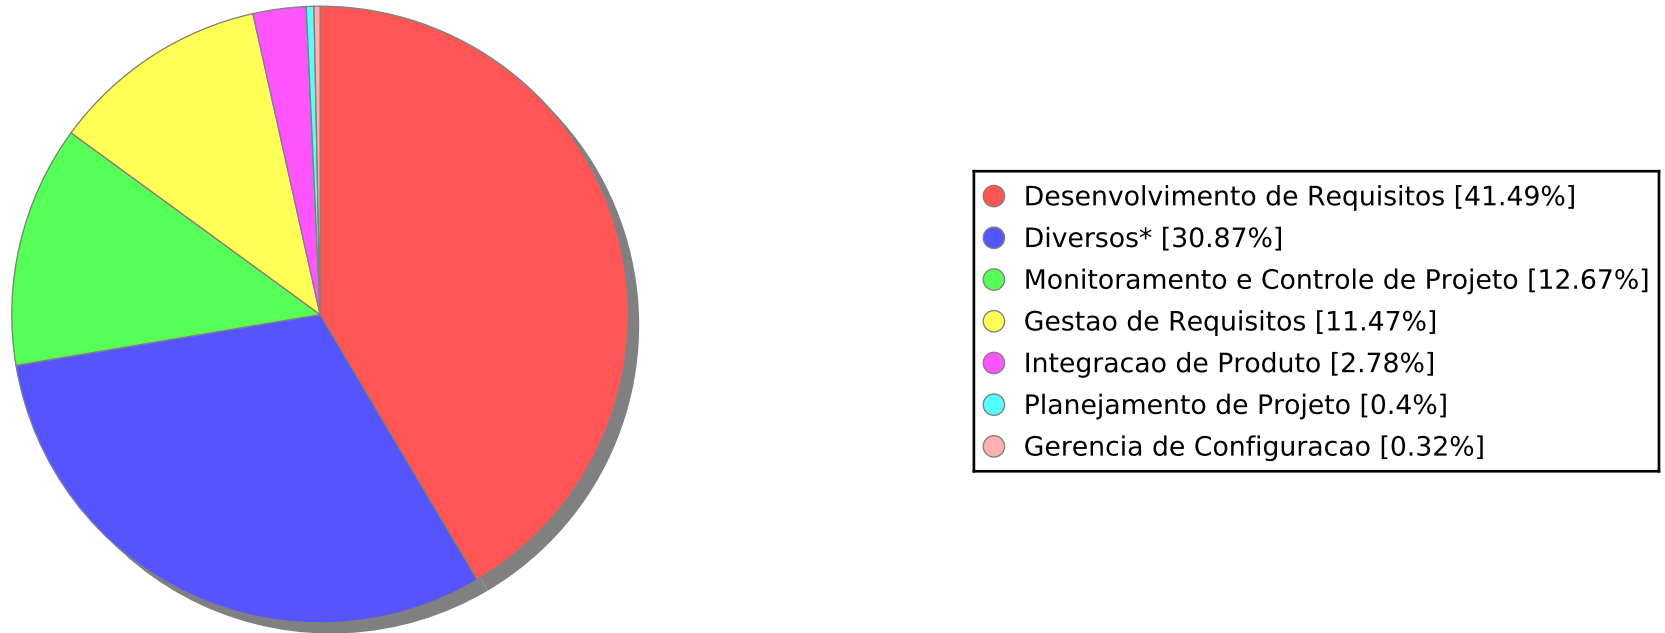


INDICADORES DO PROJETO


	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512
01. Horas planejadas de todas atividades	700h00m	1056h00m	1008h00m	1012h00m	972h00m	880h00m	880h00m	712h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	737h25m	1145h23m	1065h58m	1067h31m	1031h19m	977h42m	945h46m	774h53m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	505h40m	788h50m	742h45m	716h25m	687h30m	615h45m	610h47m	477h55m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	450h32m	723h16m	631h18m	665h25m	609h08m	602h21m	544h09m	397h01m
05. Pontos planejados para o projeto	148,0	232,0	218,0	216,0	205,0	188,0	186,0	145,0
06. Pontos planejados	153,5	248,5	269,5	223,0	219,0	196,0	235,5	161,0
07. Pontos entregues	134	216,5	190,5	200	187,5	185	171,5	123,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	120,50	188,50	162,00	160,50	146,50	113,50	154,50	109,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	13,50	28,00	28,50	39,50	41,00	71,50	17,00	14,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	6	6	5	9	0	3	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	30	42	36	39	30	25	38	31
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	13	19	22	29	32	51	20	10
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	2	4	2	3	0	1	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	5h50m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0	2	4,5	1,5	2,5	0	1	0
16. Produtividade planejada	0,304	0,316	0,363	0,312	0,319	0,319	0,386	0,337
17. Produtividade realizada	0,298	0,300	0,302	0,301	0,308	0,308	0,316	0,312
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	90,6	93,4	87,4	92,6	91,5	98,5	92,3	85,2
19. % Pontos NP / Pontos entregues	10,1	13	15	19,8	21,9	38,7	10	11,8

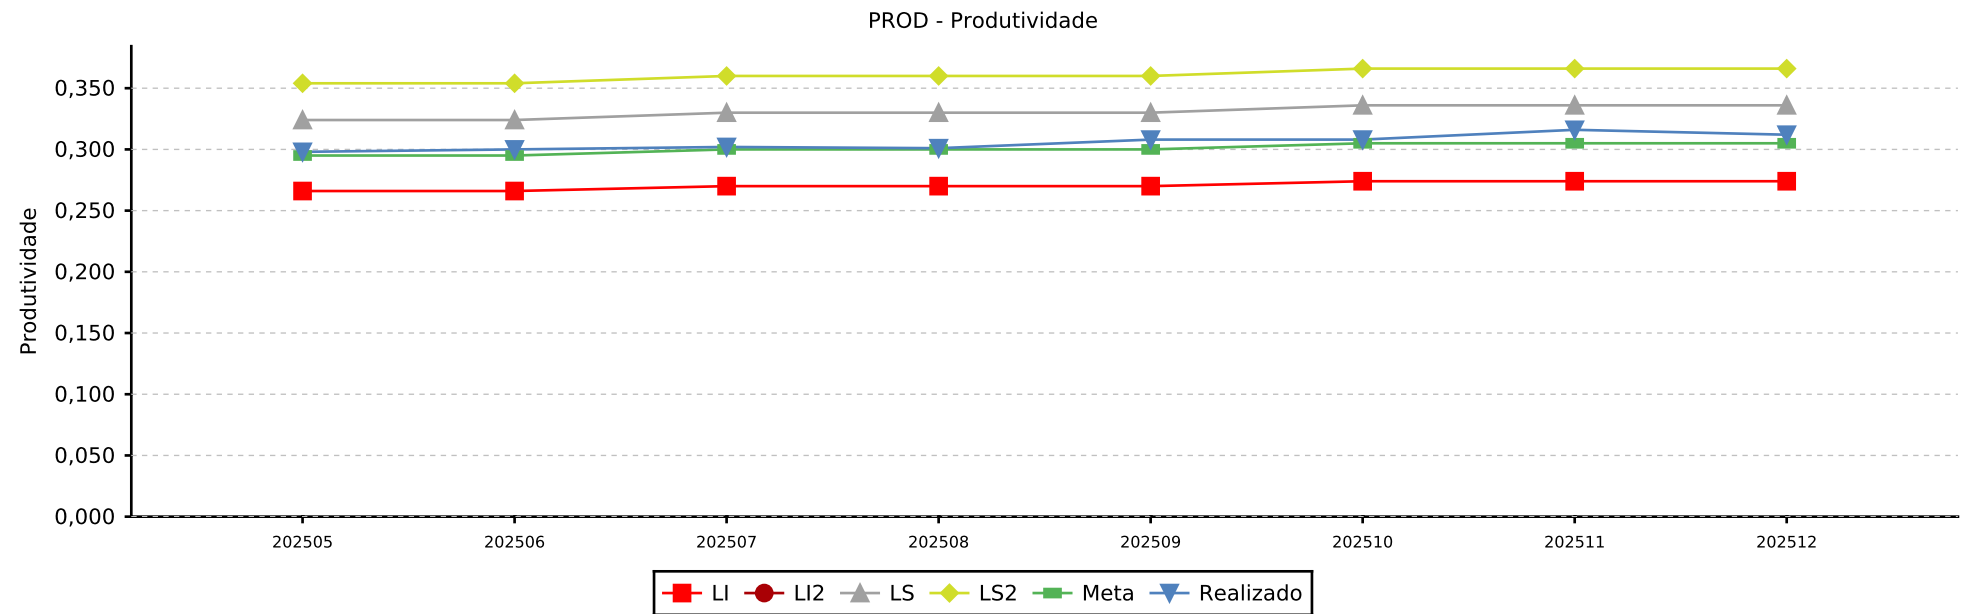


	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512
Realizado	0,298	0,300	0,302	0,301	0,308	0,308	0,316	0,312
Meta	0,295	0,295	0,300	0,300	0,300	0,305	0,305	0,305
LS2	0,354	0,354	0,360	0,360	0,360	0,366	0,366	0,366
LS	0,324	0,324	0,330	0,330	0,330	0,336	0,336	0,336
LI2								
LI	0,266	0,266	0,270	0,270	0,270	0,274	0,274	0,274

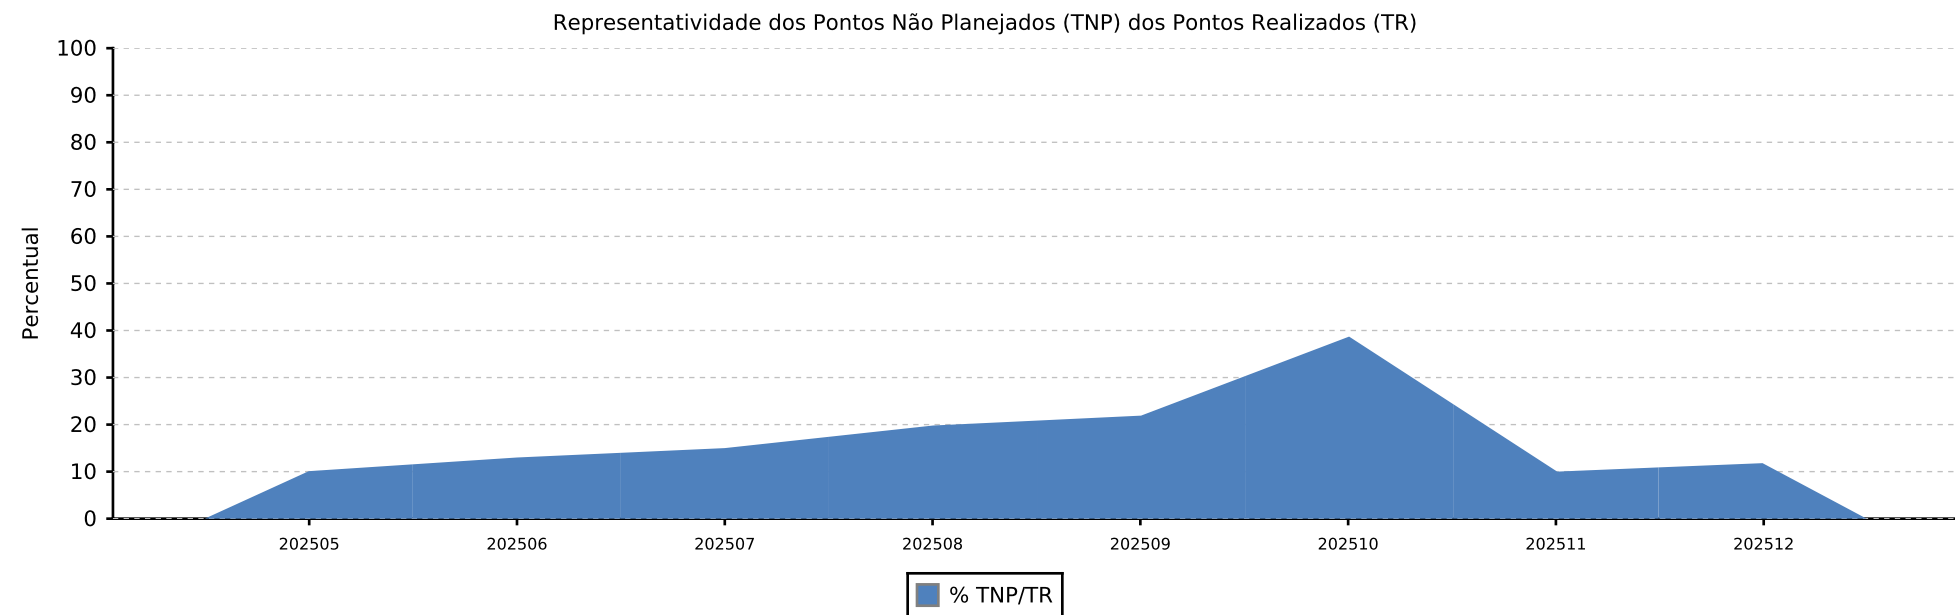


	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512
TR - Pontos Realizados	134	216.5	190.5	200	187.5	185	171.5	123.5
TNP - Pontos Não Planejados	13.5	28	28.5	39.5	41	71.5	17	14.5
% TNP/TR	10,1	13,0	15,0	19,8	21,9	38,7	10,0	11,8

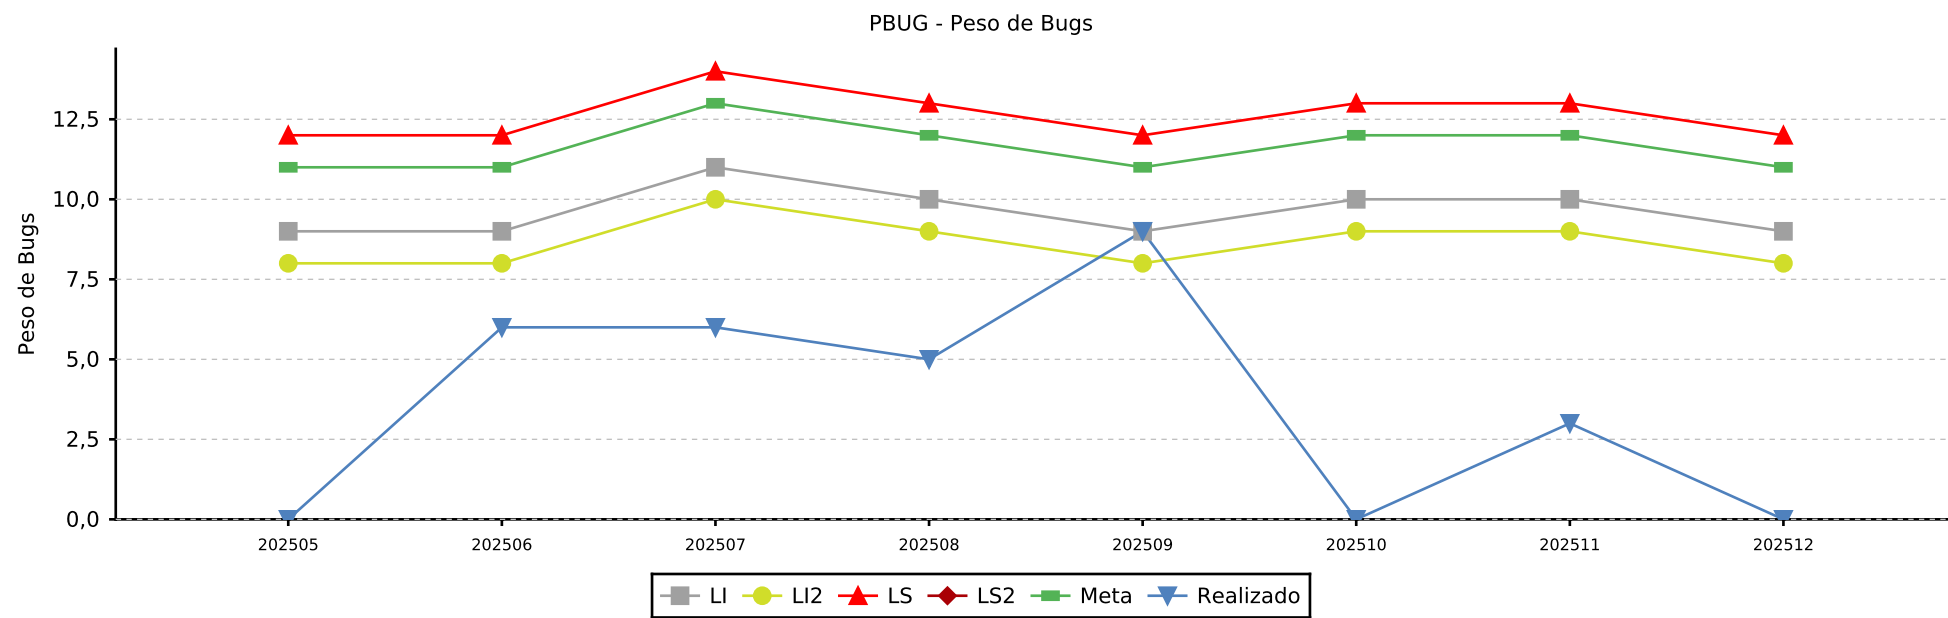

	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512
Realizado	0	6	6	5	9	0	3	0
Meta	11	11	13	12	11	12	12	11
LS2								
LS	12	12	14	13	12	13	13	12
LI2	8	8	10	9	8	9	9	8
LI	9	9	11	10	9	10	10	9
Pontos Entregues	134	216.5	190.5	200	187.5	185	171.5	123.5
% PBUG / TR	0,00	2,78	3,15	2,50	4,80	0,00	1,75	0,00

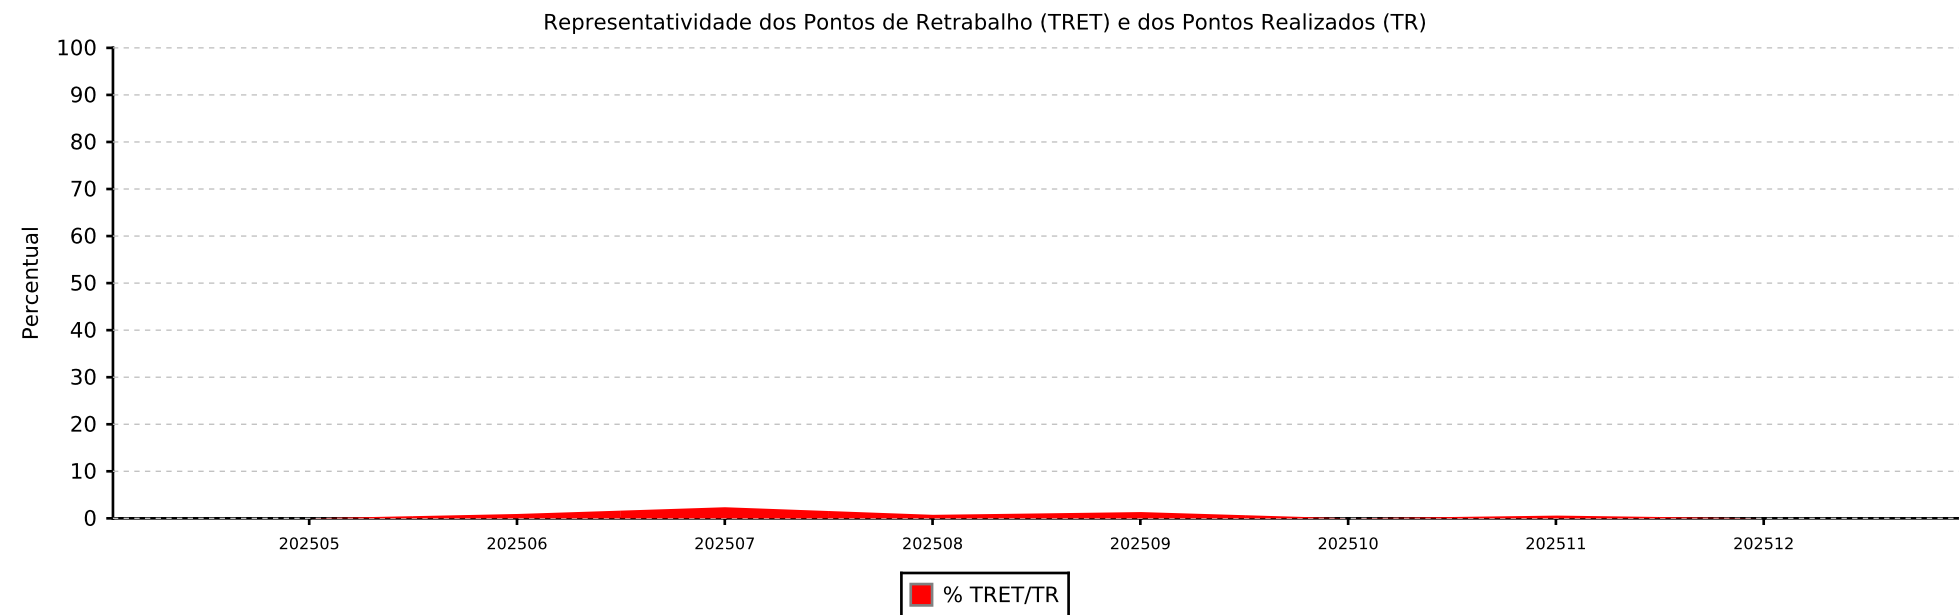


	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512
TR - Pontos Realizados	134	216.5	190.5	200	187.5	185	171.5	123.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	2	4.5	1.5	2.5	0	1	0
% TRET/TR	0,0	0,9	2,4	0,8	1,3	0,0	0,6	0,0

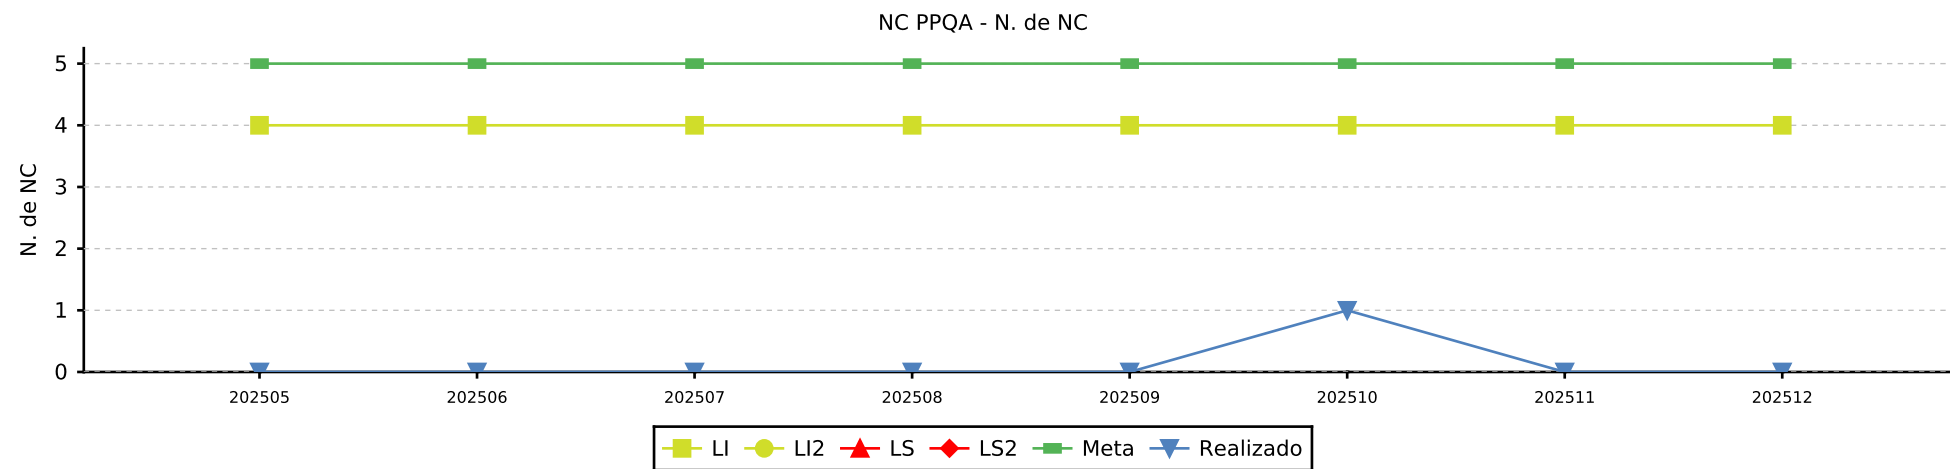


	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512
Realizado	0	0	0	0	0	1	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

Ordens de Serviço Pontuadas

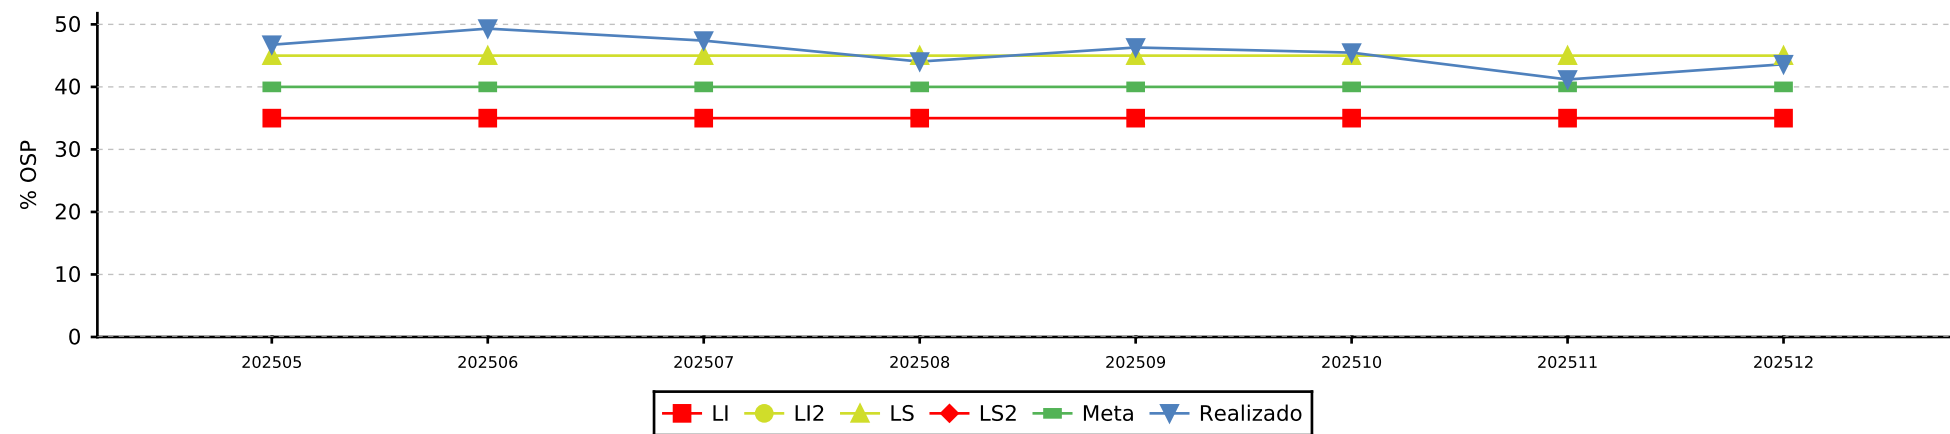

	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511	202512
Realizado	46.74	49.32	47.4	44.05	46.3	45.48	41.18	43.62
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

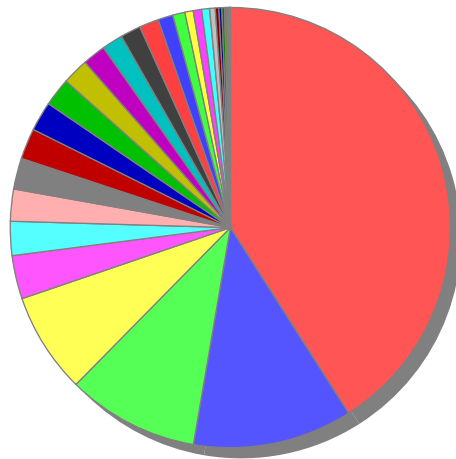

● Desenvolvimento [40.98%]	● Documentação [0.05%]
● Analise de Sistema [11.71%]	● Verificar o.s no nome [0.02%]
● Code Review [9.69%]	● Geração de Atas [0.01%]
● Outros [7.39%]	
● Reuniao [3.19%]	
● Treinamento [2.5%]	
● Manutenção de Servidores [2.35%]	
● Cafe [2.28%]	
● Daily Scrum [2.26%]	
● Atualizacao de Versao [2.17%]	
● Sizing [2.07%]	
● Atestado [1.93%]	
● Retrospectiva [1.7%]	
● Compilacao de sistemas [1.54%]	
● Ginastica Laboral [1.49%]	
● Ausencia [1.43%]	
● Criacao de Ambiente de Desenv. [1.11%]	
● Sprint Planning 1 [0.89%]	
● Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.61%]	
● Analise Retorno O.S. [0.61%]	
● Verificando apontamento [0.58%]	
● Sprint Planning 2 [0.41%]	
● Atividades Gerenciais [0.26%]	
● Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.22%]	
● Clean Code [0.2%]	
● Planejamento de Projeto [0.16%]	
● Auxilio ao Desenvolvimento [0.1%]	
● Particular [0.08%]	

% de Horas por Área do CMMI

