

INDICADORES DA SPRINT

		202	410			202	411	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	400h00m	372h00m	416h00m	431h00m	410h00m	446h00m	446h00m	410h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	380h38m	351h29m	398h50m	466h01m	435h45m	419h18m	454h08m	425h52m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	316h25m	293h15m	331h20m	344h05m	328h15m	359h35m	360h15m	328h05m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	298h24m	265h12m	293h44m	343h42m	306h03m	305h04m	354h05m	320h04m
05. Pontos planejados	96,5	93,0	104,0	121,0	89,5	118,0	123,0	133,0
06. Pontos entregues	85	80,5	92	112,5	110	84	110,5	109
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	73,00	66,00	70,50	71,00	76,50	79,00	91,50	84,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	12,00	14,50	21,50	41,50	33,50	5,00	19,00	25,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	3	0	0	3	0	0	0	4
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	28	13	14	25	29	26	19	26
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	17	24	15	19	11	8	10	19
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	0	1	0	0	0	2
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0,5	0	1	0	0	1,5	1,5
15. Produtividade planejada	0,305	0,318	0,314	0,352	0,273	0,329	0,342	0,406
16. Produtividade realizada	0,285	0,304	0,314	0,328	0,360	0,276	0,313	0,341
17. % Pontos NP / Pontos entregues	14,2	18,1	23,4	36,9	30,5	6	17,2	23

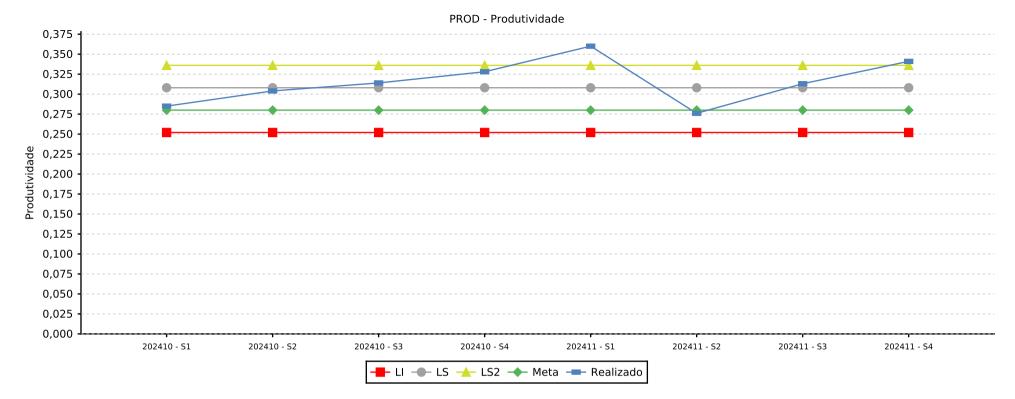


		202	410			202	411	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,285	0,304	0,314	0,328	0,360	0,276	0,313	0,341
Meta	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
LS2	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
LS	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308
LI	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252

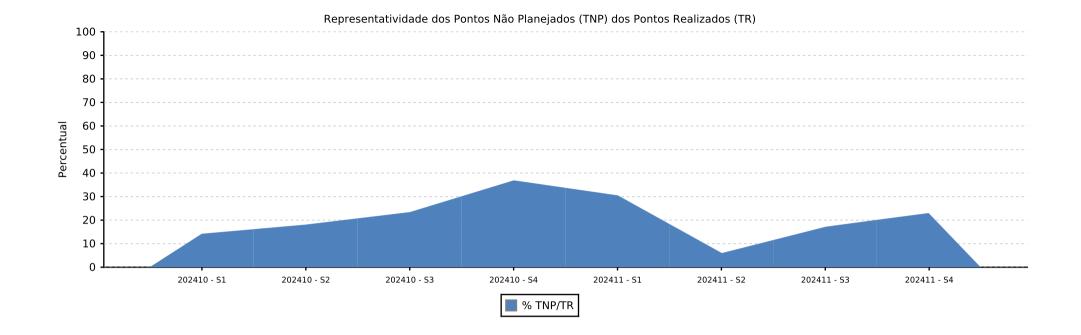


		202	410			202	411	
	1	1 2 3 4				2	3	4
TR - Pontos Realizados	85	80.5	92	112.5	110	84	110.5	109
TNP - Pontos Não Planejados	12	14.5	21.5	41.5	33.5	5	19	25
% TNP/TR	14,2	18,1	23,4	36,9	30,5	6,0	17,2	23,0

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

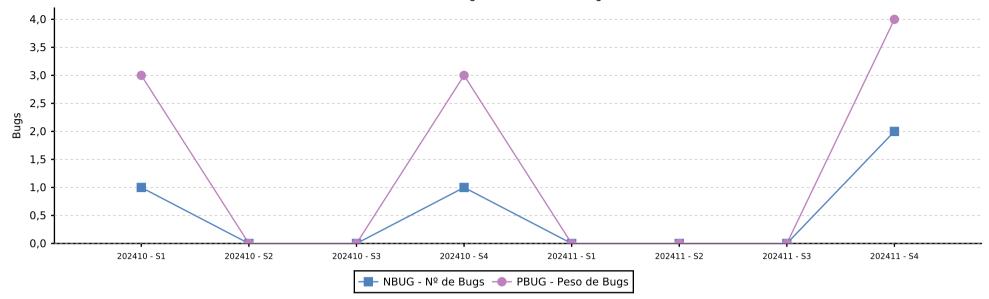

		202	410		202411				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
NBUG - Nº de Bugs	1	0	0	1	0	0	0	2	
PBUG - Peso de Bugs	3	0	0	3	0	0	0	4	
Pontos Entregues	85	80.5	92	112.5	110	84	110.5	109	
% PBUG / TR	3,53	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	3,67	

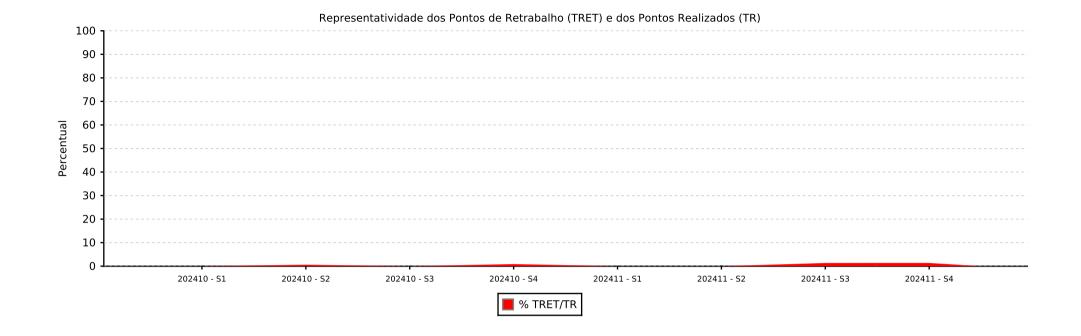


		202	410			202	411	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	85	80.5	92	112.5	110	84	110.5	109
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0.5	0	1	0	0	1.5	1.5
% TRET/TR	0,0	0,6	0,0	0,9	0,0	0,0	1,4	1,4

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spr	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	263,67	266,7	295,5	250,8	296,17	303,4	262	253	1.117,34	1.073,9	96,1 %
Analise de Sistema	16,75	23,65	18,75	33,78	18,75	24,2	16,75	37,48	71	119,11	167,8 %
Daily Scrum	16,17	11,98	16,17	16,62	16,17	17,38	16,17	20,02	64,68	66	102,0 %
Code Review	15	19,82	17	13,4	17	14,38	15	18,85	64	66,45	103,8 %
Retrospectiva	15,83	13,92	15,83	16,23	15,83	11,03	15,83	13,5	63,32	54,68	86,4 %
Sprint Planning 1	16,5	9,33	16,5	8,68	16,5	12	16,5	13,5	66	43,51	65,9 %
Cafe	12,67	9,2	12,67	13,53	12,67	12,18	12,67	11,9	50,68	46,81	92,4 %
Treinamento	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	7,47	1	7,47	747,0 %
Ginastica Laboral	7,83	7,55	7,83	5,78	7,83	6,25	7,83	6,5	31,32	26,08	83,3 %
Atualizacao de Versao	2,5	0,78	2,5	3,85	2,5	2,43	2,5	6,48	10	13,54	135,4 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,5	0,67	0,5	1,62	0,5	2,48	0,5	5,6	2	10,37	518,5 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	5,58	2,53	5,58	2,82	5,58	9,07	5,58	5,53	22,32	19,95	89,4 %
Sprint Planning 2	5,5	2,67	5,5	4,95	5,5	5,35	5,5	5,38	22	18,35	83,4 %
Ausencia	1	4,4	1	8,77	1	12,38	1	5,22	4	30,77	769,2 %
Sizing	6	8,35	6	5,62	6	7,62	6	5,1	24	26,69	111,2 %
Verificando apontamento	6,17	2,68	6,17	2,72	6,17	2,93	6,17	2,68	24,68	11,01	44,6 %
Reuniao	2	1,83	2,67	2,43	2	3,83	2,17	1,85	8,84	9,94	112,4 %
Correção de Erros Interno	1,67	0	1,67	0	1,67	0	1,67	1,57	6,68	1,57	23,5 %
Analise de O.S	2,33	1	2,33	5,83	2,33	0	2,33	1,22	9,32	8,05	86,4 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	2	1,02	2	1,02	51,0 %
Banheiro	1,5	2,15	1,5	1,52	1,5	1,78	1,5	0,8	6	6,25	104,2 %
Outros	1	0,62	1	3,8	1	1,72	1	0,67	4	6,81	170,2 %
Analise Retorno O.S.	0,17	0,25	0,17	2,25	0,17	0,58	0,17	0,32	0,68	3,4	500,0 %
Documentação	0	0,2	0	0,17	0	0,3	0	0,22	0	0,89	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0,33	0,5	0,33	1,05	0,33	0,33	0,33	0	1,32	1,88	142,4 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	37,18	0	8	0	0	0	0	0	45,18	0,0 %


Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	2,5	1	2,77	1	0	1	0	4	5,27	131,8 %
Clean Code	3,83	0	3,83	1,17	3,83	0	3,83	0	15,32	1,17	7,6 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	1	1,1	1	0	1	2,48	1	0	4	3,58	89,5 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,32	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	1,15	0	0	0	0	0	1,15	0,0 %
Recursos Humanos	0	0,48	0	0	0	0	0	0	0	0,48	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	2,58	0	0	0	0	0	0	0	2,58	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,58	0,82	0,58	0	0,58	0	0,58	0	2,32	0,82	35,3 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,42	0	1,42	0	1,42	0	1,42	0	5,68	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,0 %
Total Geral	410	435,74	446	419,31	446	454,1	410	425,88	1.712	1.735,03	101,3 %

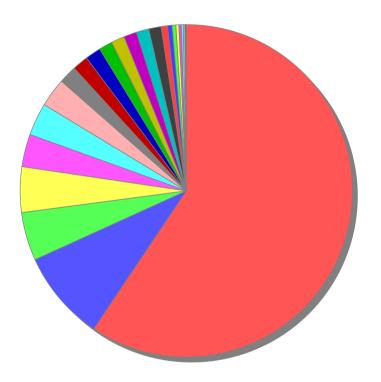

- Desenvolvimento [59.41%]
- Analise de Sistema [8.8%]
- Daily Scrum [4.7%]
- Code Review [4.43%]
- Retrospectiva [3.17%]
- Sprint Planning 1 [3.17%]
- Cafe [2.79%]
- Treinamento [1.75%]
- Ginastica Laboral [1.53%]
- Atualizacao de Versao [1.52%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.31%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.3%]
- Sprint Planning 2 [1.26%]
- Ausencia [1.23%]
- Sizing [1.2%]
- Verificando apontamento [0.63%]
- Reuniao [0.43%]
- Correção de Erros Interno [0.37%]
- Analise de O.S [0.29%]
- Planejamento de Projeto [0.24%]
- Banheiro [0.19%]
- Outros [0.16%]
- Analise Retorno O.S. [0.08%]
- Documentação [0.05%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	int 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	To	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisito	S	277,25	270,72	309,08	256,4	309,75	314,95	275,58	265,7	1.171,66	1.107,77	94,5 %
REQM - Gestao de Requisitos		45,25	44,75	47,25	56,33	47,25	50,08	45,25	61,78	185	212,94	115,1 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	47	45,72	49	46,25	49	42,8	47	52,37	192	187,14	97,5 %
DIV - Diversos*		26,5	27,5	27,17	37,08	26,5	38,85	26,67	26,13	106,84	129,56	121,3 %
PI - Integracao de Produto		2,5	0,78	2,5	3,85	2,5	2,43	2,5	6,48	10	13,54	135,4 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	2	1,02	2	1,02	51,0 %
CM - Gerencia de Configuracao		0,83	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,82	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	2,58	0	0	0	0	0	0	0	2,58	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	399,33	392,05	435,33	399,91	435,33	449,11	399,33	413,48	1.669,32	1.654,55	99,1 %

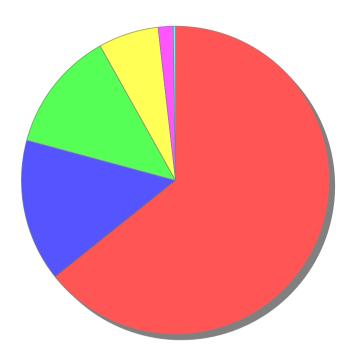


- Desenvolvimento de Requisitos [64.26%]
- Gestao de Requisitos [14.94%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [12.67%]
- Oiversos* [6.32%]
- Integracao de Produto [1.57%]
- O Planejamento de Projeto [0.25%]

INDICADORES DO PROJETO


	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411
01. Horas planejadas de todas atividades	1543h12m	1455h00m	1534h00m	1409h00m	1852h00m	1739h44m	1619h00m	1712h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1607h11m	1619h36m	1608h45m	1556h47m	1874h28m	1710h24m	1596h58m	1735h03m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1229h08m	1130h30m	1193h00m	1094h00m	1483h50m	1381h29m	1285h05m	1376h10m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	1134h08m	1022h38m	1104h55m	1014h08m	1346h36m	1265h23m	1201h02m	1285h16m
05. Pontos planejados para o projeto	348,0	316,0	334,0	304,0	364,0	462,0	360,0	385,0
06. Pontos planejados	296,5	242,0	302,0	245,0	357,5	462,0	414,5	463,5
07. Pontos entregues	328,5	288,5	335,5	295,5	415,5	375,5	370	413,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	270,50	239,00	249,00	207,50	296,00	313,50	280,50	331,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	58,00	49,50	86,50	88,00	119,50	62,00	89,50	82,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	5	3	12	13	14	10	6	4
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	107	106	98	68	92	81	80	100
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	43	32	50	72	78	47	75	48
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	3	3	5	9	6	4	2	2
14. Horas de correção de bug	0h00m							
15. Pontos de retrabalho	3,5	3	4	5	6	3,5	1,5	3
16. Produtividade planejada	0,242	0,215	0,254	0,224	0,241	0,335	0,323	0,337
17. Produtividade realizada	0,290	0,283	0,304	0,292	0,309	0,297	0,309	0,322
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	94,4	91,3	100,5	97,3	114,2	81,3	102,8	107,5
19. % Pontos NP / Pontos entregues	17,7	17,2	25,8	29,8	28,8	16,6	24,2	20

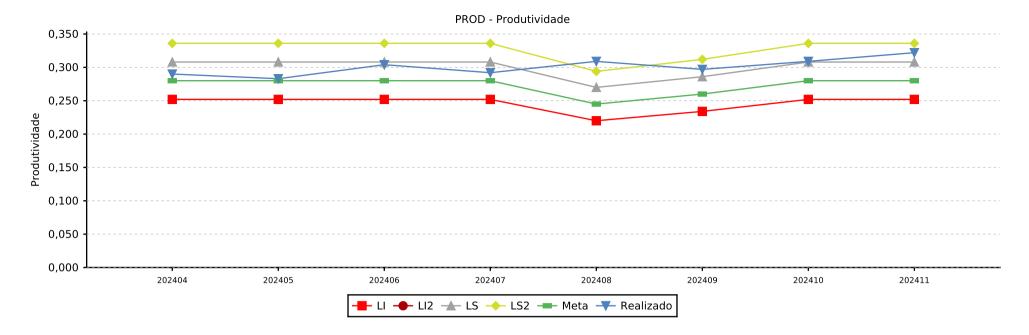


	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411
Realizado	0,290	0,283	0,304	0,292	0,309	0,297	0,309	0,322
Meta	0,280	0,280	0,280	0,280	0,245	0,260	0,280	0,280
LS2	0,336	0,336	0,336	0,336	0,294	0,312	0,336	0,336
LS	0,308	0,308	0,308	0,308	0,270	0,286	0,308	0,308
LI2								
LI	0,252	0,252	0,252	0,252	0,220	0,234	0,252	0,252

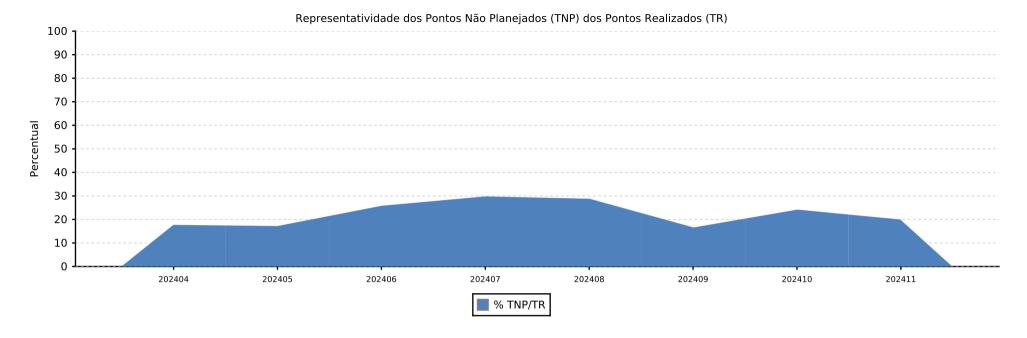


	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411
TR - Pontos Realizados	328.5	288.5	335.5	295.5	415.5	375.5	370	413.5
TNP - Pontos Não Planejados	58	49.5	86.5	88	119.5	62	89.5	82.5
% TNP/TR	17,7	17,2	25,8	29,8	28,8	16,6	24,2	20,0

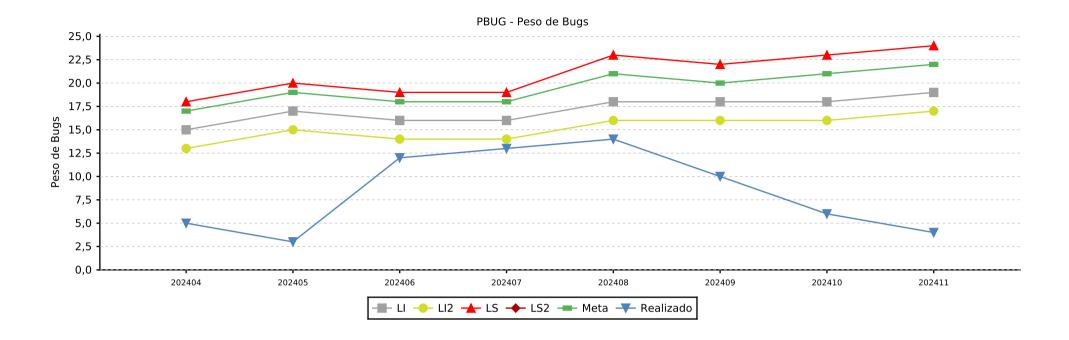


	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411
Realizado	5	3	12	13	14	10	6	4
Meta	17	19	18	18	21	20	21	22
LS2								
LS	18	20	19	19	23	22	23	24
LI2	13	15	14	14	16	16	16	17
LI	15	17	16	16	18	18	18	19
Pontos Entregues	328.5	288.5	335.5	295.5	415.5	375.5	370	413.5
% PBUG / TR	1,53	1,04	3,58	4,40	3,37	2,67	1,63	0,97

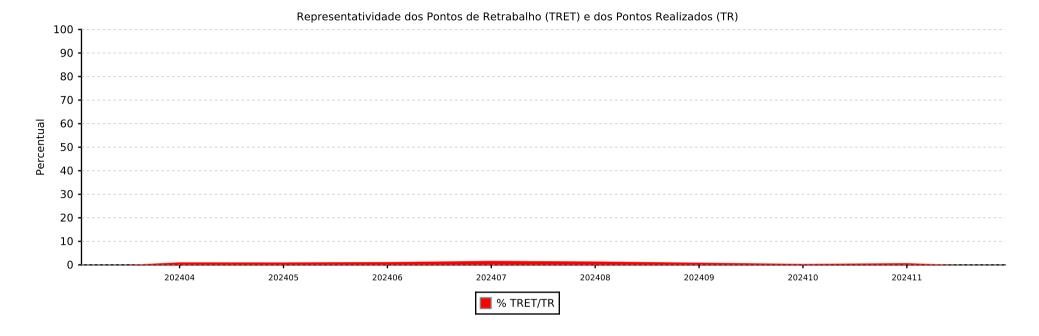

	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411
TR - Pontos Realizados	328.5	288.5	335.5	295.5	415.5	375.5	370	413.5
TRET - Pontos de Retrabalho	3.5	3	4	5	6	3.5	1.5	3
% TRET/TR	1,1	1,0	1,2	1,7	1,4	0,9	0,4	0,7

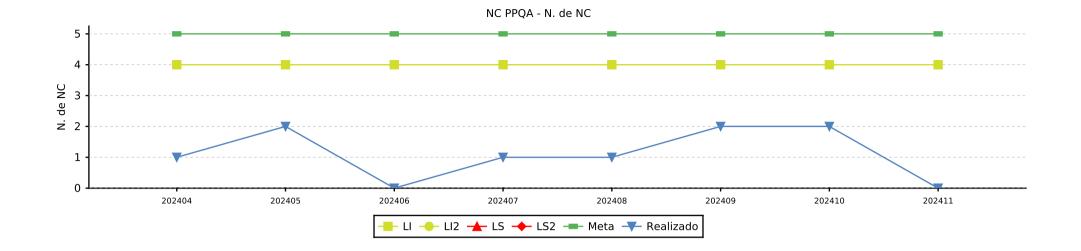

	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411
Realizado	1	2	0	1	1	2	2	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

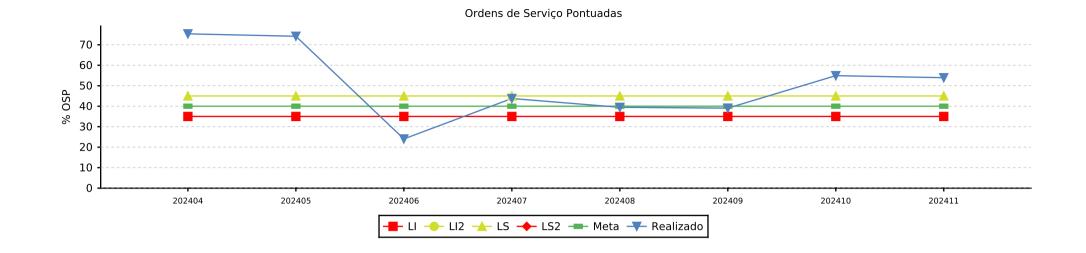


	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411
Realizado	75.33	74.16	24.03	43.77	39.47	39.06	54.92	53.93
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [61.89%]
- Analise de Sistema [6.87%]
- Code Review [3.83%]
- O Daily Scrum [3.8%]
- Retrospectiva [3.15%]
- Cafe [2.7%]
- Atestado [2.6%]
- Sprint Planning 1 [2.51%]
- Ausencia [1.77%]
- Sizing [1.54%]
- Ginastica Laboral [1.5%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.15%]
- Sprint Planning 2 [1.06%]
- Atualizacao de Versao [0.78%]
- Verificando apontamento [0.64%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.6%]
- Reuniao [0.57%]
- Analise de O.S [0.46%]
- Treinamento [0.43%]
- Outros [0.39%]
- Banheiro [0.36%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.3%]
- Atividades Gerenciais [0.21%]
- Analise Retorno O.S. [0.2%]
- Curso/Palestra [0.15%]
- Preparando ambiente [0.11%]
- Correção de Erros Interno [0.09%]
- Clean Code [0.07%]

- Manutenção de Servidores [0.07%]
- Planejamento de Projeto [0.06%]
- Documentação [0.05%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.05%]
- Recursos Humanos [0.03%]
- Merge O.S. [0.02%]

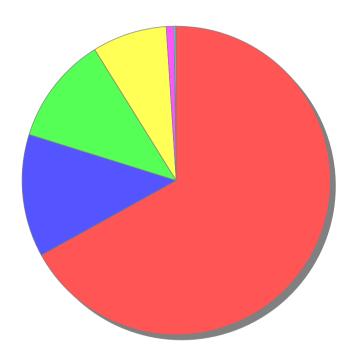

- Desenvolvimento de Requisitos [63.85%]
- Gestao de Requisitos [12.27%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [10.79%]
- Diversos* [7.47%]
- Integracao de Produto [0.78%]
- Treinamento na Organizacao [0.15%]
- Planejamento de Projeto [0.06%]
