

INDICADORES DA SPRINT

		202	411			202	412	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	410h00m	446h00m	446h00m	410h00m	402h00m	312h00m	348h00m	426h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	435h45m	419h18m	454h08m	425h52m	395h54m	283h59m	332h01m	456h06m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	328h15m	359h35m	360h15m	328h05m	320h45m	244h02m	271h12m	340h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	306h03m	305h04m	354h05m	320h04m	297h05m	194h24m	226h22m	302h24m
05. Pontos planejados	89,5	118,0	123,0	133,0	82,5	107,5	112,0	108,5
06. Pontos entregues	110	84	110,5	109	80	43	95,5	98
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	76,50	79,00	91,50	84,00	72,00	40,50	86,50	90,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	33,50	5,00	19,00	25,00	8,00	2,50	9,00	7,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	4	0	0	3	1
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	29	26	19	26	21	13	25	28
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	11	8	10	19	8	4	11	13
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	2	0	0	1	1
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0	1,5	1,5	8	0	2	1
15. Produtividade planejada	0,273	0,329	0,342	0,406	0,258	0,441	0,413	0,320
16. Produtividade realizada	0,360	0,276	0,313	0,341	0,270	0,222	0,422	0,325
17. % Pontos NP / Pontos entregues	30,5	6	17,2	23	10	5,9	9,5	7,7

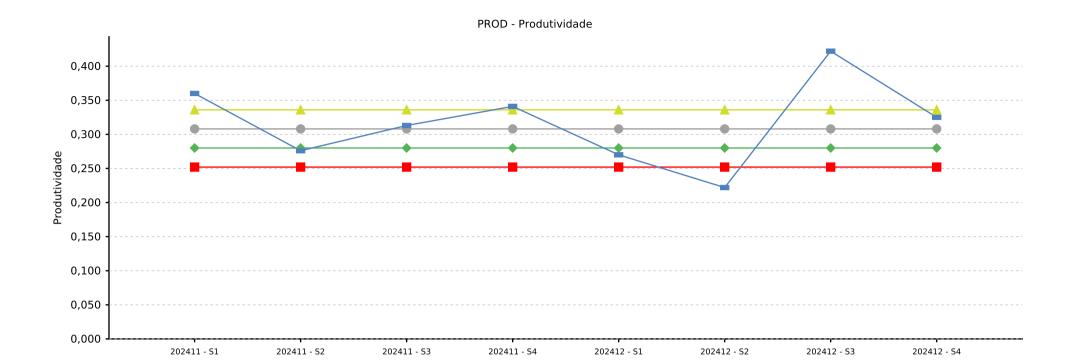


 LI
 → LS
 → Meta
 → Realizado

		202	411			202	412	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,360	0,276	0,313	0,341	0,270	0,222	0,422	0,325
Meta	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
LS2	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
LS	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308
LI	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252

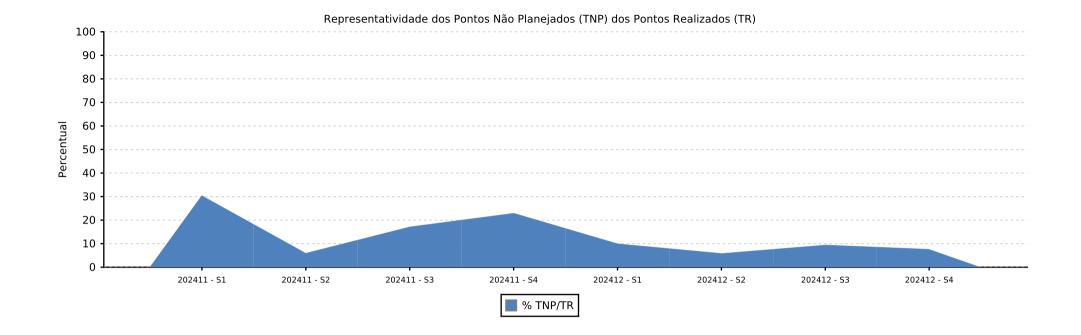


		202	411			202	412	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	110	84	110.5	109	80	43	95.5	98
TNP - Pontos Não Planejados	33.5	5	19	25	8	2.5	9	7.5
% TNP/TR	30,5	6,0	17,2	23,0	10,0	5,9	9,5	7,7

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

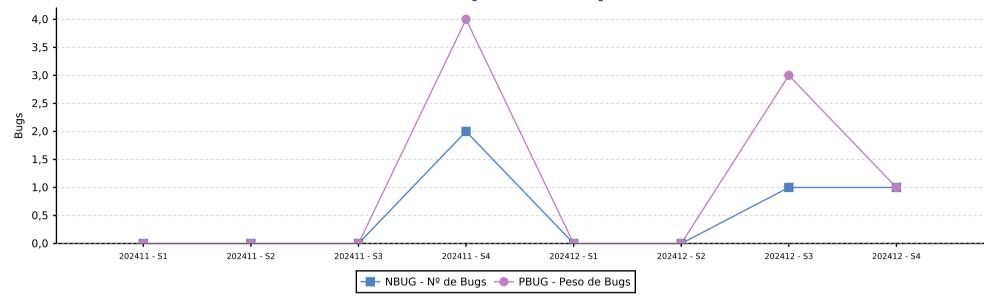

		202	411		202412				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	2	0	0	1	1	
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	4	0	0	3	1	
Pontos Entregues	110	84	110.5	109	80	43	95.5	98	
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	3,67	0,00	0,00	3,15	1,03	

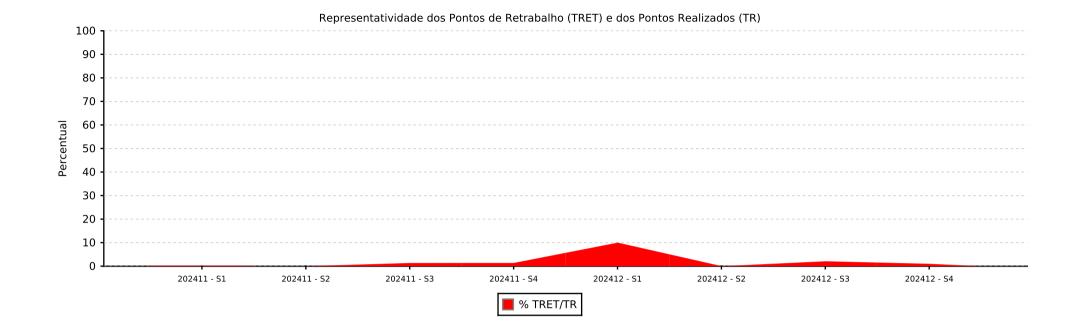


		202	411			202	412	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	110	84	110.5	109	80	43	95.5	98
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	1.5	1.5	8	0	2	1
% TRET/TR	0,0	0,0	1,4	1,4	10,0	0,0	2,1	1,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	261,33	241,45	194,12	164,45	215,53	189,05	279	248,62	949,98	843,57	88,8 %
Ausencia	1	26,75	1	11,32	1	16	1	35,42	4	89,49	2.237,2
Analise de Sistema	20,25	21,75	16,5	25,25	17,5	20,08	20,5	31,48	74,75	98,56	131,9 %
Code Review	14	8,97	13,8	11,63	18,8	28,55	19	23,2	65,6	72,35	110,3 %
Daily Scrum	15,92	14,07	11,25	9,63	12,58	10,85	15,58	13,75	55,33	48,3	87,3 %
Retrospectiva	14,25	13,43	13,08	3,85	14,58	5,42	14,58	13,67	56,49	36,37	64,4 %
Cafe	11,42	10,2	8,25	7,05	9,5	7,45	11,17	10,63	40,34	35,33	87,6 %
Sizing	6	0	4	5,58	4	0	6	10,4	20	15,98	79,9 %
Atualizacao de Versao	2,5	2,82	2	1,25	2	5,72	2,5	9,22	9	19,01	211,2 %
Sprint Planning 1	14,83	7,67	13,33	3,5	14,83	6,67	14,83	7,17	57,82	25,01	43,3 %
Ginastica Laboral	7	5,63	5,17	4,7	6	5,6	6,83	6,6	25	22,53	90,1 %
Treinamento	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	6,58	1	6,58	658,0 %
Analise de O.S	2,33	0,98	2,33	2,5	2,33	4,08	2,33	6,12	9,32	13,68	146,8 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	5,75	1,85	5,58	2,9	5,92	1,57	5,92	5,72	23,17	12,04	52,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,5	13,85	0,5	6,68	0,5	1,67	0,5	5,58	2	27,78	1.389,0
Verificando apontamento	5,08	2,32	4,25	2,87	4,67	1,37	5	4,12	19	10,68	56,2 %
Sprint Planning 2	5	3,63	4,5	1,8	5	4,67	5	3,33	19,5	13,43	68,9 %
Preparando ambiente	0,33	0,5	0	1,58	0	1	0	2,17	0,33	5,25	1.590,9
Atividades Gerenciais	1	4,47	1	0,83	1	1,03	1	1,72	4	8,05	201,3 %
Banheiro	1,5	1,23	1,5	0,98	1,5	1,45	1,5	1,72	6	5,38	89,7 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	0	1	1,05	1	0	1	1,67	4	2,72	68,0 %
Outros	1	6,53	1	0,38	1	1,25	1	1,63	4	9,79	244,7 %
Documentação	0	0,25	0	0,12	0	0,23	0	1,18	0	1,78	0,0 %
Reuniao	2	5,88	1	6,75	1	2,12	2,17	1,17	6,17	15,92	258,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,58	0	0,58	0	0,58	0	0,58	0,75	2,32	0,75	32,3 %
Clean Code	3,42	0,17	3,08	0,5	3,5	2,33	3,58	0,67	13,58	3,67	27,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0,17	1,5	0,17	1,83	0,17	2,17	0,17	0,5	0,68	6	882,4 %
Geração de Atas	0,25	0	0,25	0	0,25	0,25	0,25	0,43	1	0,68	68,0 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,75	0,4	1,75	0,4	22,9 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %

Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,32	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	2,25	0	0	0	0	0	2,25	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,92	0	0,75	0	1	0	1	0	3,67	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0,78	0	0	0	0,78	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	10,67	0	0	0	10,67	0,0 %
Correção de Erros Interno	1,42	0	1,25	2,73	1,5	0	1,5	0	5,67	2,73	48,1 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	402	395,9	311,99	283,96	347,99	332,03	425,99	456,12	1.487,97	1.468,01	98,7 %




% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [54.51%]
- Ausencia [7.77%]
- Analise de Sistema [6.9%]
- Code Review [5.09%]
- Daily Scrum [3.01%]
- Retrospectiva [3%]
- Cafe [2.33%]
- Sizing [2.28%]
- Atualizacao de Versao [2.02%]
- Sprint Planning 1 [1.57%]
- Ginastica Laboral [1.45%]
- Treinamento [1.44%]
- Analise de O.S [1.34%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.25%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.22%]
- Verificando apontamento [0.9%]
- Sprint Planning 2 [0.73%]
- Preparando ambiente [0.48%]
- Atividades Gerenciais [0.38%]
- Banheiro [0.38%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.37%]
- Outros [0.36%]
- Documentação [0.26%]
- Reuniao [0.26%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.16%]
- Clean Code [0.15%]
- Organização sala / equipamento [0.11%]

- Analise Retorno O.S. [0.11%]
- Geração de Atas [0.09%]
- Planejamento de Projeto [0.09%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisito	S	273,92	257,32	205,87	177,27	228,53	194,62	292,08	261,33	1.000,4	890,54	89,0 %
DIV - Diversos*		24,42	59,47	18,42	32,08	20,5	34,23	24,17	58,83	87,51	184,61	211,0 %
REQM - Gestao de Requisitos		46,58	35,05	38,5	39,55	41,5	34,58	46,5	55,05	173,08	164,23	94,9 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	44,17	36,47	38,13	25,12	45,97	44,82	49,17	50,62	177,44	157,03	88,5 %
PI - Integracao de Produto		2,5	2,82	2	1,25	2	5,72	2,5	9,22	9	19,01	211,2 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	1,75	0,4	1,75	0,4	22,9 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		0,83	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,82	0	0,0 %
	Total Geral	392,42	391,13	303,25	275,27	338,83	313,97	416,5	435,45	1.451	1.415,82	97,6 %

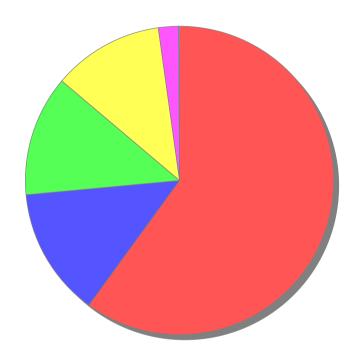


- Desenvolvimento de Requisitos [60.01%]
- Diversos* [13.51%]
- Gestao de Requisitos [12.64%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [11.62%]
- Integracao de Produto [2.12%]
- O Planejamento de Projeto [0.09%]

INDICADORES DO PROJETO


	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412
01. Horas planejadas de todas atividades	1455h00m	1534h00m	1409h00m	1852h00m	1739h44m	1619h00m	1712h00m	1488h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1619h36m	1608h45m	1556h47m	1874h28m	1710h24m	1596h58m	1735h03m	1468h00m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1130h30m	1193h00m	1094h00m	1483h50m	1381h29m	1285h05m	1376h10m	1175h59m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	1022h38m	1104h55m	1014h08m	1346h36m	1265h23m	1201h02m	1285h16m	1020h15m
05. Pontos planejados para o projeto	316,0	334,0	304,0	364,0	462,0	360,0	385,0	330,0
06. Pontos planejados	242,0	302,0	245,0	357,5	462,0	414,5	463,5	410,5
07. Pontos entregues	288,5	335,5	295,5	415,5	375,5	370	413,5	316,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	239,00	249,00	207,50	296,00	313,50	280,50	331,00	289,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	49,50	86,50	88,00	119,50	62,00	89,50	82,50	27,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	3	12	13	14	10	6	4	4
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	106	98	68	92	81	80	100	87
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	32	50	72	78	47	75	48	36
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	3	5	9	6	4	2	2	2
14. Horas de correção de bug	0h00m							
15. Pontos de retrabalho	3	4	5	6	3,5	1,5	3	11
16. Produtividade planejada	0,215	0,254	0,224	0,241	0,335	0,323	0,337	0,350
17. Produtividade realizada	0,283	0,304	0,292	0,309	0,297	0,309	0,322	0,311
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	91,3	100,5	97,3	114,2	81,3	102,8	107,5	96
19. % Pontos NP / Pontos entregues	17,2	25,8	29,8	28,8	16,6	24,2	20	8,6

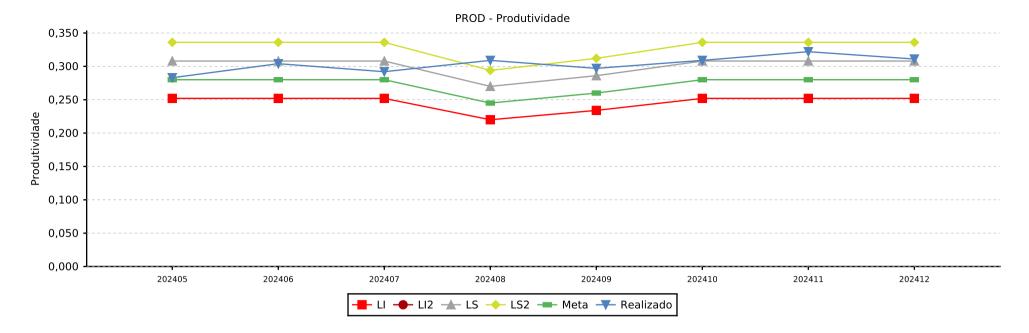


	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412
Realizado	0,283	0,304	0,292	0,309	0,297	0,309	0,322	0,311
Meta	0,280	0,280	0,280	0,245	0,260	0,280	0,280	0,280
LS2	0,336	0,336	0,336	0,294	0,312	0,336	0,336	0,336
LS	0,308	0,308	0,308	0,270	0,286	0,308	0,308	0,308
LI2								
LI	0,252	0,252	0,252	0,220	0,234	0,252	0,252	0,252

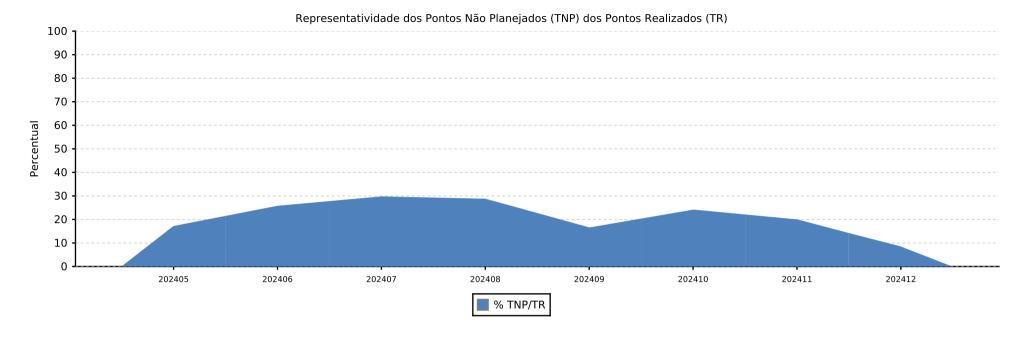


	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412
TR - Pontos Realizados	288.5	335.5	295.5	415.5	375.5	370	413.5	316.5
TNP - Pontos Não Planejados	49.5	86.5	88	119.5	62	89.5	82.5	27
% TNP/TR	17,2	25,8	29,8	28,8	16,6	24,2	20,0	8,6

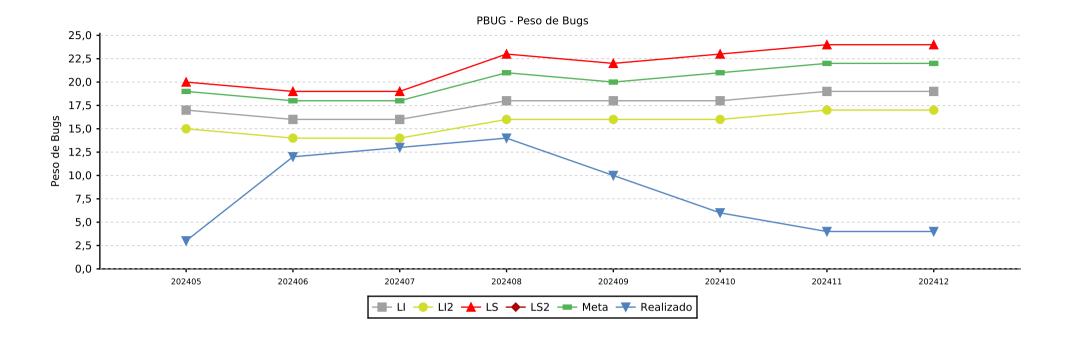


	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412
Realizado	3	12	13	14	10	6	4	4
Meta	19	18	18	21	20	21	22	22
LS2								
LS	20	19	19	23	22	23	24	24
LI2	15	14	14	16	16	16	17	17
LI	17	16	16	18	18	18	19	19
Pontos Entregues	288.5	335.5	295.5	415.5	375.5	370	413.5	316.5
% PBUG / TR	1,04	3,58	4,40	3,37	2,67	1,63	0,97	1,27

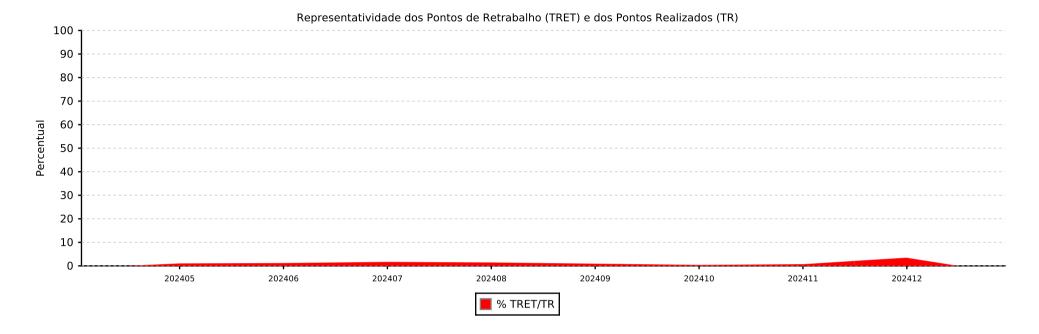

	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412
TR - Pontos Realizados	288.5	335.5	295.5	415.5	375.5	370	413.5	316.5
TRET - Pontos de Retrabalho	3	4	5	6	3.5	1.5	3	11
% TRET/TR	1,0	1,2	1,7	1,4	0,9	0,4	0,7	3,5

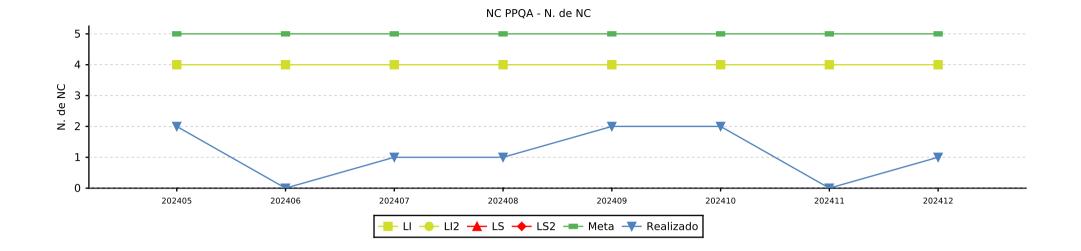

	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412
Realizado	2	0	1	1	2	2	0	1
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4




	202405	202406	202407	202408	202409	202410	202411	202412
Realizado	74.16	24.03	43.77	39.47	39.06	54.92	53.93	58.54
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [57.46%]
- Analise de Sistema [6.71%]
- Ausencia [6.1%]
- Code Review [4.93%]
- Daily Scrum [3.29%]
- Retrospectiva [2.48%]
- Cafe [2.41%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.89%]
- Sprint Planning 1 [1.7%]
- Ginastica Laboral [1.53%]
- Atualizacao de Versao [1.29%]
- Sizing [1.09%]
- Reuniao [1.08%]
- Analise de O.S [0.93%]
- Sprint Planning 2 [0.91%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.82%]
- Atestado [0.73%]
- Verificando apontamento [0.73%]
- Outros [0.67%]
- Atividades Gerenciais [0.55%]
- Treinamento [0.45%]
- Analise Retorno O.S. [0.41%]
- Banheiro [0.37%]
- Preparando ambiente [0.36%]
- Clean Code [0.25%]
- Correção de Erros Interno [0.19%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.19%]
- Auxilio suporte [0.15%]

- Documentação [0.12%]
- Merge O.S. [0.05%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.05%]
- O Geração de Atas [0.05%]
- Organização sala / equipamento [0.03%]
- Planejamento de Projeto [0.03%]

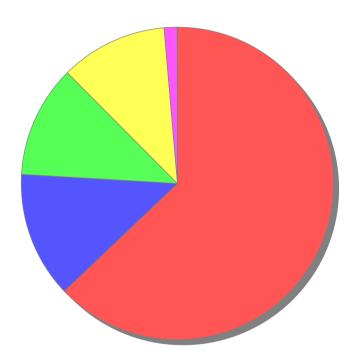

- Desenvolvimento de Requisitos [60.66%]
- Diversos* [12.58%]
- Gestao de Requisitos [11.19%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [10.7%]
- Integracao de Produto [1.29%]
- Planejamento de Projeto [0.03%]
