



INDICADORES DA SPRINT


	202510				202511			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	245h21m	238h33m	251h49m	241h59m	248h36m	219h47m	239h29m	237h54m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	154h10m	153h55m	153h55m	153h45m	149h12m	151h55m	154h55m	154h45m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	154h37m	132h53m	153h48m	161h03m	145h31m	107h35m	136h03m	155h00m
05. Pontos planejados	51,0	44,0	42,5	58,5	52,5	60,0	57,0	66,0
06. Pontos entregues	54	25,5	39	66,5	37,5	41,5	30,5	67
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	18,00	11,50	27,50	56,50	32,50	36,00	26,00	65,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	36,00	14,00	11,50	10,00	5,00	5,50	4,50	2,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	3
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	5	4	6	10	11	7	6	14
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	25	11	9	6	5	7	5	3
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	1
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	0	0	0	1
15. Produtividade planejada	0,331	0,286	0,277	0,381	0,352	0,395	0,368	0,427
16. Produtividade realizada	0,350	0,192	0,254	0,413	0,258	0,386	0,225	0,433
17. % Pontos NP / Pontos entregues	66,7	55	29,5	15,1	13,4	13,3	14,8	3

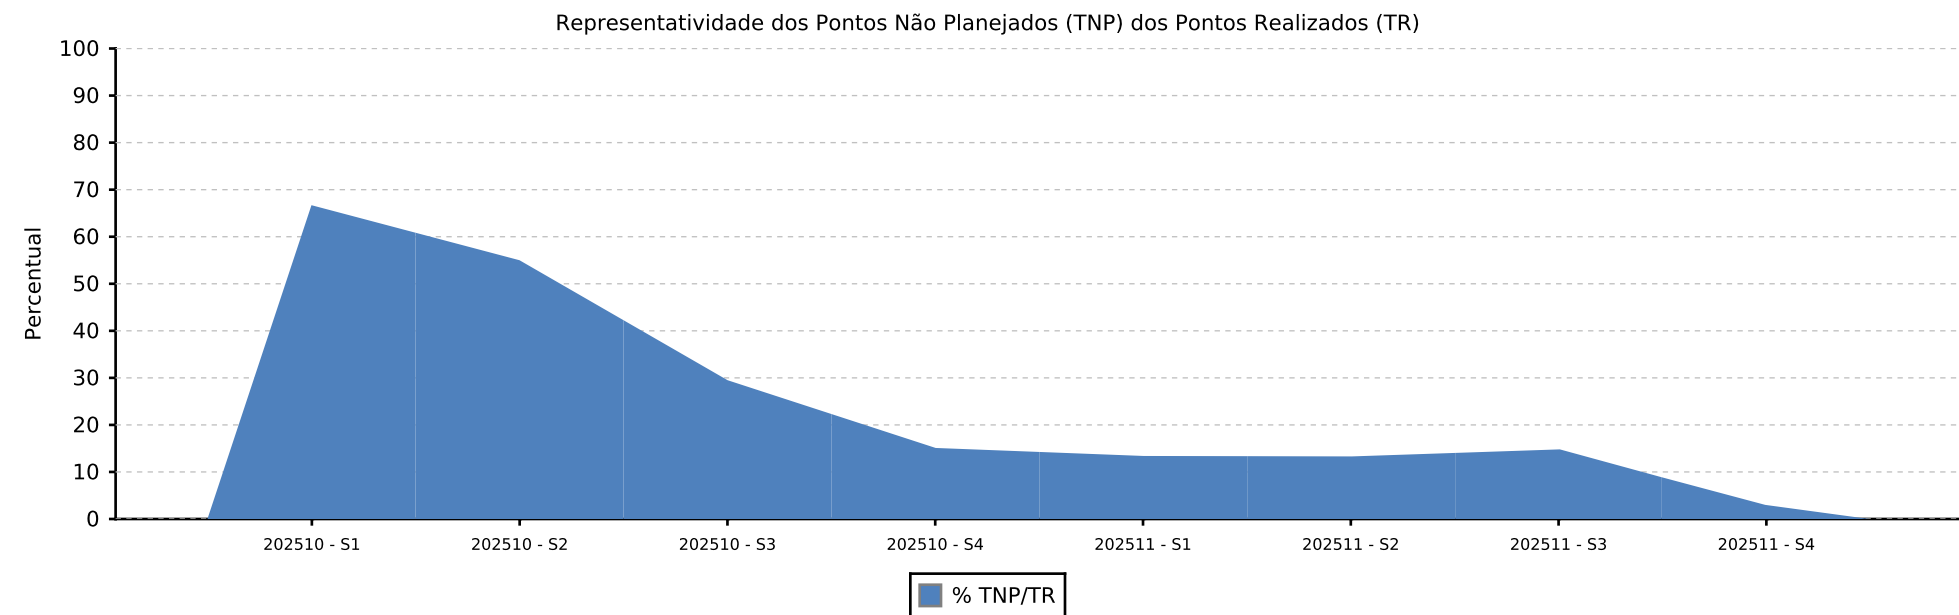

	202510				202511			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	54	25.5	39	66.5	37.5	41.5	30.5	67
TNP - Pontos Não Planejados	36	14	11.5	10	5	5.5	4.5	2
% TNP/TR	66,7	55,0	29,5	15,1	13,4	13,3	14,8	3,0

■ NBUG - Nº de Bugs ● PBUG - Peso de Bugs

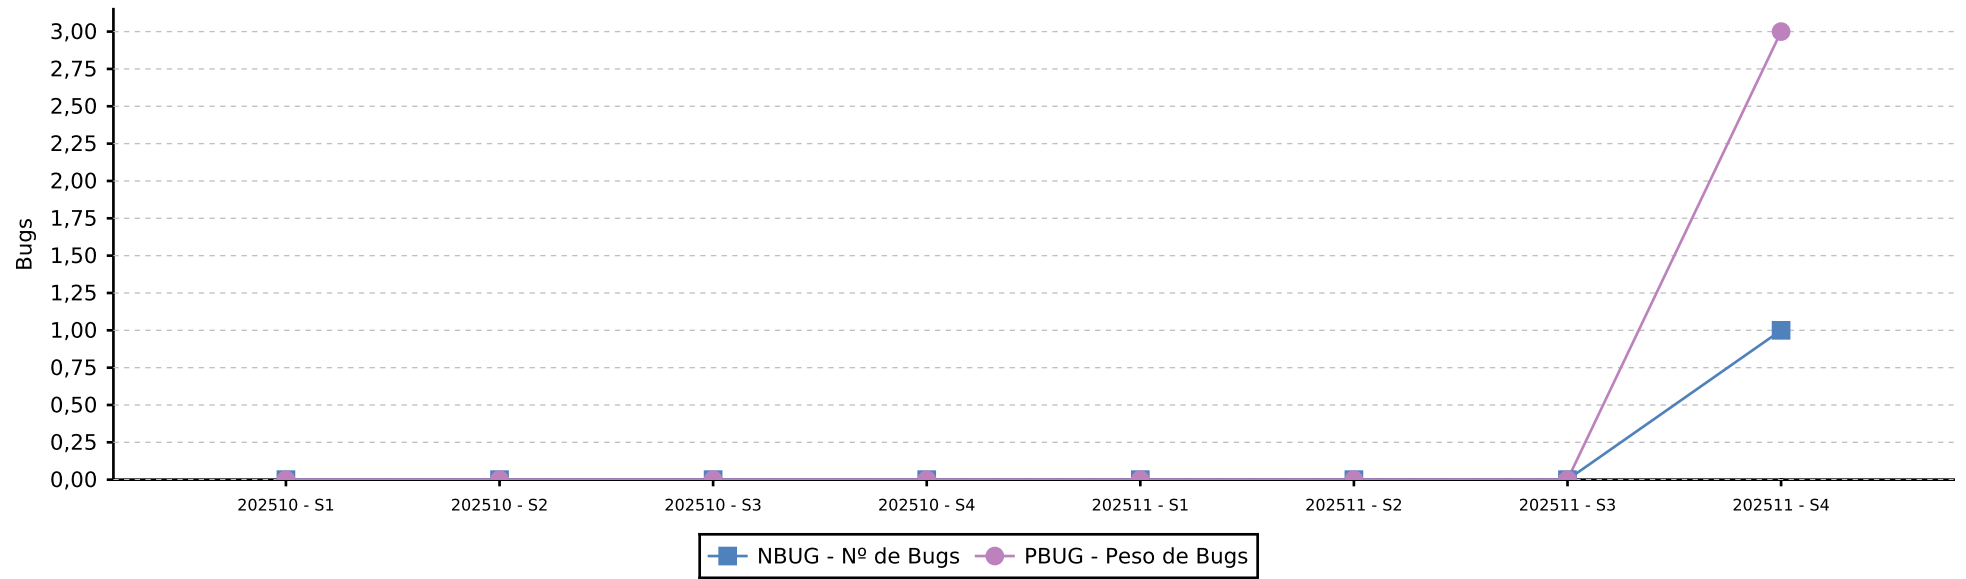[illegible]


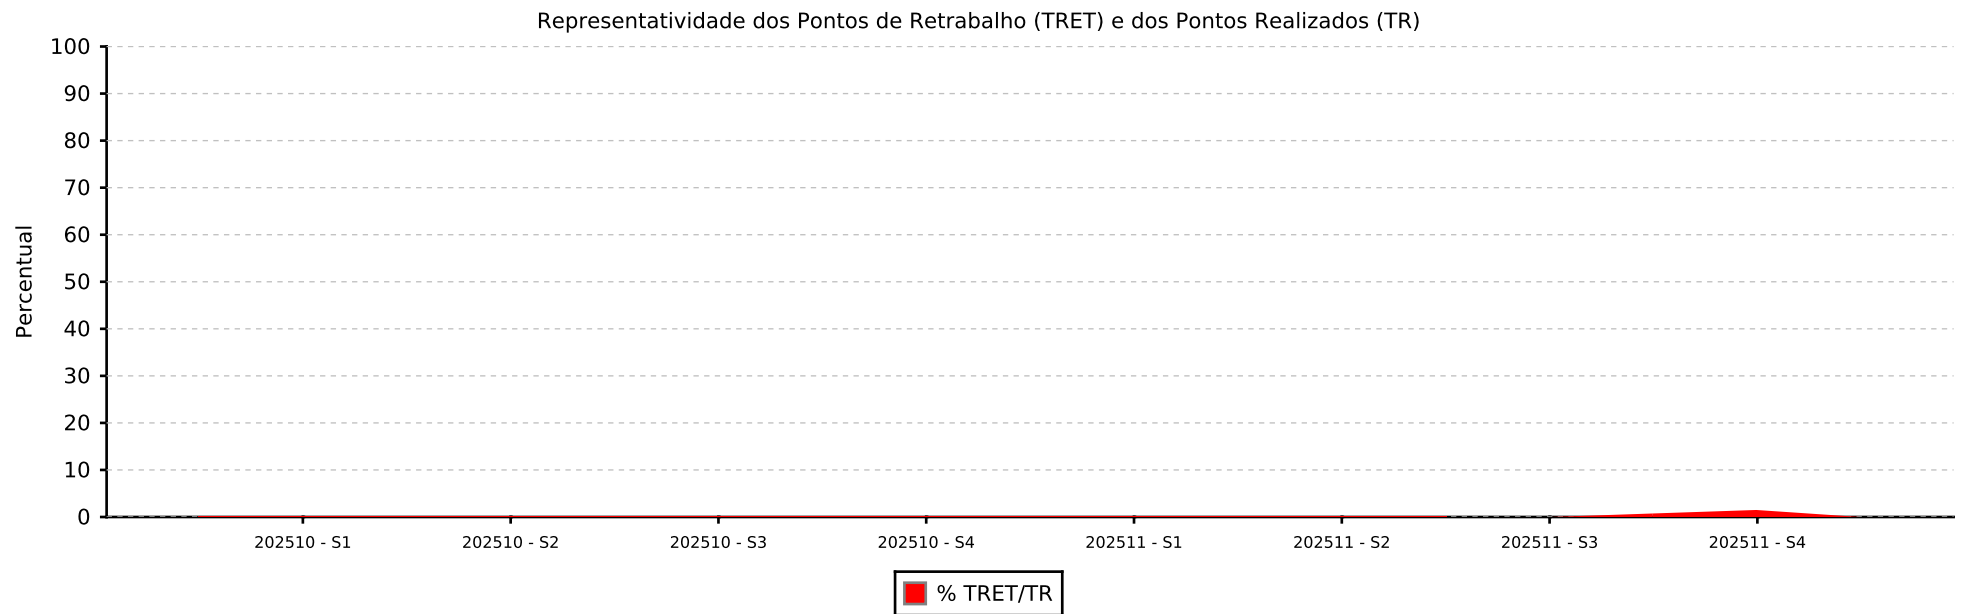
[illegible]

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	3	10	0	0	0	0	3	10	333,3 %
Banheiro	0	0,12	0	0	0	0,12	0	0	0	0,24	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Particular	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,32	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	14,15	0	8,5	0	0	0	22,65	0,0 %
Correção de Erros Interno	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	6	4,5	6	5,52	6	0	6	0	24	10,02	41,8 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0,17	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0	1	0,42	42,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	219,99	248,61	220	219,78	220	239,47	219,99	237,89	879,98	945,75	107,5 %


% de Horas por Atividade

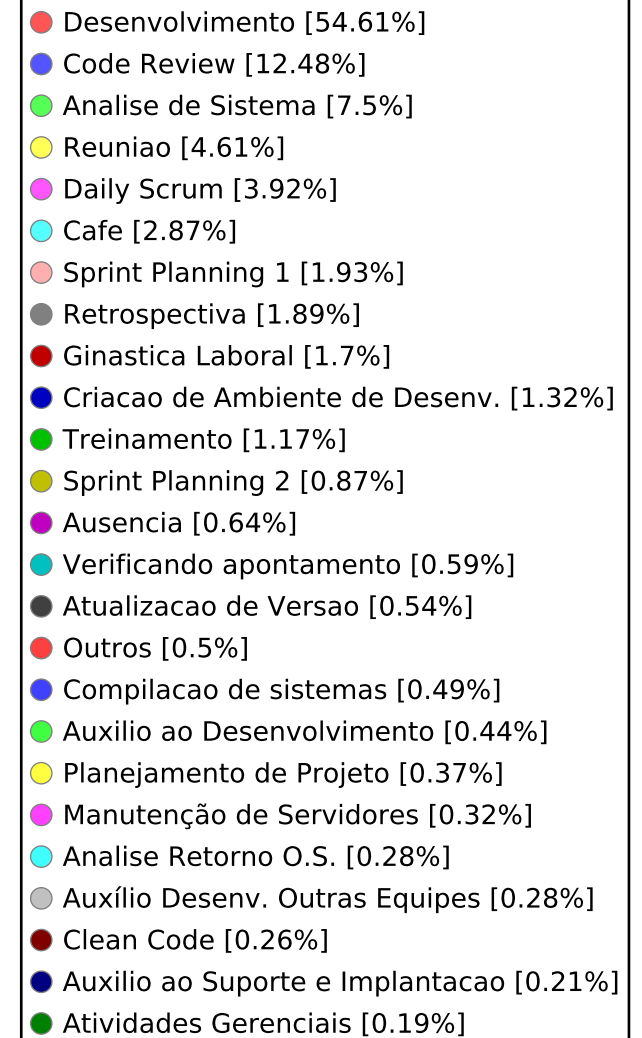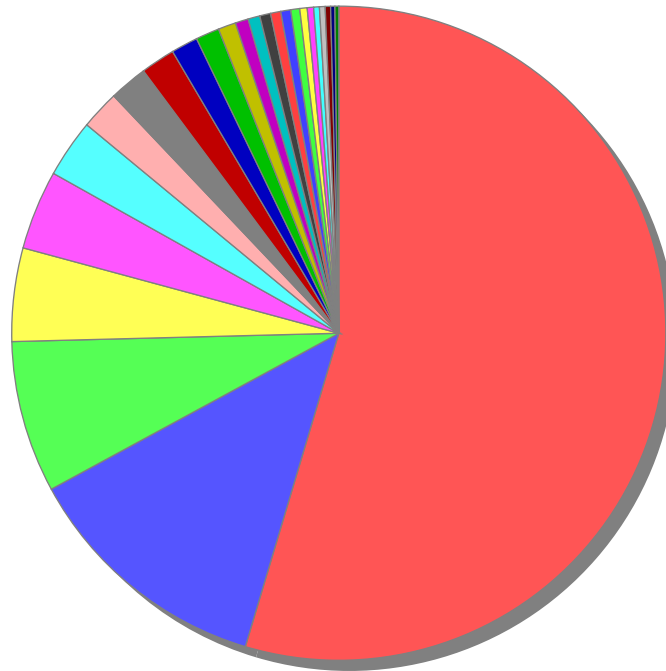

HORAS POR ÁREA DO CMMI


Area CMMI	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	
RD - Desenvolvimento de Requisitos	128,2	121,45	130,92	94,97	133,92	124,45	132,5	135,42	525,54	476,29	90,6 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	33,17	32,32	33,17	29,52	33,17	31,45	33,17	43,52	132,68	136,81	103,1 %
DIV - Diversos*	19,3	29,2	16,58	29	16,58	18,07	16,75	25,53	69,21	101,8	147,1 %
REQM - Gestao de Requisitos	29	57,28	29	35,8	29	48,35	29	25,18	116	166,61	143,6 %
PI - Integracao de Produto	4	4,98	4	2	4	1	4	1,28	16	9,26	57,9 %
CM - Gerencia de Configuracao	0,5	0	0,5	1,42	0,5	3,12	0,5	1,17	2	5,71	285,5 %
PP - Planejamento de Projeto	0	0,25	0	0	0	0	1,25	0,87	1,25	1,12	89,6 %
OT - Treinamento na Organizacao	0	0	3	10	0	0	0	0	3	10	333,3 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	214,17	245,48	217,17	202,71	217,17	226,44	217,17	232,97	865,68	907,6	104,8 %

% de Horas por Área do CMMI

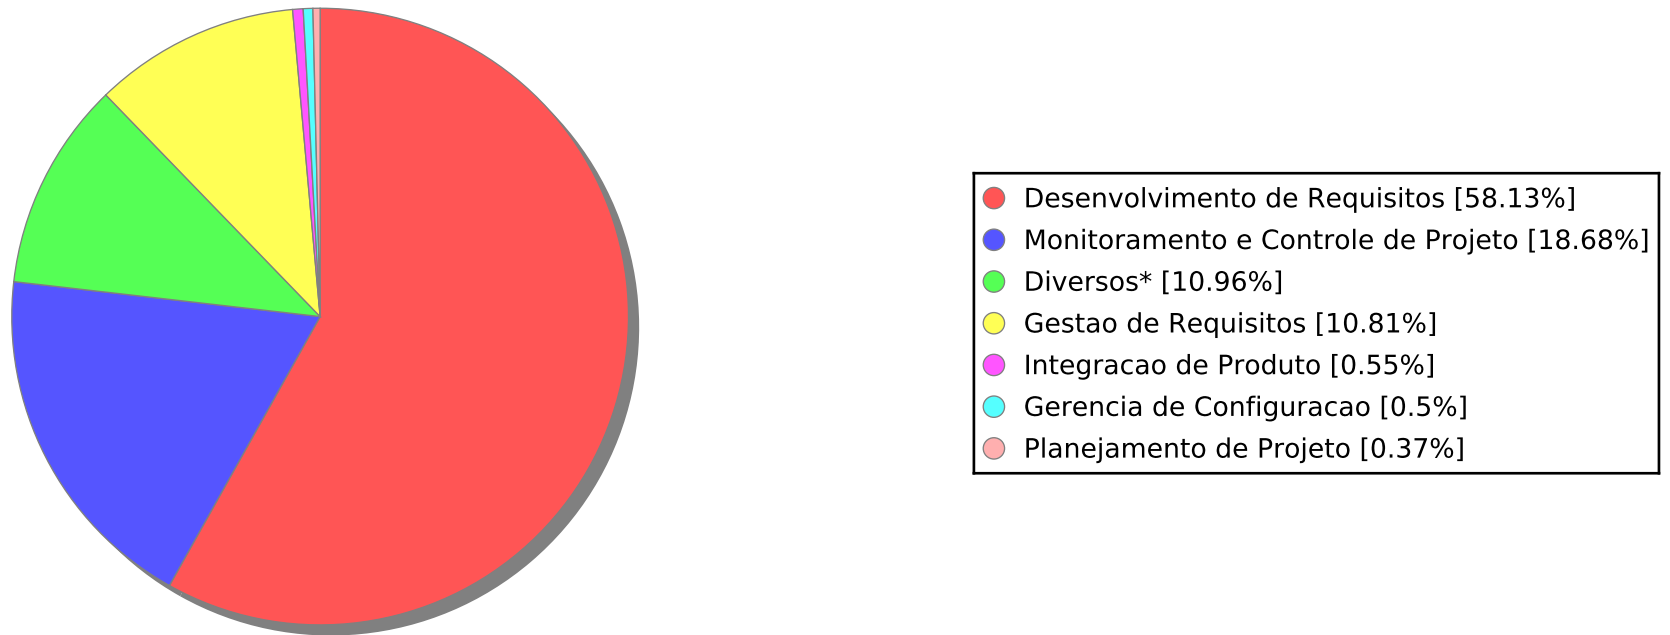


INDICADORES DO PROJETO


	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511
01. Horas planejadas de todas atividades	734h00m	700h00m	1056h00m	1008h00m	1012h00m	972h00m	880h00m	880h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	749h59m	737h25m	1145h23m	1065h58m	1067h31m	1031h19m	977h42m	945h46m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	560h25m	505h40m	788h50m	742h45m	716h25m	687h30m	615h45m	610h47m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	458h21m	450h32m	723h16m	631h18m	665h25m	609h08m	602h21m	544h09m
05. Pontos planejados para o projeto	165,0	148,0	232,0	218,0	216,0	205,0	188,0	186,0
06. Pontos planejados	179,5	153,5	248,5	269,5	223,0	219,0	196,0	235,5
07. Pontos entregues	140,5	134	216,5	190,5	200	187,5	185	176,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	134,00	120,50	188,50	162,00	160,50	146,50	113,50	159,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	6,50	13,50	28,00	28,50	39,50	41,00	71,50	17,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	3	0	6	6	5	9	0	3
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	30	30	42	36	39	30	25	38
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	6	13	19	22	29	32	51	20
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	2	4	2	3	0	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	5h50m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	1	0	2	4,5	1,5	2,5	0	1
16. Produtividade planejada	0,321	0,304	0,316	0,363	0,312	0,319	0,319	0,386
17. Produtividade realizada	0,307	0,298	0,300	0,302	0,301	0,308	0,308	0,325
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	85,2	90,6	93,4	87,4	92,6	91,5	98,5	94,9
19. % Pontos NP / Pontos entregues	4,7	10,1	13	15	19,8	21,9	38,7	9,7

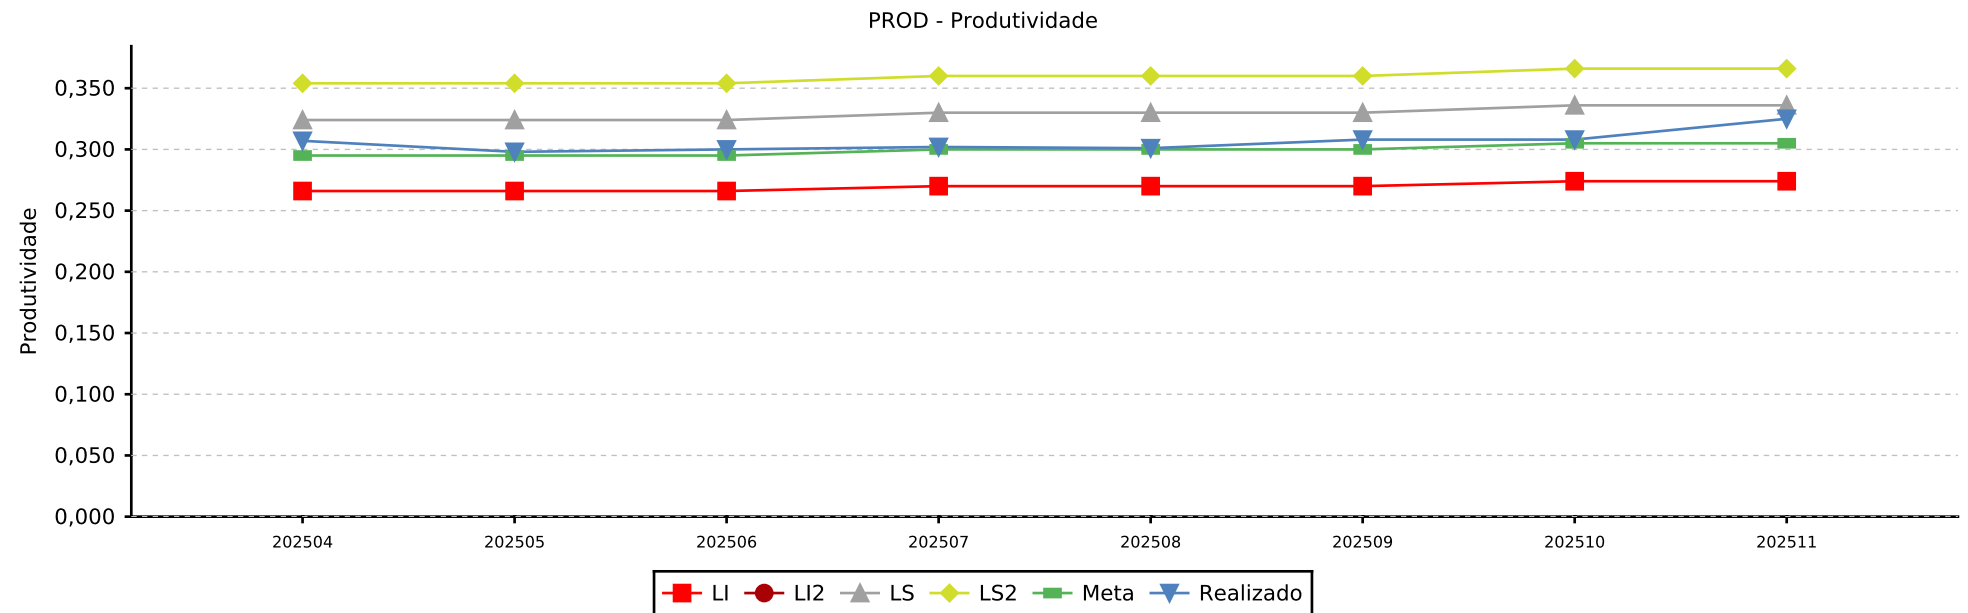


	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511
Realizado	0,307	0,298	0,300	0,302	0,301	0,308	0,308	0,325
Meta	0,295	0,295	0,295	0,300	0,300	0,300	0,305	0,305
LS2	0,354	0,354	0,354	0,360	0,360	0,360	0,366	0,366
LS	0,324	0,324	0,324	0,330	0,330	0,330	0,336	0,336
LI2								
LI	0,266	0,266	0,266	0,270	0,270	0,270	0,274	0,274

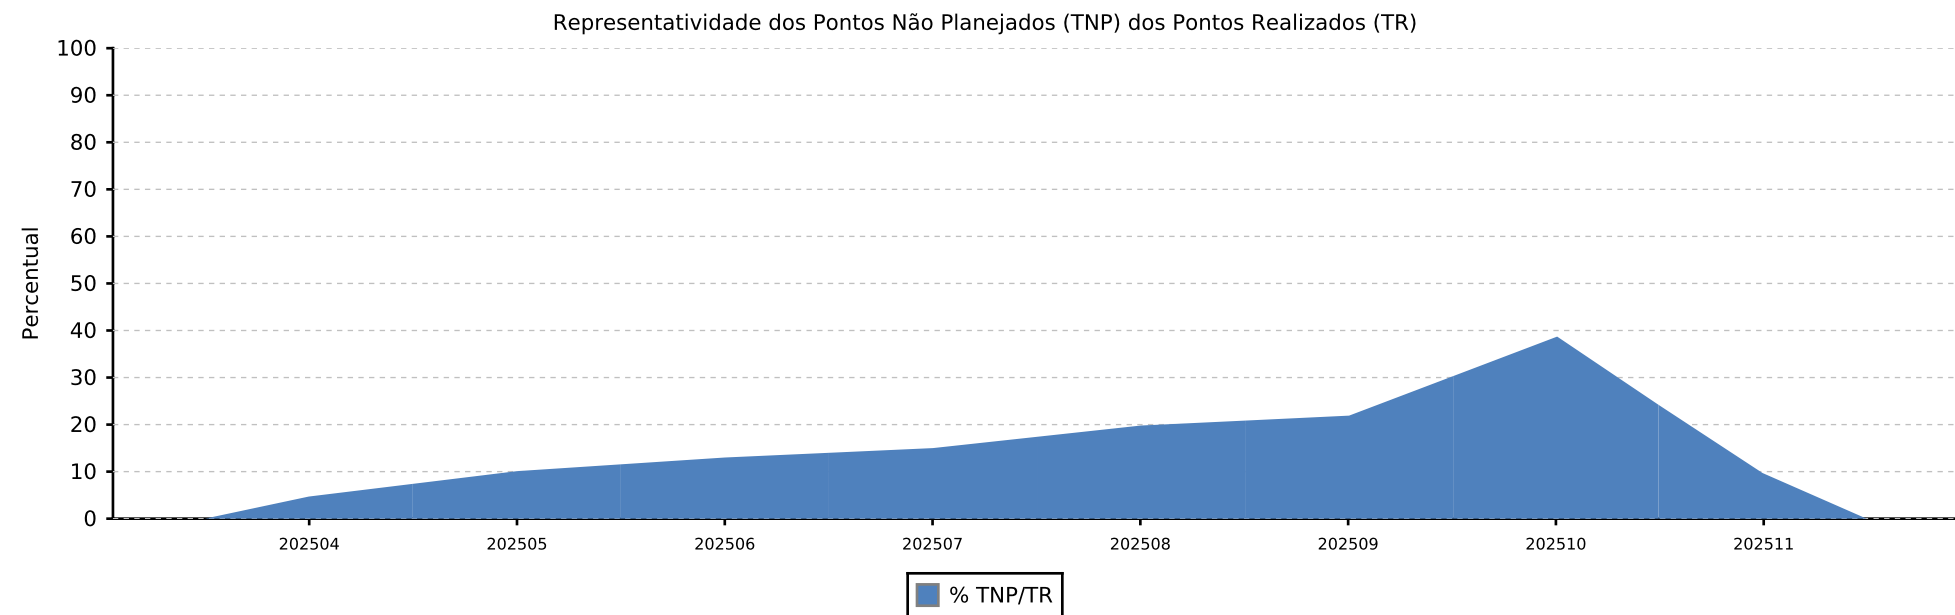


	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511
TR - Pontos Realizados	140.5	134	216.5	190.5	200	187.5	185	176.5
TNP - Pontos Não Planejados	6.5	13.5	28	28.5	39.5	41	71.5	17
% TNP/TR	4,7	10,1	13,0	15,0	19,8	21,9	38,7	9,7

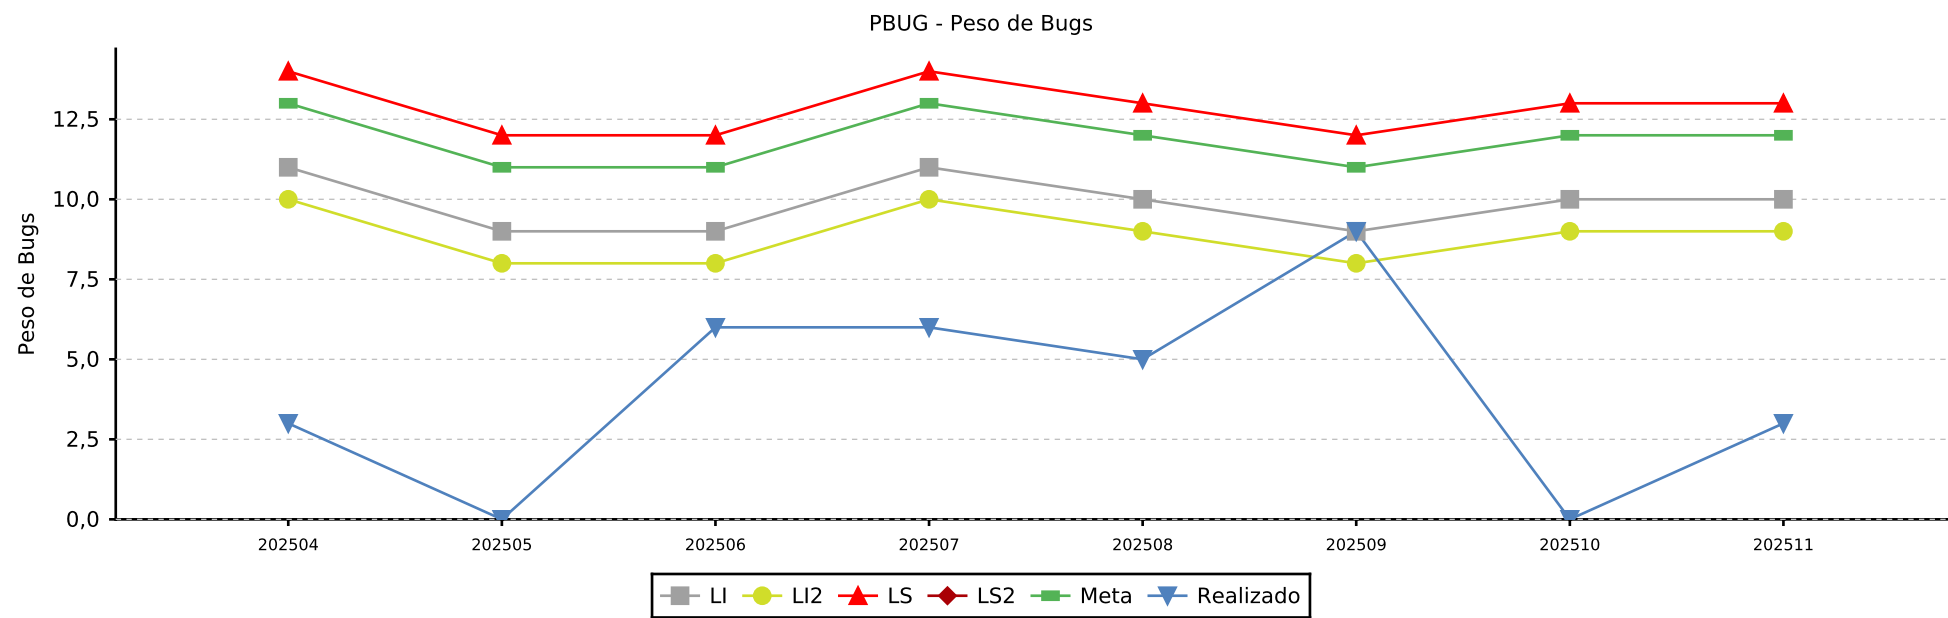


	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511
Realizado	3	0	6	6	5	9	0	3
Meta	13	11	11	13	12	11	12	12
LS2								
LS	14	12	12	14	13	12	13	13
LI2	10	8	8	10	9	8	9	9
LI	11	9	9	11	10	9	10	10
Pontos Entregues	140.5	134	216.5	190.5	200	187.5	185	176.5
% PBUG / TR	2,14	0,00	2,78	3,15	2,50	4,80	0,00	1,70

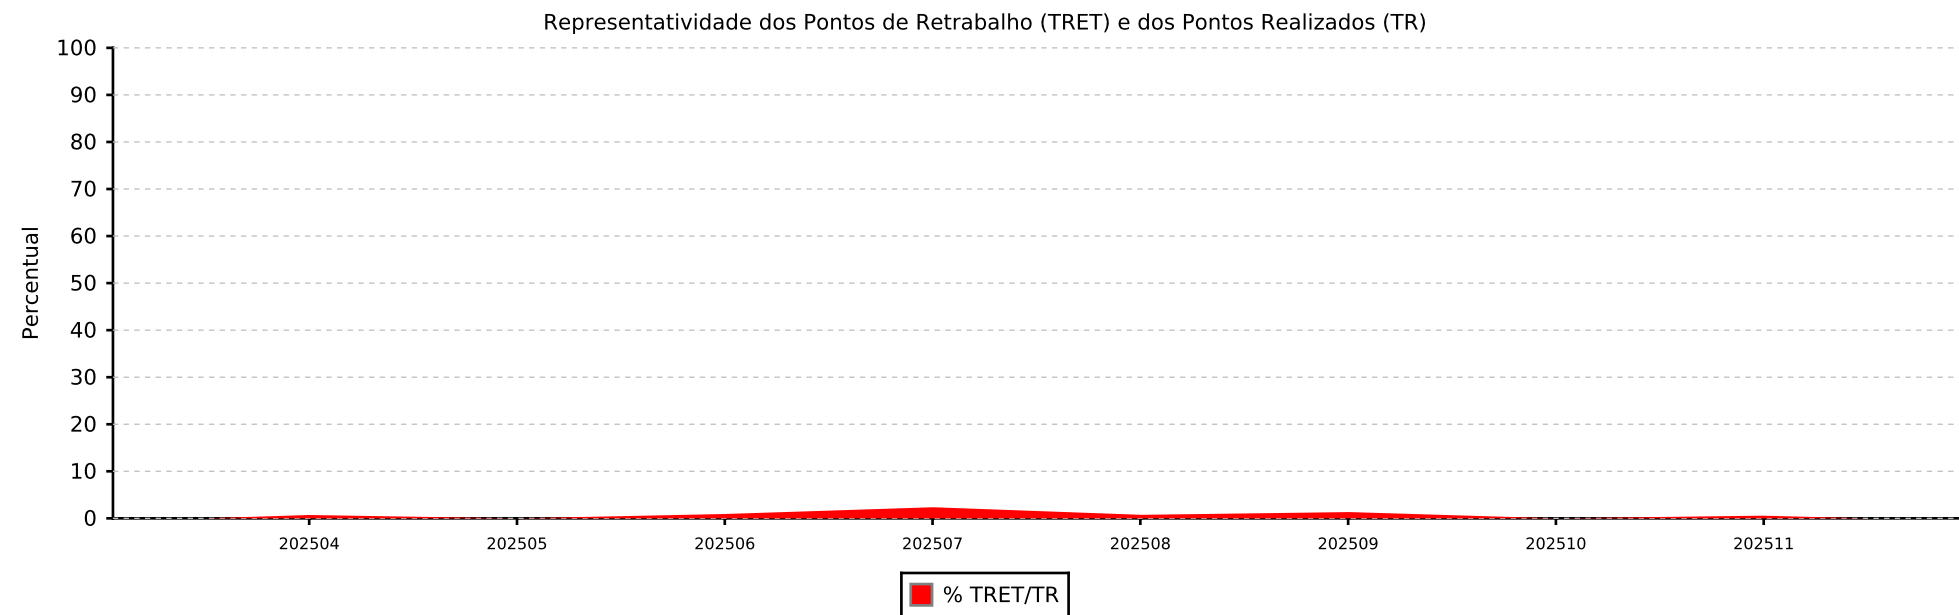

	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511
TR - Pontos Realizados	140.5	134	216.5	190.5	200	187.5	185	176.5
TRET - Pontos de Retrabalho	1	0	2	4.5	1.5	2.5	0	1
% TRET/TR	0,7	0,0	0,9	2,4	0,8	1,3	0,0	0,6

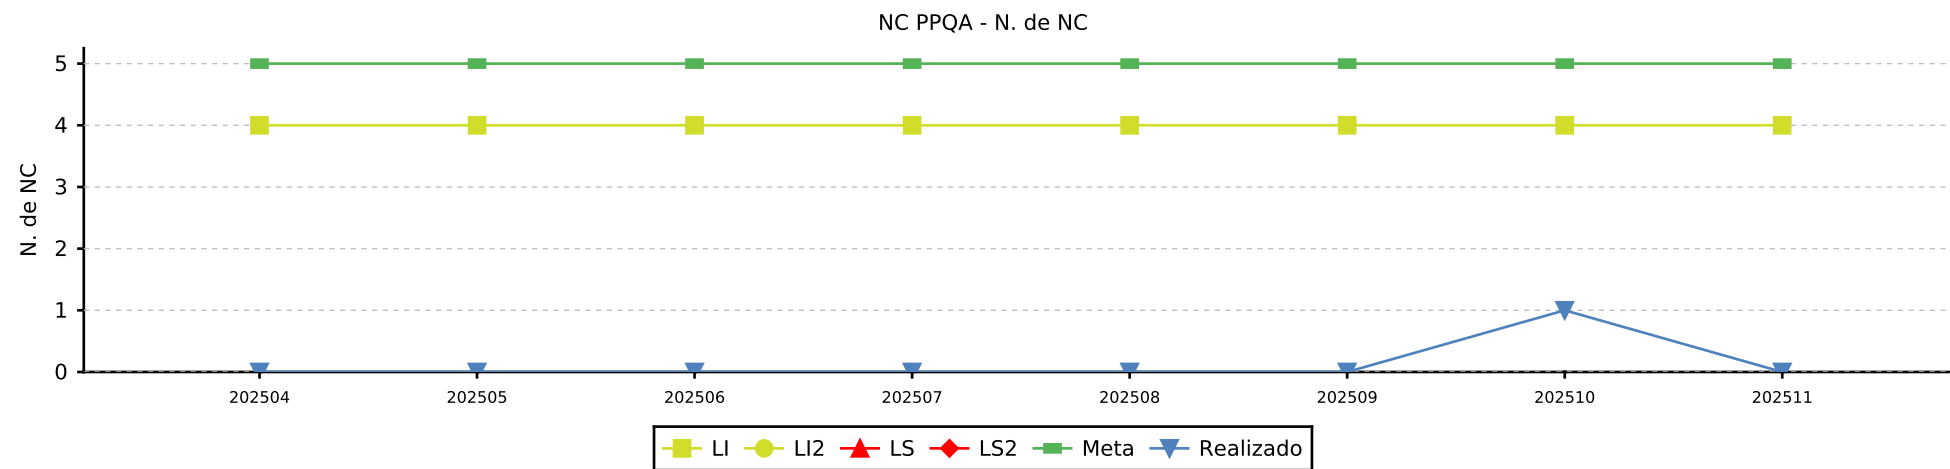


	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511
Realizado	0	0	0	0	0	0	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

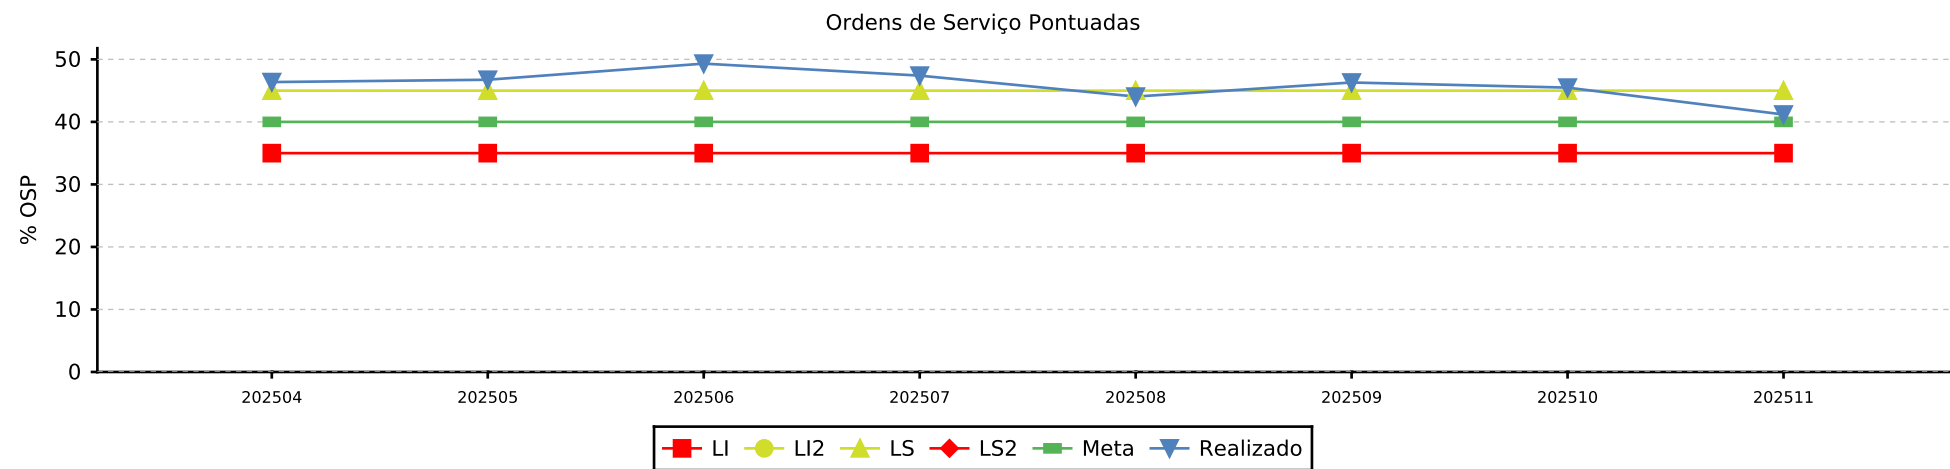

	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510	202511
Realizado	46.37	46.74	49.32	47.4	44.05	46.3	45.48	41.18
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

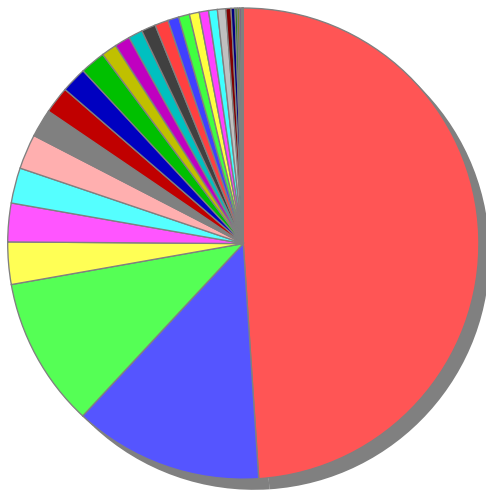

● Desenvolvimento [48.95%]	● Geração de Atas [0.04%]
● Analise de Sistema [12.98%]	● Banheiro [0.02%]
● Code Review [10.28%]	
● Reuniao [2.89%]	
● Cafe [2.65%]	
● Daily Scrum [2.43%]	
● Atestado [2.39%]	
● Ausencia [1.92%]	
● Sprint Planning 1 [1.85%]	
● Retrospectiva [1.75%]	
● Ginastica Laboral [1.72%]	
● Sizing [1.06%]	
● Curso/Palestra [1.06%]	
● Atualizacao de Versao [0.98%]	
● Analise Retorno O.S. [0.98%]	
● Treinamento [0.92%]	
● Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.76%]	
● Sprint Planning 2 [0.75%]	
● Outros [0.68%]	
● Criacao de Ambiente de Desenv. [0.64%]	
● Compilacao de sistemas [0.6%]	
● Verificando apontamento [0.57%]	
● Auxilio ao Desenvolvimento [0.35%]	
● Clean Code [0.27%]	
● Atividades Gerenciais [0.15%]	
● Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.15%]	
● Planejamento de Projeto [0.12%]	
● Manutenção de Servidores [0.08%]	

% de Horas por Área do CMMI

