

INDICADORES DA SPRINT

		202	505			202	506	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	144h00m	156h00m	220h00m	180h00m	264h00m	264h00m	264h00m	264h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	154h25m	162h07m	234h09m	186h44m	298h02m	284h25m	280h08m	282h48m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	104h50m	113h25m	160h00m	127h25m	197h15m	197h15m	197h15m	197h05m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	79h03m	97h17m	159h51m	114h21m	197h29m	190h06m	157h03m	148h04m
05. Pontos planejados	28,0	39,0	52,5	34,0	53,0	74,5	58,0	63,0
06. Pontos entregues	12	35	53	34	57	42,5	57	60
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	7,00	33,00	46,50	34,00	47,50	39,50	47,50	54,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	5,00	2,00	6,50	0	9,50	3,00	9,50	6,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	6
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	4	8	10	8	10	9	13	10
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	4	3	6	0	3	3	5	8
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	2
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	0	0	0	2
15. Produtividade planejada	0,268	0,344	0,329	0,267	0,269	0,378	0,295	0,320
16. Produtividade realizada	0,152	0,360	0,332	0,298	0,289	0,224	0,363	0,406
17. % Pontos NP / Pontos entregues	41,7	5,8	12,3	0	16,7	7,1	16,7	10

PROD - Produtividade

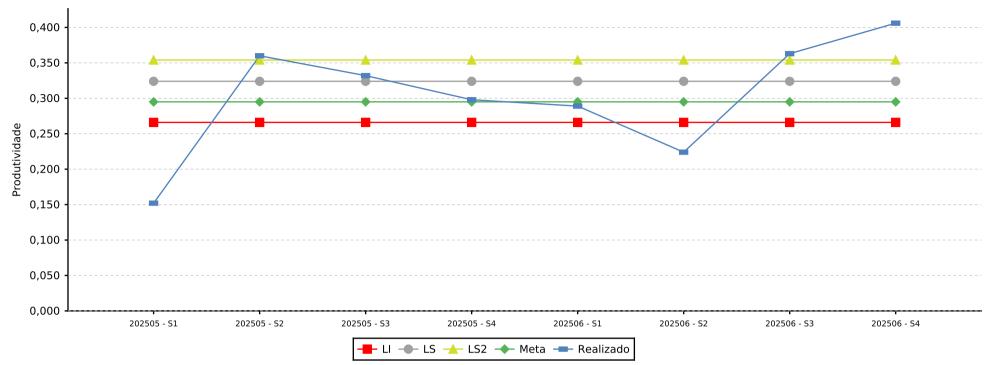


		202	505			202	506	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,152	0,360	0,332	0,298	0,289	0,224	0,363	0,406
Meta	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
LS2	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354
LS	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324
LI	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266

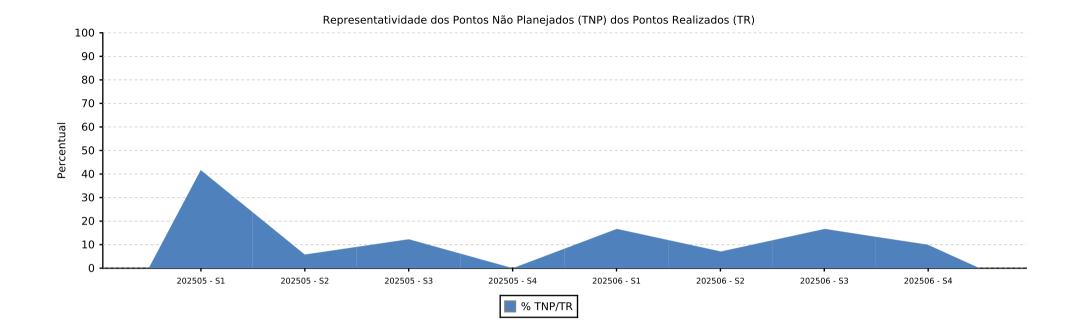


		202	505			202	506	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	12	35	53	34	57	42.5	57	60
TNP - Pontos Não Planejados	5	2	6.5	0	9.5	3	9.5	6
% TNP/TR	41,7	5,8	12,3	0,0	16,7	7,1	16,7	10,0

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

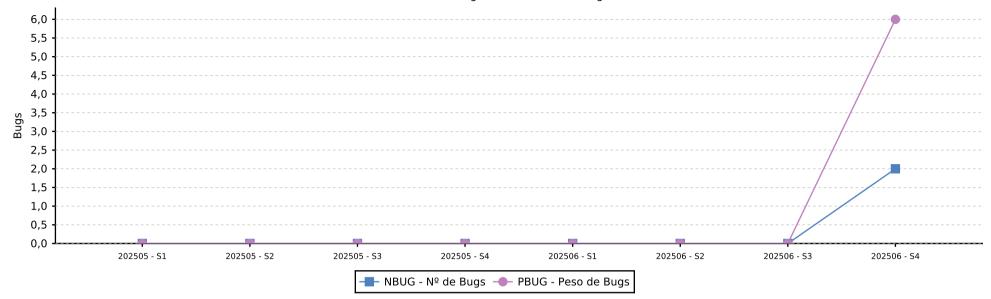

		202	505	-	202506					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	2		
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	6		
Pontos Entregues	12	35	53	34	57	42.5	57	60		
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		

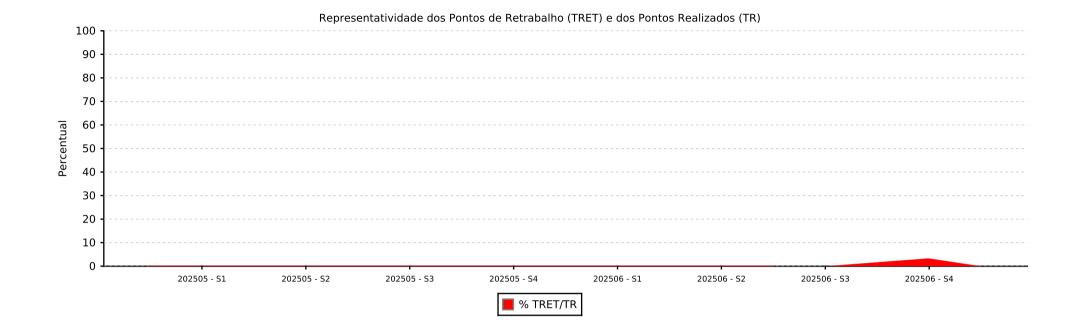


		202	505			202	506	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	12	35	53	34	57	42.5	57	60
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0	0	0	0	2
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3

HORAS POR ATIVIDADE

	Spr	int 1	Spr	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	161,92	168,87	161,92	159,5	161,92	128,25	160,25	127,6	646,01	584,22	90,4 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40	0,0 %
Analise de Sistema	18,25	37,9	18,25	42,07	18,25	40,28	18,25	22,65	73	142,9	195,8 %
Code Review	16	13,73	16	13,73	16	26,35	16	15,17	64	68,98	107,8 %
Atestado	0	0	0	0	0	4	0	14,25	0	18,25	0,0 %
Ausencia	0	9,43	0	5,63	0	3,47	0	6,73	0	25,26	0,0 %
Outros	0,17	0,2	0,17	1,92	0,17	2,75	0,17	6,07	0,68	10,94	1.608,8
Daily Scrum	9,33	8,58	9,33	7,92	9,33	7,9	9,33	5,58	37,32	29,98	80,3 %
Cafe	7,5	7,28	7,5	7,7	7,5	7,2	7,5	4,75	30	26,93	89,8 %
Atualizacao de Versao	4	1,15	4	5,75	4	1,75	4	4,73	16	13,38	83,6 %
Reuniao	3,67	3,98	3,67	0,5	3,67	2,48	3,83	4,5	14,84	11,46	77,2 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	0	1	2,72	1	0	1	4,37	4	7,09	177,2 %
Sizing	6	11,32	6	0	6	10,3	6	3,8	24	25,42	105,9 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	3,42	3,63	3,42	3,67	3,42	7,75	3,42	3,75	13,68	18,8	137,4 %
Ginastica Laboral	5	5,38	5	4,4	5	4,07	5	3,58	20	17,43	87,1 %
Sprint Planning 1	6	3	6	6,5	6	4	6	2,5	24	16	66,7 %
Retrospectiva	6	7,5	6	5	6	5	6	2,5	24	20	83,3 %
Sprint Planning 2	3	0,5	3	2,5	3	3	3	1,67	12	7,67	63,9 %
Verificando apontamento	2,33	1,08	2,33	1,5	2,33	1,58	2,33	1,48	9,32	5,64	60,5 %
Compilacao de sistemas	0,5	0	0,5	0	0,5	0,42	0,5	1,33	2	1,75	87,5 %
Planejamento de Projeto	0	0,5	0	0	0	0	1,5	1,17	1,5	1,67	111,3 %
Atividades Gerenciais	1	1,1	1	0	1	1,32	1	1,13	4	3,55	88,8 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,58	0,83	0,58	1,93	0,58	0,25	0,58	1	2,32	4,01	172,8 %
Correção de Erros Interno	1,25	2,58	1,25	0	1,25	0	1,25	1	5	3,58	71,6 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0,87	0	0,82	0	1,69	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	2,25	4,8	2,25	2,18	2,25	1,37	2,25	0,5	9	8,85	98,3 %
Geração de Atas	0,25	0	0,25	0	0,25	0,25	0,25	0,17	1	0,42	42,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0,33	0	0	0	0	0	0,33	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,75	0	0,75	0	0,75	0	0,75	0	3	0	0,0 %
Particular	0	0	0	2,33	0	5,1	0	0	0	7,43	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0,92	0	0,58	0	0,5	0	0	0	2	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0,08	0	0	0	0,08	0,0 %
Documentação	0	0	0	0,33	0	0	0	0	0	0,33	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Clean Code	2,75	0	2,75	0,75	2,75	4,83	2,75	0	11	5,58	50,7 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0,25	0,58	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0,58	58,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	2,13	0	1,33	0	0	0	3,46	0,0 %
Analise de O.S	0,83	3,17	0,83	2,83	0,83	3,68	0,83	0	3,32	9,68	291,6 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	264	298,01	264	284,4	264	280,13	263,99	282,8	1.055,99	1.145,34	108,5 %



- Desenvolvimento [45.12%]
- Férias [14.14%]
- Analise de Sistema [8.01%]
- Code Review [5.36%]
- Atestado [5.04%]
- Ausencia [2.38%]
- Outros [2.15%]
- Daily Scrum [1.97%]
- Cafe [1.68%]
- Atualizacao de Versao [1.67%]
- Reuniao [1.59%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [1.55%]
- Sizing [1.34%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.33%]
- Ginastica Laboral [1.27%]
- Sprint Planning 1 [0.88%]
- Retrospectiva [0.88%]
- Sprint Planning 2 [0.59%]
- Verificando apontamento [0.52%]
- Ocompilação de sistemas [0.47%]
- Planejamento de Projeto [0.41%]
- Atividades Gerenciais [0.4%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.35%]
- Ocrreção de Erros Interno [0.35%]
- Manutenção de Servidores [0.29%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.18%]
- Geração de Atas [0.06%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	To	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	172,92	180,72	172,92	168,03	172,92	142,45	171,25	133,85	690,01	625,05	90,6 %
DIV - Diversos*		18,33	28,3	18,33	23,45	18,33	21,78	18,5	31,13	73,49	104,66	142,4 %
REQM - Gestao de Requisitos		33,25	52,72	33,25	53,2	33,25	58,92	33,25	30,62	133	195,46	147,0 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	31,33	29,82	31,33	26,65	31,33	39,25	31,33	23,25	125,32	118,97	94,9 %
PI - Integracao de Produto		4	1,15	4	5,75	4	1,75	4	4,73	16	13,38	83,6 %
CM - Gerencia de Configuração		0,5	0	0,5	0	0,5	0,42	0,5	1,33	2	1,75	87,5 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0,5	0	0	0	0	1,5	1,17	1,5	1,67	111,3 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	260,33	293,21	260,33	277,08	260,33	264,57	260,33	226,08	1.041,32	1.060,94	101,9 %




- Desenvolvimento de Requisitos [59.2%]
- Diversos* [13.77%]
- Gestao de Requisitos [13.54%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [10.28%]
- Integracao de Produto [2.09%]
- Gerencia de Configuracao [0.59%]
- Planejamento de Projeto [0.52%]

INDICADORES DO PROJETO


	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506
01. Horas planejadas de todas atividades	1488h00m	922h00m	854h00m	1176h00m	968h00m	734h00m	700h00m	1056h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1467h27m	968h44m	924h35m	1227h32m	990h22m	749h59m	737h25m	1145h23m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1175h59m	669h35m	627h10m	887h30m	740h15m	560h25m	505h40m	788h50m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	1019h42m	630h15m	596h30m	757h47m	605h07m	458h21m	450h32m	692h42m
05. Pontos planejados para o projeto	330,0	194,0	180,0	256,0	218,0	165,0	148,0	232,0
06. Pontos planejados	410,5	199,0	242,0	314,0	276,5	179,5	153,5	248,5
07. Pontos entregues	319,5	183	173,5	228	178,5	140,5	134	216,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	289,50	150,00	134,00	200,00	147,00	134,00	120,50	188,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	30,00	33,00	39,50	28,00	31,50	6,50	13,50	28,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	4	6	6	3	3	3	0	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	87	52	49	53	47	30	30	42
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	36	23	23	22	21	6	13	19
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	2	2	2	1	1	1	0	2
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	1h55m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	11	2,5	4,5	1,5	2,5	1	0	2
16. Produtividade planejada	0,350	0,298	0,386	0,354	0,374	0,321	0,304	0,316
17. Produtividade realizada	0,314	0,291	0,291	0,301	0,295	0,307	0,298	0,313
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	96,9	94,4	96,4	89,1	81,9	85,2	90,6	93,4
19. % Pontos NP / Pontos entregues	9,4	18,1	22,8	12,3	17,7	4,7	10,1	13

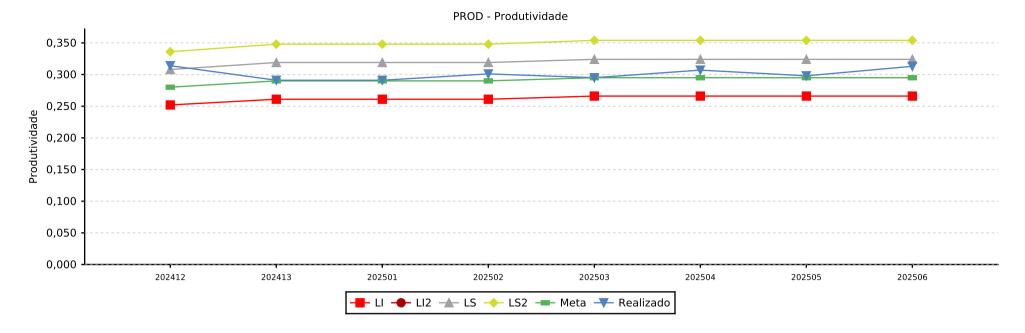


	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506
Realizado	0,314	0,291	0,291	0,301	0,295	0,307	0,298	0,313
Meta	0,280	0,290	0,290	0,290	0,295	0,295	0,295	0,295
LS2	0,336	0,348	0,348	0,348	0,354	0,354	0,354	0,354
LS	0,308	0,319	0,319	0,319	0,324	0,324	0,324	0,324
LI2								
LI	0,252	0,261	0,261	0,261	0,266	0,266	0,266	0,266

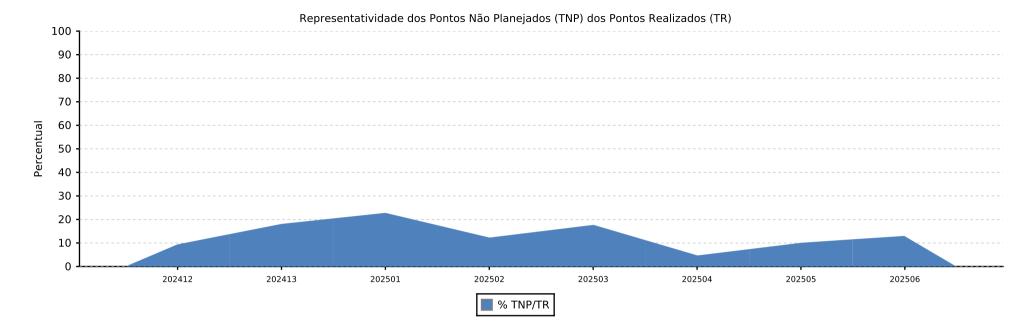


	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506
TR - Pontos Realizados	319.5	183	173.5	228	178.5	140.5	134	216.5
TNP - Pontos Não Planejados	30	33	39.5	28	31.5	6.5	13.5	28
% TNP/TR	9,4	18,1	22,8	12,3	17,7	4,7	10,1	13,0

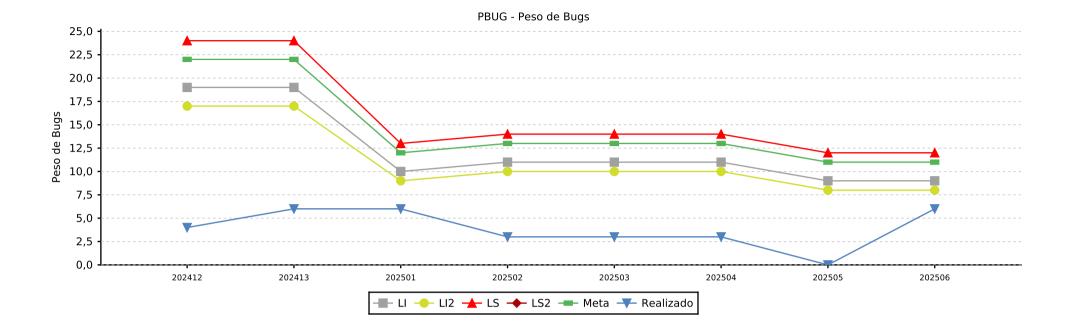


	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506
Realizado	4	6	6	3	3	3	0	6
Meta	22	22	12	13	13	13	11	11
LS2								
LS	24	24	13	14	14	14	12	12
LI2	17	17	9	10	10	10	8	8
LI	19	19	10	11	11	11	9	9
Pontos Entregues	319.5	183	173.5	228	178.5	140.5	134	216.5
% PBUG / TR	1,26	3,28	3,46	1,32	1,69	2,14	0,00	2,78

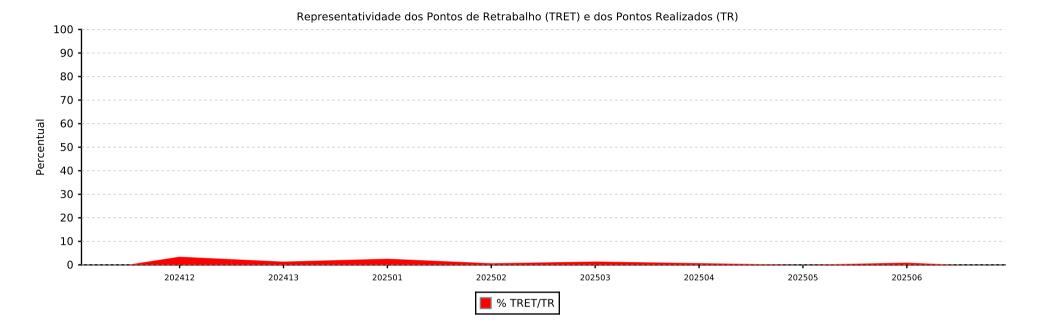

	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506
TR - Pontos Realizados	319.5	183	173.5	228	178.5	140.5	134	216.5
TRET - Pontos de Retrabalho	11	2.5	4.5	1.5	2.5	1	0	2
% TRET/TR	3,4	1,4	2,6	0,7	1,4	0,7	0,0	0,9

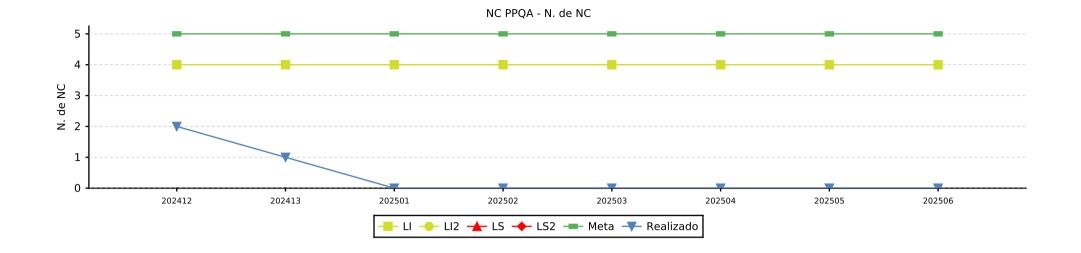

	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506
Realizado	2	1	0	0	0	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

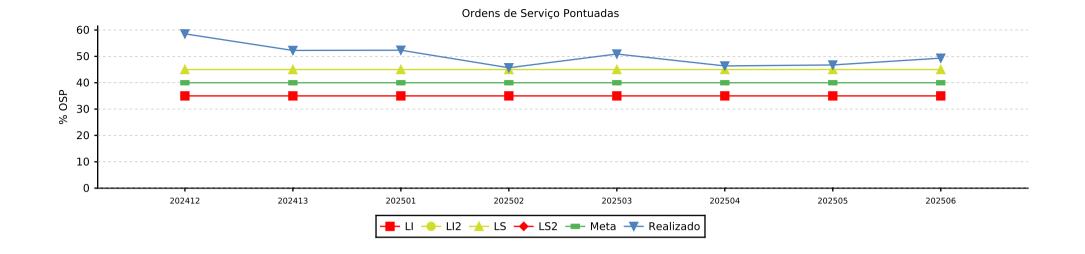


	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506
Realizado	58.54	52.25	52.34	45.68	50.89	46.37	46.74	49.32
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [51.01%]
- Analise de Sistema [12.48%]
- Code Review [6.02%]
- Férias [3.49%]
- Daily Scrum [2.62%]
- Ocafe [2.35%]
- Sizing [2.22%]
- Ausencia [2.21%]
- Retrospectiva [1.75%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.64%]
- Atestado [1.59%]
- Ginastica Laboral [1.52%]
- Sprint Planning 1 [1.4%]
- Atualizacao de Versao [1.17%]
- Reuniao [1%]
- Outros [0.95%]
- Analise de O.S [0.85%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.77%]
- Sprint Planning 2 [0.67%]
- Particular [0.65%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.62%]
- Verificando apontamento [0.49%]
- Clean Code [0.49%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.35%]
- Correção de Erros Interno [0.31%]
- Atividades Gerenciais [0.31%]
- Analise Retorno O.S. [0.3%]
- Merge O.S. [0.17%]

- Compilação de sistemas [0.15%]
- Manutenção de Servidores [0.15%]
- Planejamento de Projeto [0.15%]
- Treinamento [0.05%]
- Geração de Atas [0.04%]
- Auxilio Review [0.03%]
- Documentação [0.03%]
- Verificar o.s no nome [0.01%]



- Desenvolvimento de Requisitos [54.57%]
- Gestao de Requisitos [17.06%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [10.39%]
- Diversos* [9.14%]
- Integracao de Produto [1.17%]
- Gerencia de Configuração [0.15%]
- Planejamento de Projeto [0.15%]
