

INDICADORES DA SPRINT

		202	508			202	509	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	264h00m	264h00m	264h00m	220h00m	180h00m	264h00m	264h00m	264h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	276h29m	280h35m	279h22m	231h05m	189h29m	283h11m	278h04m	278h58m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	186h25m	189h25m	189h25m	151h10m	119h25m	189h25m	189h25m	189h15m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	174h36m	173h41m	176h25m	140h43m	109h07m	161h54m	161h12m	175h18m
05. Pontos planejados	59,0	56,5	50,0	57,5	47,5	50,0	63,0	58,5
06. Pontos entregues	40	50	64	46	23,5	47,5	59,5	57
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	33,00	35,50	54,50	37,50	19,50	38,00	47,00	42,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	7,00	14,50	9,50	8,50	4,00	9,50	12,50	15,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	3	0	2	6	3	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	6	11	10	12	8	9	5	8
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	6	10	9	4	3	12	5	12
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	1	2	1	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	1	0	0,5	1	1	0	0,5
15. Produtividade planejada	0,317	0,299	0,264	0,381	0,398	0,264	0,333	0,310
16. Produtividade realizada	0,230	0,288	0,363	0,327	0,216	0,294	0,370	0,326
17. % Pontos NP / Pontos entregues	17,5	29	14,9	18,5	17,1	20	21,1	26,4

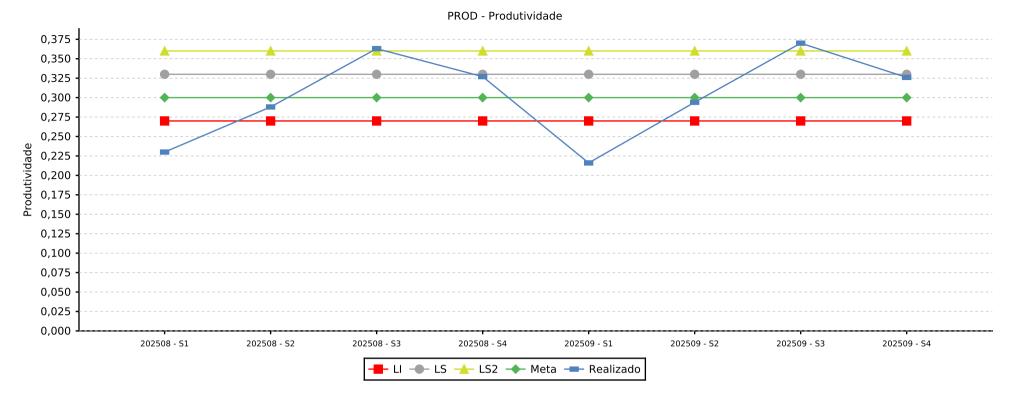


		202	508			202	509	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,230	0,288	0,363	0,327	0,216	0,294	0,370	0,326
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270

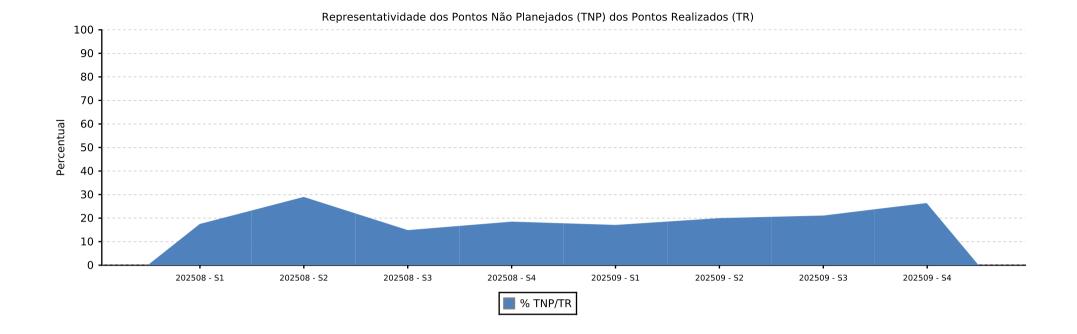


		202	508			202	509	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	40	50	64	46	23.5	47.5	59.5	57
TNP - Pontos Não Planejados	7	14.5	9.5	8.5	4	9.5	12.5	15
% TNP/TR	17,5	29,0	14,9	18,5	17,1	20,0	21,1	26,4

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

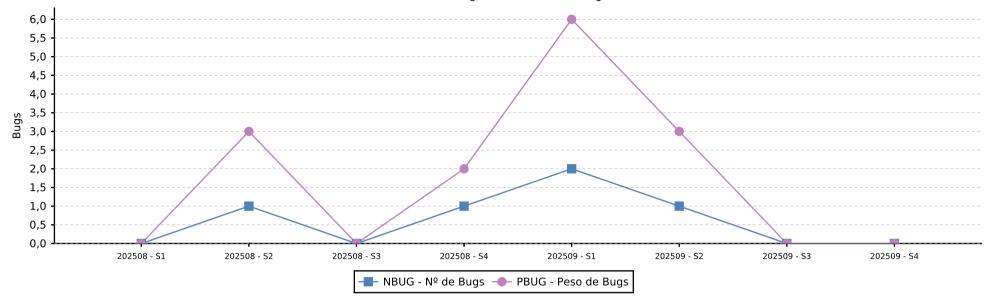

		202	508			202	509	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	1	0	1	2	1	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	3	0	2	6	3	0	0
Pontos Entregues	40	50	64	46	23.5	47.5	59.5	57
% PBUG / TR	0,00	6,00	0,00	4,35	25,54	6,32	0,00	0,00

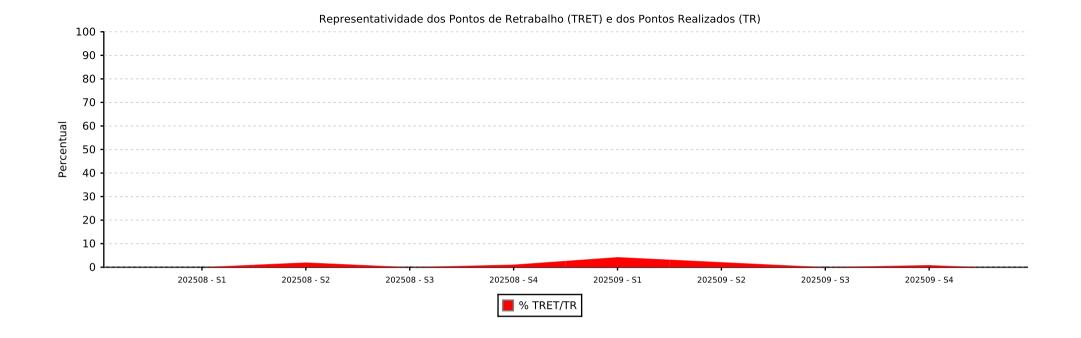


		202	508			202	509	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	40	50	64	46	23.5	47.5	59.5	57
TRET - Pontos de Retrabalho	0	1	0	0.5	1	1	0	0.5
% TRET/TR	0,0	2,0	0,0	1,1	4,3	2,1	0,0	0,9

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spri	nt 2	Spri	nt 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	94,33	88,7	155,83	145,13	155,83	139,67	154,67	149,02	560,66	522,52	93,2 %
Analise de Sistema	12	28,67	18,75	26,47	18,75	25,45	18,75	34,52	68,25	115,11	168,7 %
Code Review	20	20,23	23,5	35,6	23,5	24,72	23,5	26	90,5	106,55	117,7 %
Cafe	5,25	4,75	7,5	7,48	7,5	7,43	7,5	7,78	27,75	27,44	98,9 %
Sizing	4	2,5	6	16,25	6	17,83	6	6,75	22	43,33	197,0 %
Retrospectiva	5	2,67	6	3,5	6	4,4	6	6,42	23	16,99	73,9 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	0	1	1,5	1	0	1	5,78	4	7,28	182,0 %
Atualizacao de Versao	3	6,45	4	1	4	0,42	4	5,25	15	13,12	87,5 %
Ausencia	0	2,22	0	2,83	0	12,85	0	5,1	0	23	0,0 %
Daily Scrum	5,08	3,17	8,83	5,12	8,83	6,33	8,83	5,02	31,57	19,64	62,2 %
Reuniao	3	2	3,67	4,42	3,67	5,5	3,83	4,83	14,17	16,75	118,2 %
Sprint Planning 1	5	1,33	6	2,5	6	5,25	6	4,83	23	13,91	60,5 %
Ginastica Laboral	3,17	3,05	5	4,77	5	4,6	5	4,7	18,17	17,12	94,2 %
Outros	0,17	0,98	0,17	4,87	0,17	7	0,17	2,72	0,68	15,57	2.289,7
Auxilio ao Desenvolvimento	2	2,25	2	2,75	2	1,75	2	1,9	8	8,65	108,1 %
Sprint Planning 2	2,5	0,33	3	1	3	1,5	3	1,83	11,5	4,66	40,5 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	2,83	2,8	3,17	7,03	3,17	3,2	3,17	1,67	12,34	14,7	119,1 %
Verificando apontamento	2,17	1,83	2,33	1,17	2,33	1,78	2,33	1,08	9,16	5,86	64,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,33	0,12	0,33	1,35	0,33	1,75	0,33	1,07	1,32	4,29	325,0 %
Analise de O.S	0,67	0,25	0,83	1,97	0,83	1,72	0,83	1	3,16	4,94	156,3 %
Clean Code	1,75	2,75	2,75	0,65	2,75	0,67	2,75	0,83	10	4,9	49,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0	0,33	0,0 %
Compilacao de sistemas	0,5	0,58	0,5	0,42	0,5	0	0,5	0,33	2	1,33	66,5 %
Planejamento de Projeto	0	0,25	0	0	0	0	1	0,2	1	0,45	45,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0,25	0	0,22	0	0	0	0,47	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0,83	0	0,43	0	0	0	0	0	1,26	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	2,92	0	0	0	0	0	0	0	2,92	0,0 %


Correção de Erros Interno	0,5	0	0,5	0	0,5	1	0,5	0	2	1	50,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0,25	25,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	1	0,95	1	0,25	1	1,17	1	0	4	2,37	59,2 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0,25	4,3	0,25	0	0,25	0,42	0,25	0	1	4,72	472,0 %
Manutenção de Servidores	0	1,22	0	0	0	0	0	0	0	1,22	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0,32	0	1,22	0	0	0	1,54	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0,28	0	0,17	0	0,23	0	0	0	0,68	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Particular	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,25	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	1,75	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0,85	0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,99	0,85	85,9 %
Total Geral	180	189,48	263,99	283,2	263,99	278,08	263,99	278,96	971,97	1.029,72	105,9 %

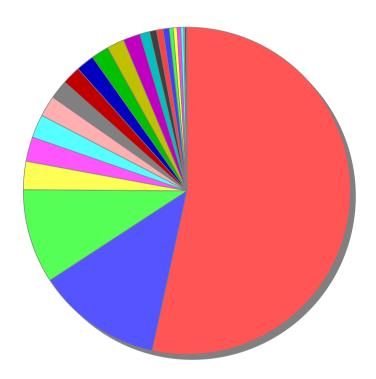

- Desenvolvimento [53.42%]
- Analise de Sistema [12.37%]
- Code Review [9.32%]
- Ocafe [2.79%]
- Sizing [2.42%]
- Retrospectiva [2.3%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [2.07%]
- Atualizacao de Versao [1.88%]
- Ausencia [1.83%]
- Daily Scrum [1.8%]
- Reuniao [1.73%]
- Sprint Planning 1 [1.73%]
- Ginastica Laboral [1.68%]
- Outros [0.98%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.68%]
- Sprint Planning 2 [0.66%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.6%]
- Verificando apontamento [0.39%]
- Outras Equipes [0.38%]
- Analise de O.S [0.36%]
- Clean Code [0.3%]
- Preparando ambiente [0.12%]
- Compilacao de sistemas [0.12%]
- Planejamento de Projeto [0.07%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	To	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	102	96,62	165,08	156,92	165,08	148,03	163,92	154,48	596,08	556,05	93,3 %
REQM - Gestao de Requisitos		23,5	32,83	33,75	46,53	33,75	51,25	33,75	48,27	124,75	178,88	143,4 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	30,08	26,07	38,33	44,22	38,33	35,45	38,33	37,43	145,07	143,17	98,7 %
DIV - Diversos*		13,58	14,8	18,67	30,12	18,67	38,55	18,83	30,92	69,75	114,39	164,0 %
PI - Integracao de Produto		3	6,45	4	1	4	0,42	4	5,25	15	13,12	87,5 %
CM - Gerencia de Configuração		0,5	0,58	0,5	0,42	0,5	0	0,5	0,33	2	1,33	66,5 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0,25	0	0	0	0	1	0,2	1	0,45	45,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	172,66	177,6	260,33	279,21	260,33	273,7	260,33	276,88	953,65	1.007,39	105,6 %

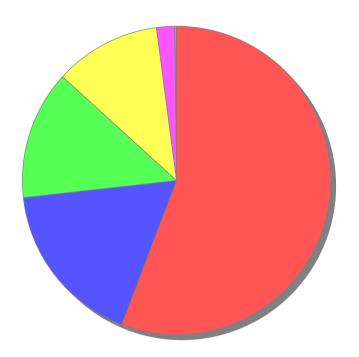


- Desenvolvimento de Requisitos [55.79%]
- Gestao de Requisitos [17.43%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [13.52%]
- Diversos* [11.17%]
- Integracao de Produto [1.9%]
- Gerencia de Configuracao [0.12%]
- Planejamento de Projeto [0.07%]

INDICADORES DO PROJETO


	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509
01. Horas planejadas de todas atividades	1176h00m	968h00m	734h00m	700h00m	1056h00m	1008h00m	1012h00m	972h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1227h32m	990h22m	749h59m	737h25m	1145h23m	1065h58m	1067h31m	1029h42m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	887h30m	740h15m	560h25m	505h40m	788h50m	742h45m	716h25m	687h30m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	757h47m	605h07m	458h21m	450h32m	723h16m	631h18m	665h25m	607h31m
05. Pontos planejados para o projeto	256,0	218,0	165,0	148,0	232,0	218,0	216,0	205,0
06. Pontos planejados	314,0	276,5	179,5	153,5	248,5	269,5	223,0	219,0
07. Pontos entregues	228	178,5	140,5	134	216,5	190,5	200	187,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	200,00	147,00	134,00	120,50	188,50	162,00	160,50	146,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	28,00	31,50	6,50	13,50	28,00	28,50	39,50	41,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	3	3	3	0	6	6	5	9
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	53	47	30	30	42	36	39	30
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	22	21	6	13	19	22	29	32
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	1	1	0	2	4	2	3
14. Horas de correção de bug	1h55m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	5h50m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	1,5	2,5	1	0	2	4,5	1,5	2,5
16. Produtividade planejada	0,354	0,374	0,321	0,304	0,316	0,363	0,312	0,319
17. Produtividade realizada	0,301	0,295	0,307	0,298	0,300	0,302	0,301	0,309
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	89,1	81,9	85,2	90,6	93,4	87,4	92,6	91,5
19. % Pontos NP / Pontos entregues	12,3	17,7	4,7	10,1	13	15	19,8	21,9

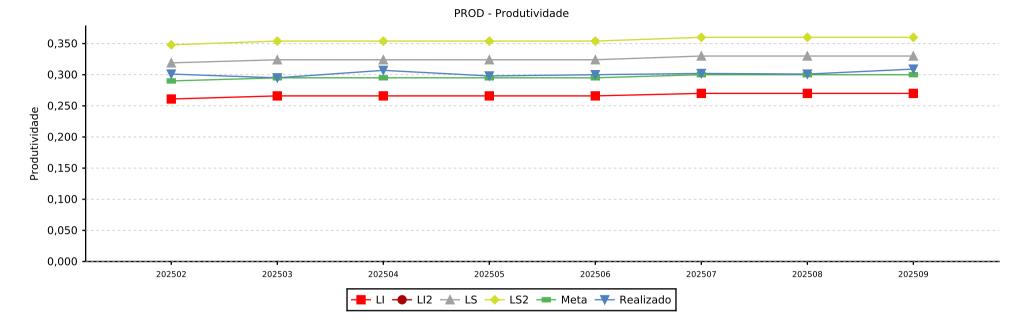


	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509
Realizado	0,301	0,295	0,307	0,298	0,300	0,302	0,301	0,309
Meta	0,290	0,295	0,295	0,295	0,295	0,300	0,300	0,300
LS2	0,348	0,354	0,354	0,354	0,354	0,360	0,360	0,360
LS	0,319	0,324	0,324	0,324	0,324	0,330	0,330	0,330
LI2								
LI	0,261	0,266	0,266	0,266	0,266	0,270	0,270	0,270

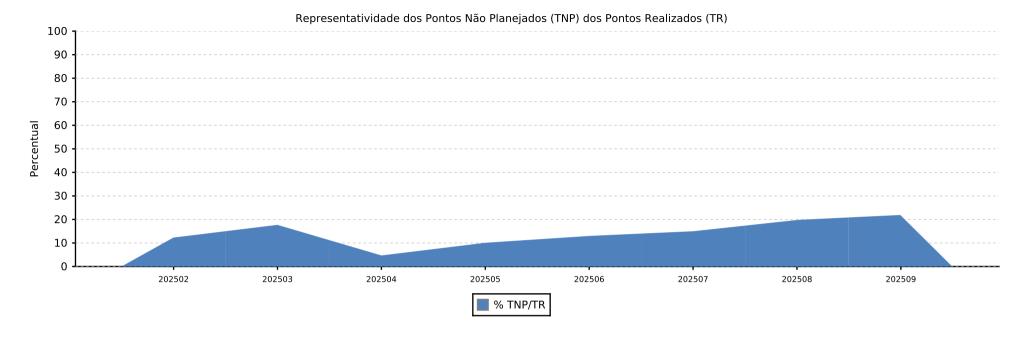


	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509
TR - Pontos Realizados	228	178.5	140.5	134	216.5	190.5	200	187.5
TNP - Pontos Não Planejados	28	31.5	6.5	13.5	28	28.5	39.5	41
% TNP/TR	12,3	17,7	4,7	10,1	13,0	15,0	19,8	21,9

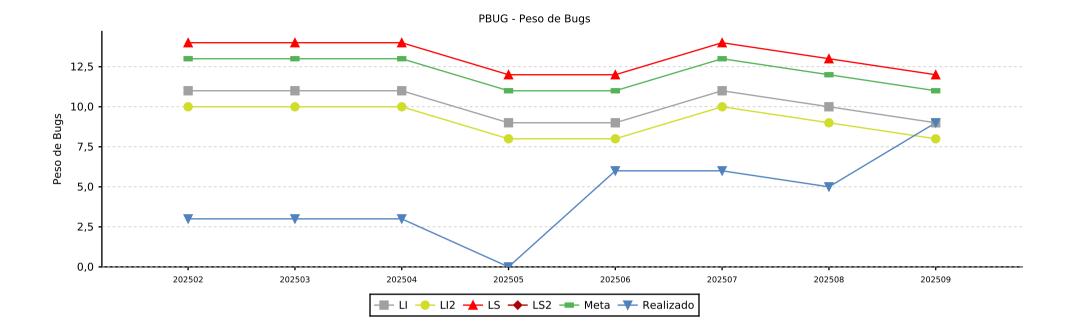


	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509
Realizado	3	3	3	0	6	6	5	9
Meta	13	13	13	11	11	13	12	11
LS2								
LS	14	14	14	12	12	14	13	12
LI2	10	10	10	8	8	10	9	8
LI	11	11	11	9	9	11	10	9
Pontos Entregues	228	178.5	140.5	134	216.5	190.5	200	187.5
% PBUG / TR	1,32	1,69	2,14	0,00	2,78	3,15	2,50	4,80

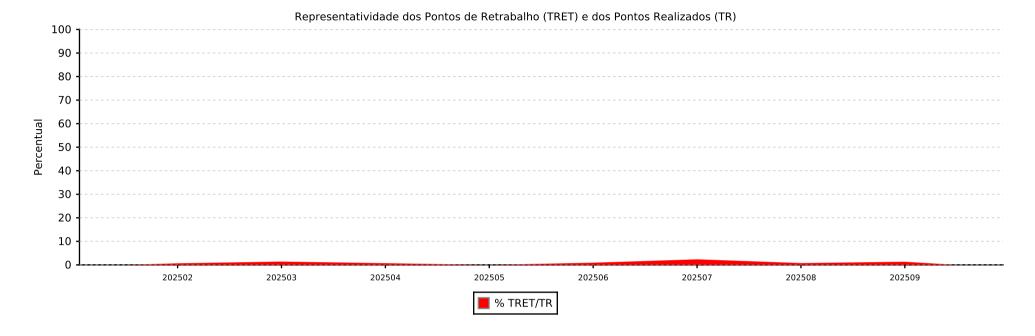

	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509
TR - Pontos Realizados	228	178.5	140.5	134	216.5	190.5	200	187.5
TRET - Pontos de Retrabalho	1.5	2.5	1	0	2	4.5	1.5	2.5
% TRET/TR	0,7	1,4	0,7	0,0	0,9	2,4	0,8	1,3

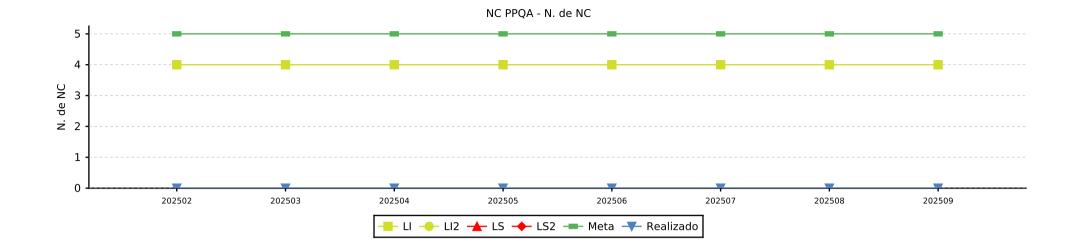

	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

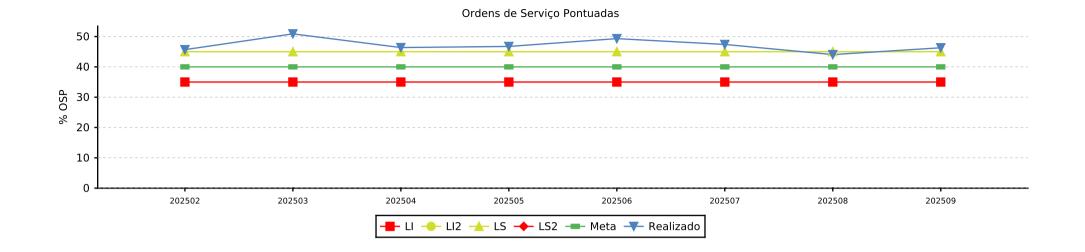


	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509
Realizado	45.68	50.89	46.37	46.74	49.32	47.4	44.05	46.3
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [50.74%]
- Analise de Sistema [11.18%]
- Code Review [10.35%]
- Sizing [4.21%]
- Cafe [2.67%]
- Ausencia [2.23%]
- Daily Scrum [1.91%]
- Ginastica Laboral [1.66%]
- Retrospectiva [1.65%]
- Reuniao [1.63%]
- Outros [1.51%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.43%]
- Sprint Planning 1 [1.35%]
- Atualizacao de Versao [1.27%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.84%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.71%]
- Verificando apontamento [0.57%]
- Analise de O.S [0.48%]
- Clean Code [0.48%]
- Treinamento [0.46%]
- Sprint Planning 2 [0.45%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.42%]
- Atividade Externa [0.39%]
- Atestado [0.28%]
- Atividades Gerenciais [0.23%]
- Analise Retorno O.S. [0.15%]
- Compilacao de sistemas [0.13%]
- Documentação [0.12%]

- Manutenção de Servidores [0.12%]
- Ocrreção de Erros Interno [0.1%]
- Merge O.S. [0.08%]
- Banheiro [0.07%]
- Verificar o.s no nome [0.05%]
- Planejamento de Projeto [0.04%]
- Preparando ambiente [0.03%]
- Geração de Atas [0.02%]

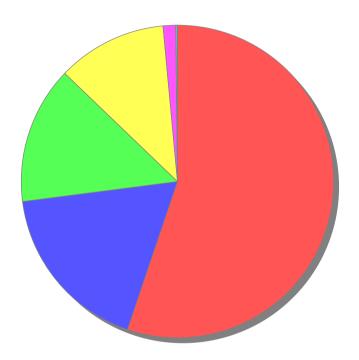

- Desenvolvimento de Requisitos [54%]
- Gestao de Requisitos [17.37%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [13.9%]
- Diversos* [11.11%]
- Integracao de Produto [1.27%]
- Gerencia de Configuracao [0.13%]
- Planejamento de Projeto [0.04%]
