

## **INDICADORES DA SPRINT**

		202	403			202	404	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	344h00m	344h00m	344h00m	344h00m	359h12m	396h00m	388h00m	400h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	356h58m	357h29m	371h18m	393h33m	369h45m	412h39m	405h15m	419h32m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	262h55m	266h15m	263h15m	265h15m	277h33m	317h30m	313h35m	320h30m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	262h11m	257h14m	227h13m	256h59m	261h48m	280h06m	288h58m	311h43m
05. Pontos planejados	81,0	64,0	86,0	85,5	78,5	89,5	53,0	75,5
06. Pontos entregues	105	44	56,5	88	74,5	96	61,5	96,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	76,50	34,00	47,00	64,50	61,00	70,00	54,00	85,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	28,50	10,00	9,50	23,50	13,50	26,00	7,50	11,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	3	2
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	22	18	19	25	24	31	24	28
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	20	8	7	22	13	17	5	8
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	1	2
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0,5	0	0	2	2	0	0,5	1
15. Produtividade planejada	0,309	0,241	0,327	0,323	0,283	0,282	0,170	0,236
16. Produtividade realizada	0,401	0,172	0,249	0,343	0,285	0,343	0,213	0,310
17. % Pontos NP / Pontos entregues	27,2	22,8	16,9	26,8	18,2	27,1	12,2	11,4

PROD - Produtividade

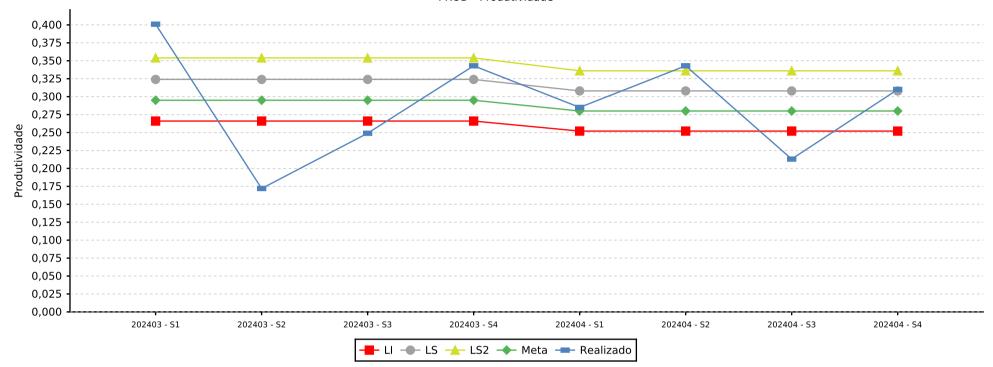


		202	403		202404					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,401	0,172	0,249	0,343	0,285	0,343	0,213	0,310		
Meta	0,295	0,295	0,295	0,295	0,280	0,280	0,280	0,280		
LS2	0,354	0,354	0,354	0,354	0,336	0,336	0,336	0,336		
LS	0,324	0,324	0,324	0,324	0,308	0,308	0,308	0,308		
LI	0,266	0,266	0,266	0,266	0,252	0,252	0,252	0,252		

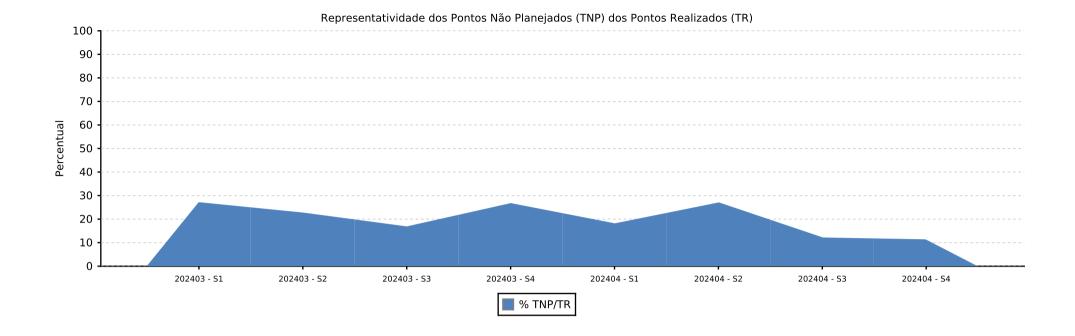


		202	403			202	404	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	105	44	56.5	88	74.5	96	61.5	96.5
TNP - Pontos Não Planejados	28.5	10	9.5	23.5	13.5	26	7.5	11
% TNP/TR	27,2	22,8	16,9	26,8	18,2	27,1	12,2	11,4

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

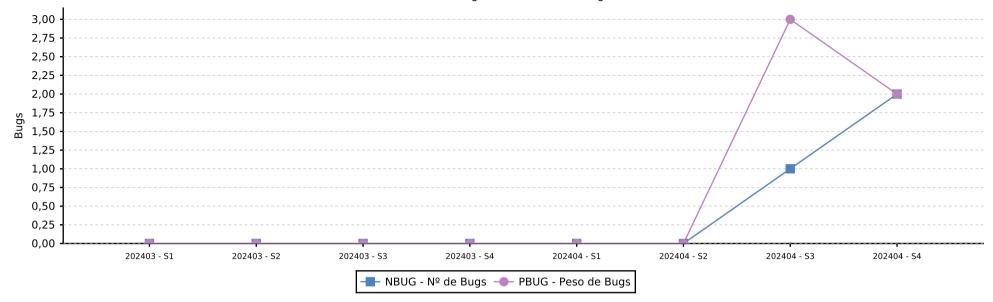

		202	403		202404				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	0	0	1	2	
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	3	2	
Pontos Entregues	105	44	56.5	88	74.5	96	61.5	96.5	
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88	2,08	

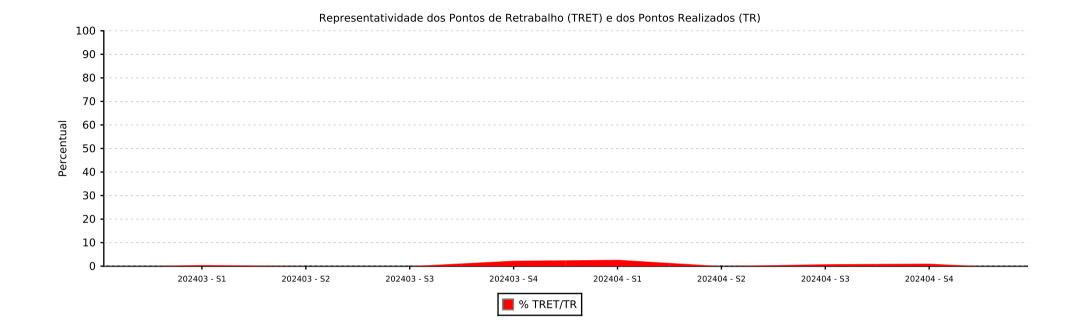


		202	403			202	404	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	105	44	56.5	88	74.5	96	61.5	96.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	0	2	2	0	0.5	1
% TRET/TR	0,5	0,0	0,0	2,3	2,7	0,0	0,8	1,0

## **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spri	int 1	Spri	int 2	Spri	nt 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	219,7	215,08	256,67	236,4	257,25	253,3	259,5	267,48	993,12	972,26	97,9 %
Code Review	18,5	23,78	17,5	9,27	16	25,68	17,5	31,95	69,5	90,68	130,5 %
Analise de Sistema	16,45	16,17	18,5	20,35	17,5	25,08	18,5	28,18	70,95	89,78	126,5 %
Daily Scrum	11	9,47	13,67	8,07	13,33	3,13	14	13,32	52	33,99	65,4 %
Cafe	9,5	9,67	10,25	8,67	10	9,5	10,25	10,5	40	38,34	95,9 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1,17	2,77	1,17	9,32	1,17	9,73	1,17	10,43	4,68	32,25	689,1 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	4,42	5,67	4,58	3,83	3,92	2,58	4,58	7,4	17,5	19,48	111,3 %
Ginastica Laboral	7	6,55	8	6,95	7,67	6,65	8	7,38	30,67	27,53	89,8 %
Atualizacao de Versao	2,5	4,6	2,5	3,48	2,5	6,35	2,5	4,62	10	19,05	190,5 %
Clean Code	3,85	2	4,17	2,33	3,67	1,67	4,17	4,33	15,86	10,33	65,1 %
Sizing	6	14,63	6	0	6	14,93	6	4,33	24	33,89	141,2 %
Sprint Planning 1	16,5	10,83	16,5	9,47	15	5,25	15	4	63	29,55	46,9 %
Verificando apontamento	6	3,38	6,42	2,28	5,92	3,45	6,42	3,78	24,76	12,89	52,1 %
Retrospectiva	12,83	13,25	12,83	6,23	11,67	6,67	11,67	3,33	49	29,48	60,2 %
Outros	0	1,45	0	5,43	0	3,43	0	2,15	0	12,46	0,0 %
Preparando ambiente	0,33	1,62	0,33	5,05	0,33	3,97	0,33	2,15	1,32	12,79	968,9 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	2,12	0	2,12	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	2,05	0	2,07	0	1,87	0	5,99	0,0 %
Reuniao	9,37	2,08	2,67	1,45	3,33	1,92	3,67	1,78	19,04	7,23	38,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,5	0,25	0,5	0	0,33	0	0,5	1,7	1,83	1,95	106,6 %
Ausencia	0	4,83	0	6,43	0	6,18	0	1,63	0	19,07	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0,62	0	1,62	0	2,24	0,0 %
Sprint Planning 2	5,5	3,33	5,5	4,67	5	2,25	5	1,33	21	11,58	55,1 %
Planejamento de Projeto	0	0,47	0	0	0	0	2,5	1,25	2,5	1,72	68,8 %
Documentação	0	0,28	0	0	0	0,2	0	0,35	0	0,83	0,0 %
Banheiro	0	0,17	0	0	0	0	0	0,2	0	0,37	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	1,67	1	0	1	0	1	0,17	4	1,84	46,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0	0,17	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	2,08	0	2,08	0	1,83	0	2,08	0	8,07	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %

Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0,13	0	0	0	0	0	0,13	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	12	0	46,5	0	0	0	0	0	58,5	0,0 %
Correção de Erros Interno	2,42	0	2,42	0	2,17	0	2,42	0	9,43	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	1	1,83	1	2,17	1	2	1	0	4	6	150,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	0,33	0	0,33	0	0	0	0,33	0	0,99	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0,5	0	0,38	0	0	0	0	0	0,88	0,0 %
Treinamento	1	1,42	1,17	5,83	1,17	3,08	1,17	0	4,51	10,33	229,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	5,9	0	5,55	0	0	0	11,45	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	359,2	369,75	396,01	412,64	388,01	405,24	400,01	419,52	1.543,23	1.607,15	104,1 %



### % de Horas por Atividade


- Desenvolvimento [63.76%]
- Code Review [7.62%]
- Analise de Sistema [6.72%]
- Daily Scrum [3.17%]
- Cafe [2.5%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [2.49%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.76%]

Atraso / Saida antecipada [0.04%]

- Ginastica Laboral [1.76%]
- Atualizacao de Versao [1.1%]
- Clean Code [1.03%]
- Sizing [1.03%]
- Sprint Planning 1 [0.95%]
- Verificando apontamento [0.9%]
- Retrospectiva [0.79%]
- Outros [0.51%]
- Preparando ambiente [0.51%]
- Curso/Palestra [0.51%]
- Analise de O.S [0.45%]
- Reuniao [0.42%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.41%]
- Ausencia [0.39%]
- Manutenção de Servidores [0.39%]
- Sprint Planning 2 [0.32%]
- Planejamento de Projeto [0.3%]
- Documentação [0.08%]
- Banheiro [0.05%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.04%]

# HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	int 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisito	S	234,13	226,27	271,58	252,27	270,33	267,28	274,42	291,35	1.050,46	1.037,17	98,7 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	42,33	46,5	44	23,57	41	35,48	43,17	48,6	170,5	154,15	90,4 %
REQM - Gestao de Requisitos		44,78	46,58	46,83	45,43	43,83	57,03	44,83	40	180,27	189,04	104,9 %
DIV - Diversos*		27,87	28,08	22,92	31,1	23	29,68	23,92	23,62	97,71	112,48	115,1 %
PI - Integracao de Produto		2,5	4,6	2,5	3,48	2,5	6,35	2,5	4,62	10	19,05	190,5 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	2,12	0	2,12	0,0 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0,47	0	0	0	0	2,5	1,25	2,5	1,72	68,8 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		0,33	0	0,33	0	0	0	0,83	0	1,49	0	0,0 %
	Total Geral	351,94	352,5	388,16	355,85	380,66	395,82	392,17	411,56	1.512,93	1.515,73	100,2 %

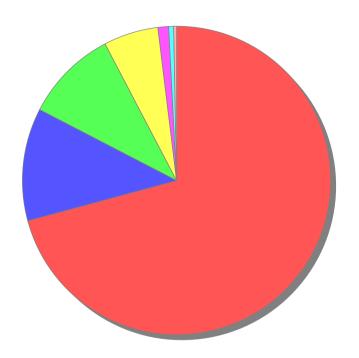


- Desenvolvimento de Requisitos [70.79%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [11.81%]
- Gestao de Requisitos [9.72%]
- Oiversos\* [5.74%]
- Integracao de Produto [1.12%]
- Treinamento na Organizacao [0.52%]
- Planejamento de Projeto [0.3%]

## **INDICADORES DO PROJETO**


	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404
01. Horas planejadas de todas atividades	880h00m	800h00m	840h00m	612h20m	1451h12m	1416h00m	1376h00m	1543h12m
02. Horas realizadas de todas atividades	940h16m	845h36m	909h31m	655h11m	1563h21m	1483h22m	1479h18m	1607h11m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	583h00m	457h20m	470h44m	389h00m	1172h42m	1116h50m	1057h40m	1229h08m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	579h39m	468h37m	493h13m	416h24m	1063h55m	1101h33m	1003h37m	1142h35m
05. Pontos planejados para o projeto	180,0	144,0	148,0	142,0	339,5	327,0	312,0	348,0
06. Pontos planejados	173,5	153,0	168,5	146,5	282,0	297,5	316,5	296,5
07. Pontos entregues	192,5	165,5	164,5	134	338	344	293,5	328,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	129,50	121,50	134,50	107,00	261,00	257,50	222,00	270,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	63,00	44,00	30,00	27,00	77,00	86,50	71,50	58,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	3	0	2	0	5	4	0	5
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	44	35	32	28	74	67	84	107
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	68	39	31	15	64	71	57	43
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	3	0	1	0	2	2	0	3
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	6	0	0,5	0	2,5	0,5	2,5	3,5
16. Produtividade planejada	0,298	0,335	0,358	0,377	0,241	0,267	0,300	0,242
17. Produtividade realizada	0,333	0,354	0,334	0,322	0,318	0,313	0,293	0,288
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	107	115	111,2	94,4	99,6	105,2	94,1	94,4
19. % Pontos NP / Pontos entregues	32,8	26,6	18,3	20,2	22,8	25,2	24,4	17,7

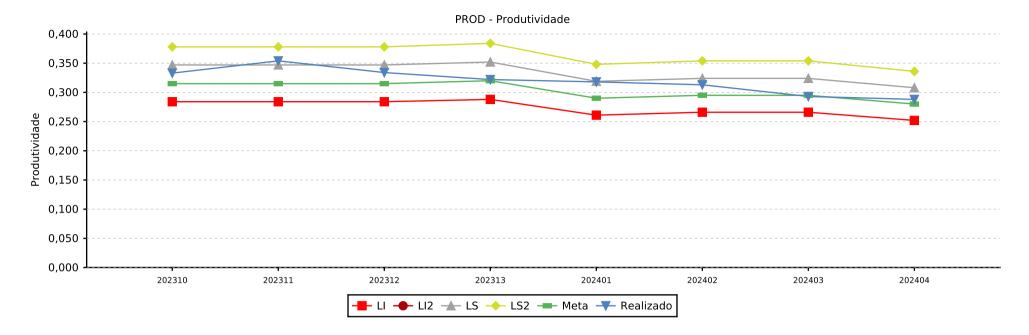


	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404
Realizado	0,333	0,354	0,334	0,322	0,318	0,313	0,293	0,288
Meta	0,315	0,315	0,315	0,320	0,290	0,295	0,295	0,280
LS2	0,378	0,378	0,378	0,384	0,348	0,354	0,354	0,336
LS	0,347	0,347	0,347	0,352	0,319	0,324	0,324	0,308
LI2								
LI	0,284	0,284	0,284	0,288	0,261	0,266	0,266	0,252

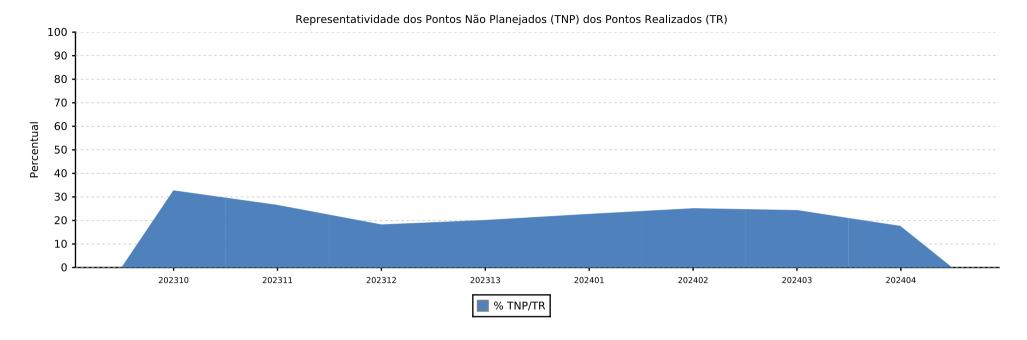


	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404
TR - Pontos Realizados	192.5	165.5	164.5	134	338	344	293.5	328.5
TNP - Pontos Não Planejados	63	44	30	27	77	86.5	71.5	58
% TNP/TR	32,8	26,6	18,3	20,2	22,8	25,2	24,4	17,7

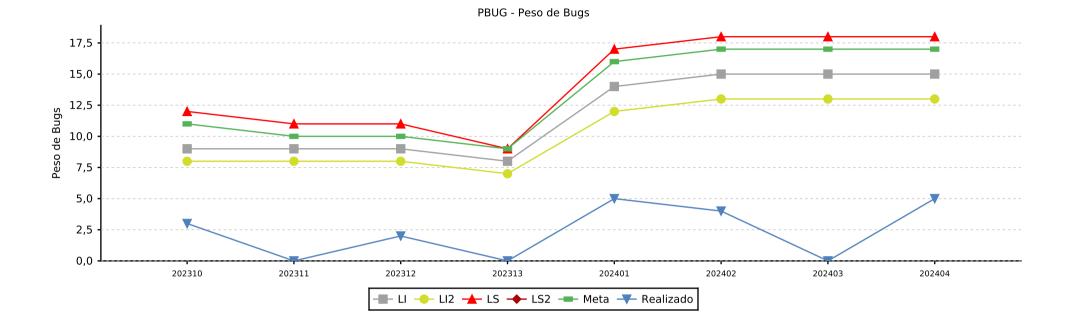


	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404
Realizado	3	0	2	0	5	4	0	5
Meta	11	10	10	9	16	17	17	17
LS2								
LS	12	11	11	9	17	18	18	18
LI2	8	8	8	7	12	13	13	13
LI	9	9	9	8	14	15	15	15
Pontos Entregues	192.5	165.5	164.5	134	338	344	293.5	328.5
% PBUG / TR	1,56	0,00	1,22	0,00	1,48	1,17	0,00	1,53

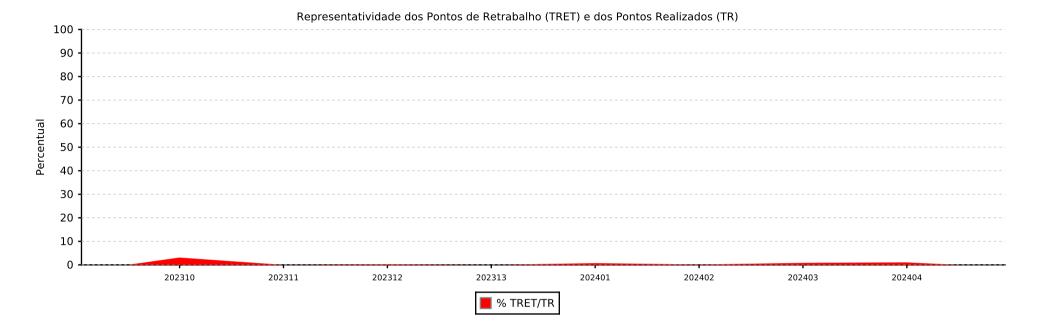


	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404
TR - Pontos Realizados	192.5	165.5	164.5	134	338	344	293.5	328.5
TRET - Pontos de Retrabalho	6	0	0.5	0	2.5	0.5	2.5	3.5
% TRET/TR	3,1	0,0	0,3	0,0	0,7	0,1	0,9	1,1

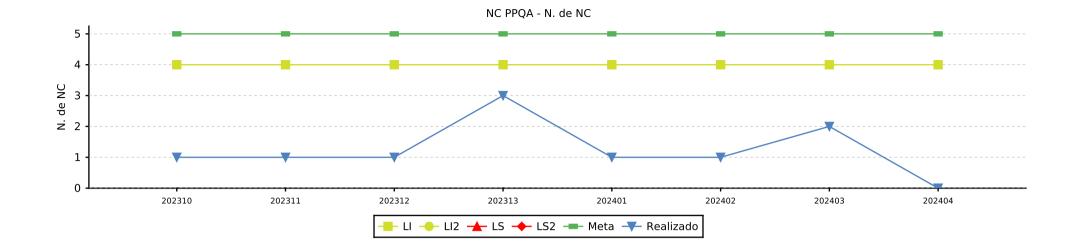

	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404
Realizado	1	1	1	3	1	1	2	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

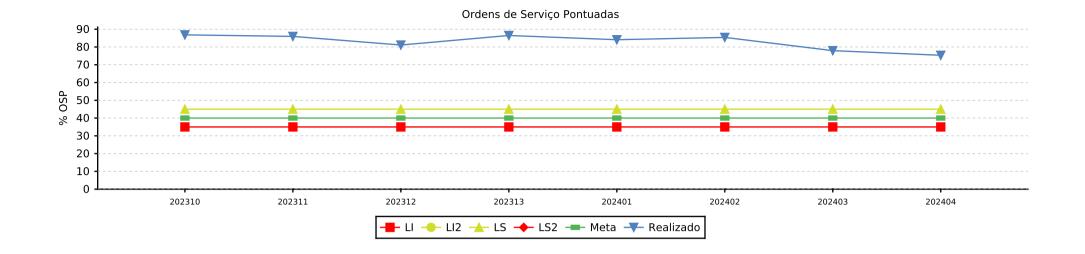


	202310	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404
Realizado	86.83	85.96	81.11	86.49	84.09	85.4	77.95	75.33
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35



#### % de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [60.5%]
- Code Review [5.64%]
- Analise de Sistema [5.59%]
- Atestado [3.64%]
- Ocafe [2.38%]
- Daily Scrum [2.11%]
- Sizing [2.11%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [2.01%]
- Sprint Planning 1 [1.84%]
- Retrospectiva [1.83%]
- Ginastica Laboral [1.71%]
- Oriacao de Ambiente de Desenv. [1.21%]
- Ausencia [1.19%]
- Atualizacao de Versao [1.19%]
- Verificando apontamento [0.8%]
- Preparando ambiente [0.8%]
- Outros [0.78%]
- Sprint Planning 2 [0.72%]
- Analise Retorno O.S. [0.71%]
- Treinamento [0.64%]
- Clean Code [0.64%]
- Reuniao [0.45%]
- Atividades Gerenciais [0.37%]
- Analise de O.S [0.37%]
- Manutenção de Servidores [0.14%]
- Curso/Palestra [0.13%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.12%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.11%]

- Planejamento de Projeto [0.11%]
- Teste [0.05%]
- Documentação [0.05%]
- Banheiro [0.02%]
- Atraso / Saida antecipada [0.01%]
- Verificar o.s no nome [0.01%]

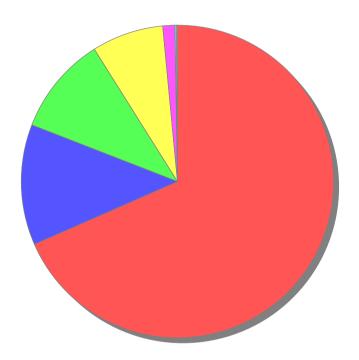

- Desenvolvimento de Requisitos [64.53%]
- Gestao de Requisitos [11.76%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [9.59%]
- Oiversos\* [7%]
- Integracao de Produto [1.19%]
- Treinamento na Organizacao [0.13%]
- Planejamento de Projeto [0.11%]
