

INDICADORES DA SPRINT

		202	308			202	309	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m	176h00m	220h00m	220h00m	176h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	236h17m	238h16m	242h51m	233h04m	187h22m	214h51m	234h08m	188h23m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	163h55m	163h55m	163h55m	162h05m	128h05m	163h00m	163h00m	126h05m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	172h22m	168h34m	187h19m	179h48m	137h31m	134h00m	135h47m	110h51m
05. Pontos planejados	48,0	57,5	66,5	72,0	42,5	53,0	49,5	42,0
06. Pontos entregues	51	34,5	75,5	61	58,5	27,5	47,5	39,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	41,00	20,50	60,50	47,50	50,00	24,50	38,50	37,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	10,00	14,00	15,00	13,50	8,50	3,00	9,00	2,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	1	1	2	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	17	13	12	19	14	10	12	17
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	10	16	18	13	11	6	19	3
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	2	1	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0,5	0,5	0,5	0	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,293	0,351	0,406	0,445	0,332	0,326	0,304	0,334
16. Produtividade realizada	0,296	0,205	0,404	0,340	0,426	0,206	0,350	0,357
17. % Pontos NP / Pontos entregues	19,7	40,6	19,9	22,2	14,6	11	19	5,1

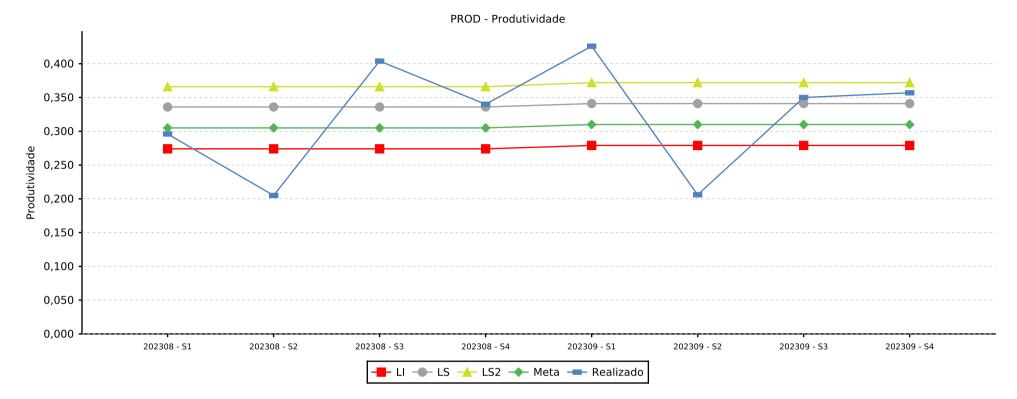


		202	308		202309					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,296	0,205	0,404	0,340	0,426	0,206	0,350	0,357		
Meta	0,305	0,305	0,305	0,305	0,310	0,310	0,310	0,310		
LS2	0,366	0,366	0,366	0,366	0,372	0,372	0,372	0,372		
LS	0,336	0,336	0,336	0,336	0,341	0,341	0,341	0,341		
LI	0,274	0,274	0,274	0,274	0,279	0,279	0,279	0,279		

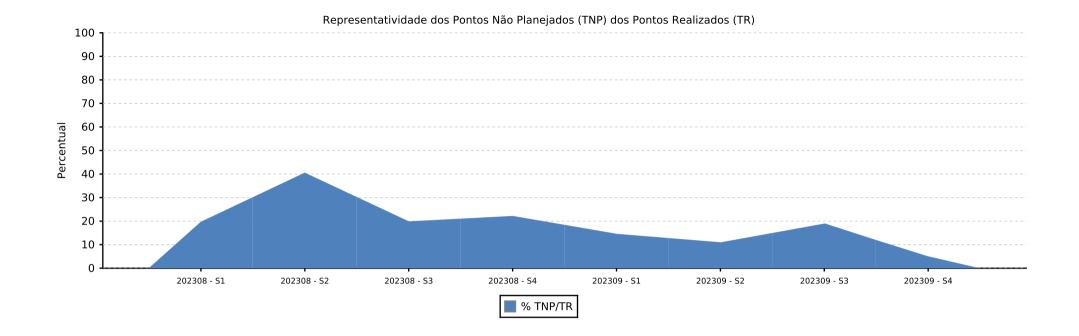


		202	308			202	309	
	1	1 2 3 4				2	3	4
TR - Pontos Realizados	51	34.5	75.5	61	58.5	27.5	47.5	39.5
TNP - Pontos Não Planejados	10	14	15	13.5	8.5	3	9	2
% TNP/TR	19,7	40,6	19,9	22,2	14,6	11,0	19,0	5,1

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

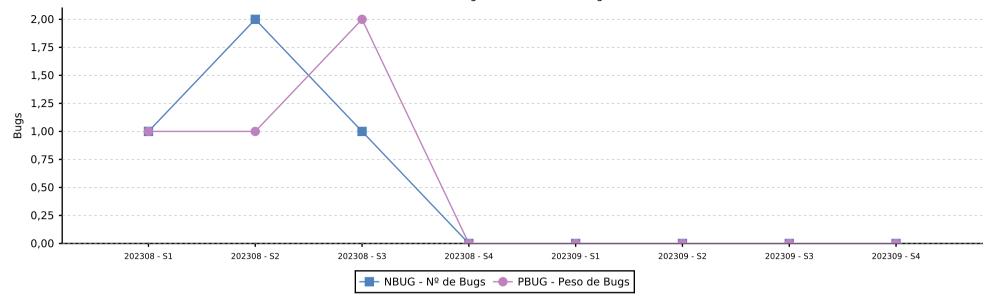

		202	308		202309				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
NBUG - Nº de Bugs	1	2	1	0	0	0	0	0	
PBUG - Peso de Bugs	1	1	2	0	0	0	0	0	
Pontos Entregues	51	34.5	75.5	61	58.5	27.5	47.5	39.5	
% PBUG / TR	1,97	2,90	2,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	




		202	308			202	309	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	51	34.5	75.5	61	58.5	27.5	47.5	39.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0
% TRET/TR	1,0	1,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	93,92	115,98	125,17	103,57	125,17	113,68	90,08	93,02	434,34	426,25	98,1 %
Treinamento	5,58	4,5	6,67	28,03	6,67	36,82	5,58	24,35	24,5	93,7	382,4 %
Code Review	10,5	12,85	13,5	14,15	13,5	23,7	10,5	22,22	48	72,92	151,9 %
Analise de Sistema	8	10,9	9,33	18,48	9,33	11,23	8	10,8	34,66	51,41	148,3 %
Daily Scrum	10,17	8	13,33	9,08	13,33	6,75	10,17	8,83	47	32,66	69,5 %
Cafe	5	4,75	6,25	5	6,25	6,5	5	5	22,5	21,25	94,4 %
Sizing	6	2,13	6	0	6	1	6	4,88	24	8,01	33,4 %
Retrospectiva	5,83	3,5	5,83	6,75	5,83	5	5,83	3,5	23,32	18,75	80,4 %
Sprint Planning 1	7,5	3,75	7,5	6	7,5	3	7,5	3,33	30	16,08	53,6 %
Ginastica Laboral	3,17	2,33	4	3,15	4	3,83	3,17	2,67	14,34	11,98	83,5 %
Verificando apontamento	1,92	1,48	2	2,2	2	2	1,92	2,07	7,84	7,75	98,9 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	1,5	1,33	1,5	0,4	1,5	0,42	1,5	1,88	6	4,03	67,2 %
Reuniao	2	2,08	2,67	1,27	2,67	5,08	3,83	1,82	11,17	10,25	91,8 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1,5	0	2	6,48	2	6,17	1,5	1,8	7	14,45	206,4 %
Sprint Planning 2	2,5	1,25	2,5	3	2,5	1	2,5	0,83	10	6,08	60,8 %
Atualizacao de Versao	2	3,68	2,5	1,5	2,5	4,33	2	0,75	9	10,26	114,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1,92	0,77	1,92	1,15	1,92	0,5	1,92	0,58	7,68	3	39,1 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0,45	0	0	0	0,05	0	0,5	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Ausencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,33	0	1,33	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	5	0	0,0 %
Clean Code	1,75	0,17	1,75	1,92	1,75	1,52	1,75	0	7	3,61	51,6 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Zabbix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas		0,25	0,5	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0,5	50,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais		1	2,53	1,33	0	1,33	0,2	1,17	0	4,83	2,73	56,5 %
Release Notes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas		1	1,02	1	0,08	1	0,33	1	0	4	1,43	35,8 %
Feriado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.		0	0,8	0	1,15	0	0,43	0	0	0	2,38	0,0 %
Teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores		0	0	0	1,03	0	0	0	0	0	1,03	0,0 %
Analise de O.S		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline		0	0,42	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0,42	84,0 %
Atividade Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes		0,5	0	0,5	0	0,5	0,63	0,5	0	2	0,63	31,5 %
Abrir o.s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo		1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	5	0	0,0 %
Particular		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Outros		0	2,63	0	0	0	0	0	0	0	2,63	0,0 %
Check List		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	176,01	187,35	220	214,84	220	234,12	176	188,38	792,01	824,69	104,1 %

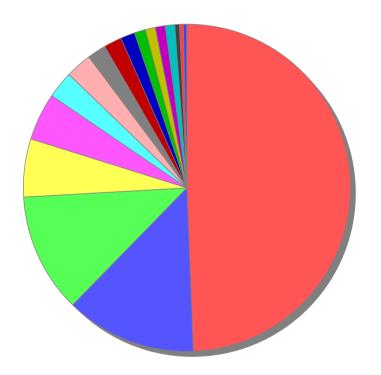

- Desenvolvimento [49.38%]
- Treinamento [12.93%]
- Code Review [11.8%]
- Analise de Sistema [5.73%]
- Daily Scrum [4.69%]
- Cafe [2.65%]
- Sizing [2.59%]
- Retrospectiva [1.86%]
- Sprint Planning 1 [1.77%]
- Ginastica Laboral [1.42%]
- Verificando apontamento [1.1%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1%]
- Reuniao [0.97%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.96%]
- Sprint Planning 2 [0.44%]
- Atualizacao de Versao [0.4%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.31%]
- Atraso / Saida antecipada [0.03%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	102,08	118,25	133,33	107,03	133,33	116,75	98,25	95,48	466,99	437,51	93,7 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	26,5	24,35	32,67	29,98	32,67	35,45	26,5	34,55	118,34	124,33	105,1 %
REQM - Gestao de Requisitos		24	18,83	25,33	28,63	25,33	16,67	24	19,85	98,66	83,98	85,1 %
DIV - Diversos*		12,67	14,33	16,25	15,9	16,25	21,78	14,67	11,28	59,84	63,29	105,8 %
PI - Integracao de Produto		2	3,68	2,5	1,5	2,5	4,33	2	0,75	9	10,26	114,0 %
CM - Gerencia de Configuração		1	1,43	1	0,08	1	0,33	1,5	0	4,5	1,84	40,9 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	1,33	0	1,33	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	168,25	180,87	211,08	183,12	211,08	195,31	168,25	161,91	758,66	721,21	95,1 %

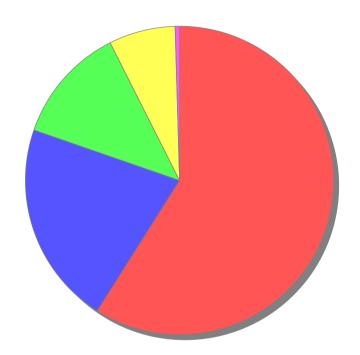


- Desenvolvimento de Requisitos [58.97%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [21.34%]
- Gestao de Requisitos [12.26%]
- Diversos* [6.97%]
- Integracao de Produto [0.46%]

INDICADORES DO PROJETO


	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309
01. Horas planejadas de todas atividades	740h49m	880h00m	798h24m	792h00m	1005h36m	880h00m	880h00m	792h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	509h59m	905h31m	833h01m	795h51m	930h23m	938h39m	950h28m	824h44m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	582h39m	710h05m	631h54m	588h30m	779h36m	696h35m	653h50m	580h10m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	404h12m	709h15m	665h48m	628h26m	732h19m	690h49m	708h03m	518h09m
05. Pontos planejados para o projeto	149,5	241,5	214,0	200,0	234,0	208,0	200,0	176,0
06. Pontos planejados	103,5	201,5	201,0	230,5	230,5	209,0	244,0	187,0
07. Pontos entregues	133,5	216,5	204,5	192,5	222,5	220	222	173
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	104,50	163,50	158,00	137,50	169,50	168,00	169,50	150,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	29,00	53,00	46,50	55,00	53,00	52,00	52,50	22,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	5	2	2	3	5	1	4	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	39	54	57	35	50	73	61	53
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	41	34	34	50	43	45	57	39
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	5	2	2	3	5	1	4	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	1	1	1,5	2	3,5	0,5	1,5	0
16. Produtividade planejada	0,178	0,284	0,319	0,392	0,296	0,301	0,374	0,323
17. Produtividade realizada	0,331	0,306	0,308	0,307	0,304	0,319	0,314	0,334
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	89,3	89,7	95,6	96,3	95,1	105,8	111	98,3
19. % Pontos NP / Pontos entregues	21,8	24,5	22,8	28,6	23,9	23,7	23,7	13,1

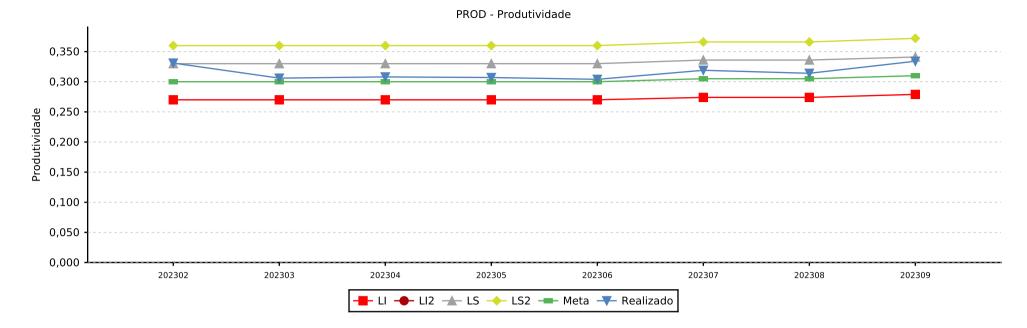


	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309
Realizado	0,331	0,306	0,308	0,307	0,304	0,319	0,314	0,334
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,305	0,305	0,310
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,366	0,366	0,372
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,336	0,336	0,341
LI2								
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,274	0,274	0,279

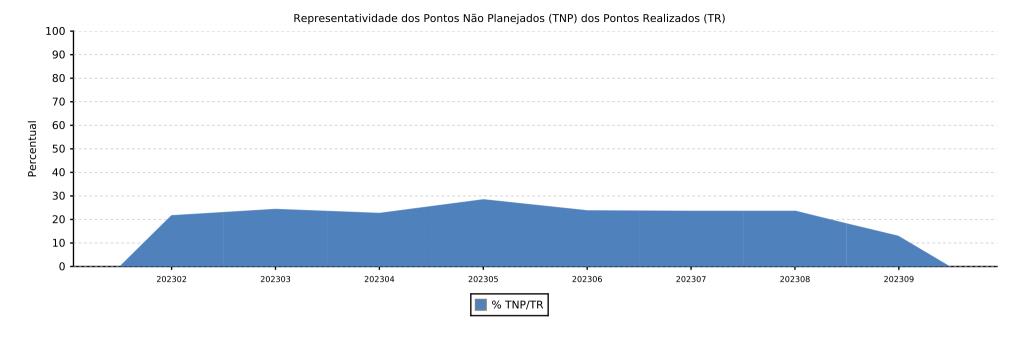


	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309
TR - Pontos Realizados	133.5	216.5	204.5	192.5	222.5	220	222	173
TNP - Pontos Não Planejados	29	53	46.5	55	53	52	52.5	22.5
% TNP/TR	21,8	24,5	22,8	28,6	23,9	23,7	23,7	13,1

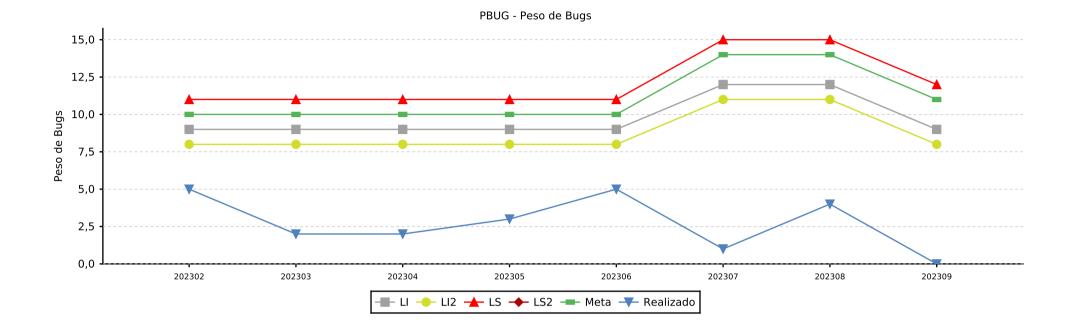


	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309
Realizado	5	2	2	3	5	1	4	0
Meta	10	10	10	10	10	14	14	11
LS2								
LS	11	11	11	11	11	15	15	12
LI2	8	8	8	8	8	11	11	8
LI	9	9	9	9	9	12	12	9
Pontos Entregues	133.5	216.5	204.5	192.5	222.5	220	222	173
% PBUG / TR	3,75	0,93	0,98	1,56	2,25	0,46	1,81	0,00

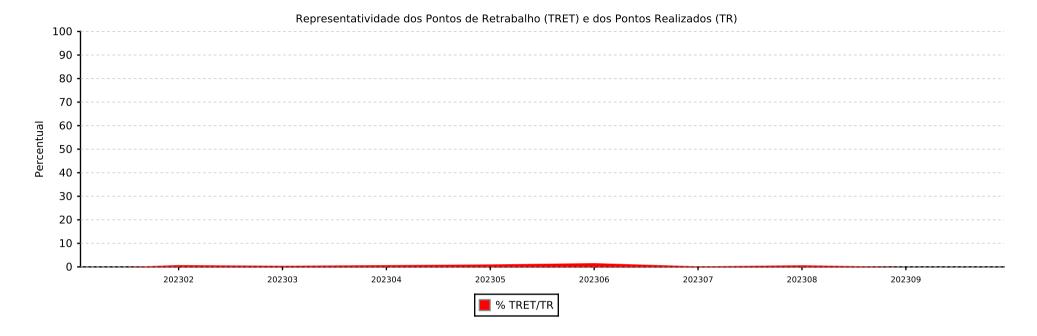


	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309
TR - Pontos Realizados	133.5	216.5	204.5	192.5	222.5	220	222	173
TRET - Pontos de Retrabalho	1	1	1.5	2	3.5	0.5	1.5	0
% TRET/TR	0,7	0,5	0,7	1,0	1,6	0,2	0,7	0,0

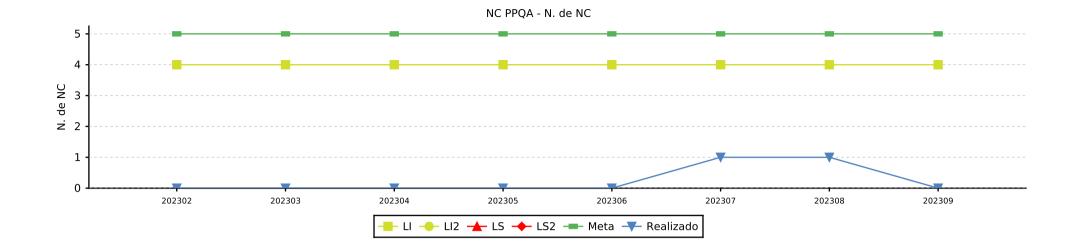


	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309
Realizado	0	0	0	0	0	1	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

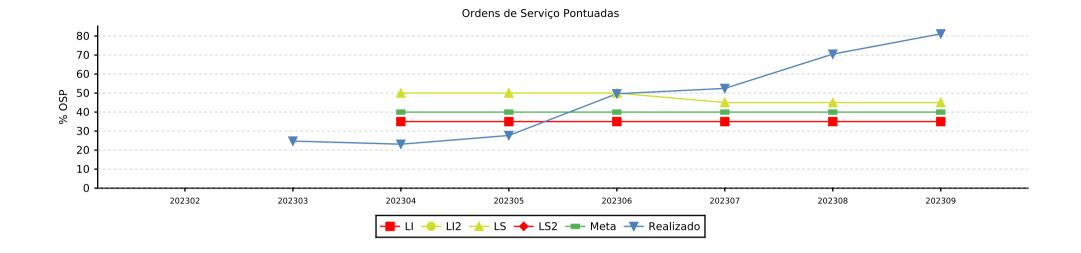

	202302	202303	202304	202305	202306	202307	202308	202309
Realizado	0	24.76	23.11	27.69	49.64	52.46	70.5	81.15
Meta	0	0	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	0	0	50	50	50	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	0	0	35	35	35	35	35	35

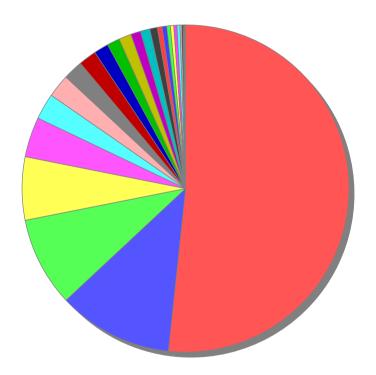

- Desenvolvimento [51.68%]
- Treinamento [11.36%]
- Code Review [8.84%]
- Analise de Sistema [6.23%]
- Daily Scrum [3.96%]
- Ocafe [2.58%]
- Retrospectiva [2.27%]
- Sprint Planning 1 [1.95%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [1.75%]
- Ginastica Laboral [1.45%]
- Atualizacao de Versao [1.25%]
- Reuniao [1.24%]
- Sizing [0.97%]
- Verificando apontamento [0.94%]
- Sprint Planning 2 [0.74%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.49%]
- Clean Code [0.44%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.36%]
- Atividades Gerenciais [0.33%]
- Outros [0.32%]
- Analise Retorno O.S. [0.29%]
- Compilacao de sistemas [0.17%]
- Manutenção de Servidores [0.12%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.08%]
- Geração de Atas [0.06%]
- Atraso / Saida antecipada [0.06%]
- Geracao de Baseline [0.05%]

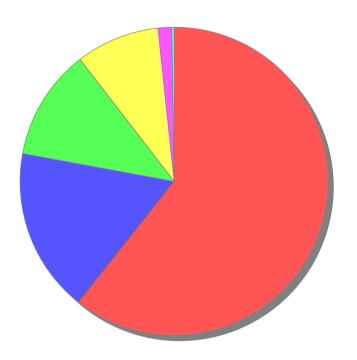

- Desenvolvimento de Requisitos [53.05%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [15.08%]
- Gestao de Requisitos [10.18%]
- Diversos* [7.68%]
- Integracao de Produto [1.25%]
- Gerencia de Configuracao [0.22%]
