

INDICADORES DA SPRINT

		202	504			202	505	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	206h00m	144h00m	204h00m	180h00m	144h00m	156h00m	220h00m	180h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	211h33m	143h26m	208h29m	186h31m	154h25m	162h07m	234h09m	186h44m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	161h30m	113h50m	156h20m	128h45m	104h50m	113h25m	160h00m	127h25m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	124h16m	79h15m	142h19m	112h31m	79h03m	97h17m	159h51m	114h21m
05. Pontos planejados	47,0	36,0	47,5	49,0	28,0	39,0	52,5	34,0
06. Pontos entregues	42,5	18	33,5	46,5	12	35	53	34
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	39,00	17,00	33,00	45,00	7,00	33,00	46,50	34,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	3,50	1,00	0,50	1,50	5,00	2,00	6,50	0
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	3	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	12	3	6	9	4	8	10	8
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	2	1	1	2	4	3	6	0
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	1	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	1	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,292	0,317	0,304	0,381	0,268	0,344	0,329	0,267
16. Produtividade realizada	0,342	0,228	0,236	0,414	0,152	0,360	0,332	0,298
17. % Pontos NP / Pontos entregues	8,3	5,6	1,5	3,3	41,7	5,8	12,3	0

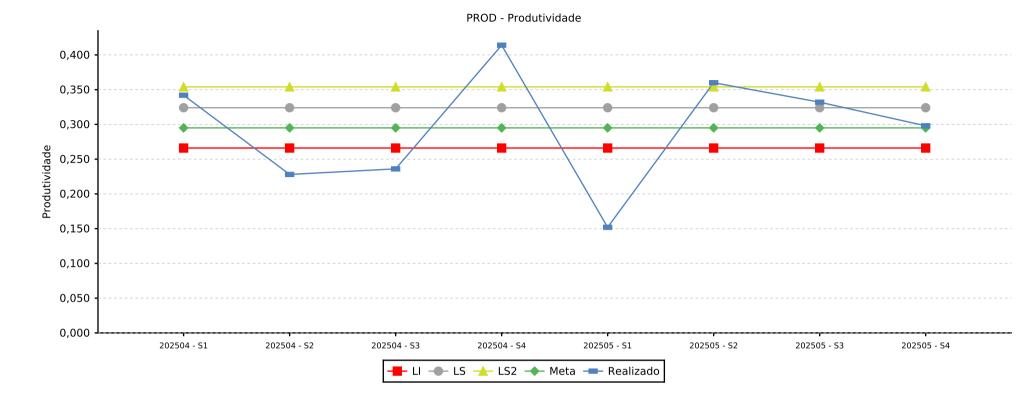


		202	504		202505					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,342	0,228	0,236	0,414	0,152	0,360	0,332	0,298		
Meta	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295		
LS2	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354		
LS	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324		
LI	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266		

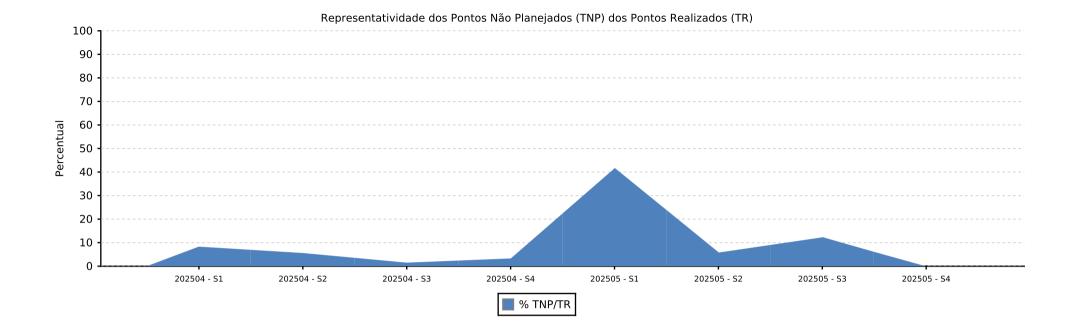


		202	504			202	505	
	1 2 3 4 1					2	3	4
TR - Pontos Realizados	42.5	18	33.5	46.5	12	35	53	34
TNP - Pontos Não Planejados	3.5	1	0.5	1.5	5	2	6.5	0
% TNP/TR	8,3	5,6	1,5	3,3	41,7	5,8	12,3	0,0

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

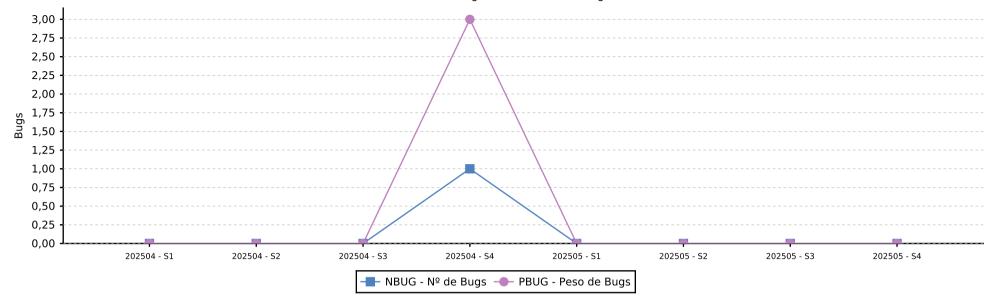

		202	504		202505					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	1	0	0	0	0		
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	3	0	0	0	0		
Pontos Entregues	42.5	18	33.5	46.5	12	35	53	34		
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	6,46	0,00	0,00	0,00	0,00		

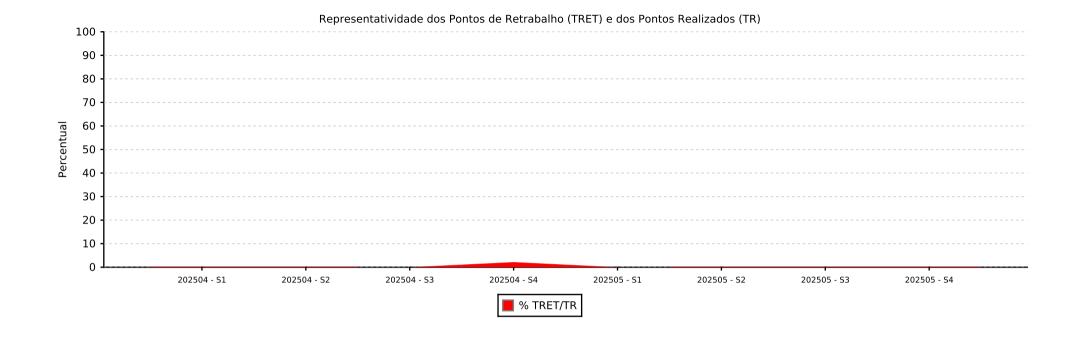


		202	504			202	505	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	42.5	18	33.5	46.5	12	35	53	34
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	1	0	0	0	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	82,33	68,28	89,75	84,7	128,5	135,48	97,33	93,6	397,91	382,06	96,0 %
Analise de Sistema	11	35,65	12	31,68	15,25	28,5	14,25	30,52	52,5	126,35	240,7 %
Code Review	9,5	11,07	10,5	7,6	16	13,35	14,5	16,95	50,5	48,97	97,0 %
Cafe	4	4,32	4,25	4,35	6,25	6,27	5,5	4,63	20	19,57	97,9 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1	1,83	1	0,52	1,5	0,67	1	4,52	4,5	7,54	167,6 %
Daily Scrum	4,67	3,42	5	4,42	7,5	6,25	6,33	4,37	23,5	18,46	78,6 %
Ausencia	0	2,73	0	2,92	0	5,95	0	3,93	0	15,53	0,0 %
Atualizacao de Versao	3	2,27	3	3,65	4,5	4,78	3,5	3,78	14	14,48	103,4 %
Retrospectiva	4	2	4	2,67	5	3,33	5	3,42	18	11,42	63,4 %
Sizing	4	7,37	4	5,75	6	4,3	4	2,83	18	20,25	112,5 %
Reuniao	2,5	2,75	2,5	2,33	3,5	6,25	2,67	2,58	11,17	13,91	124,5 %
Ginastica Laboral	2,67	2,93	2,83	2,33	4	3,67	3,5	2,28	13	11,21	86,2 %
Outros	0,17	0,83	0,17	0,95	0,17	2,27	0,17	2,1	0,68	6,15	904,4 %
Sprint Planning 1	4	0,67	4	1	5	6,25	5	2	18	9,92	55,1 %
Analise de O.S	0,67	1,42	0,67	2,23	0,83	1,02	0,83	1,42	3	6,09	203,0 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,25	1,25	1,25	1,25	100,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	1,25	0	1,25	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	1,75	1,67	2,08	2,1	2,92	1,17	2,92	1	9,67	5,94	61,4 %
Verificando apontamento	0,67	1,03	0,83	0,58	1,5	0,93	1,17	0,88	4,17	3,42	82,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0	0,75	0,0 %
Sprint Planning 2	2	0,33	2	0,33	2,5	2,5	2,5	0,67	9	3,83	42,6 %
Atividades Gerenciais	0,5	1,42	0,5	0	1	0,38	0,5	0,58	2,5	2,38	95,2 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0	0,33	0,0 %
Banheiro	0	0,1	0	0	0	0	0	0,25	0	0,35	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,25	1	0,58	2	0,58	0,25	0,58	0,17	1,99	3,42	171,9 %
Geração de Atas	0,25	0,33	0,25	0	0,25	0	0,25	0,17	1	0,5	50,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,75	0	1	0	1	0	1	0	3,75	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	1,42	0	1,67	0	1,75	0,58	1,75	0	6,59	0,58	8,8 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	0,75	1	0	1	0	1	0	4	0,75	18,8 %
Clean Code	1,67	0	2	0	2,75	0	2,75	0	9,17	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	0	0	0,17	0	0,5	0	0,5	0	1,17	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total G	eral 144,02	154,42	156	162,11	220	234,15	180	186,73	700,02	737,41	105,3 %

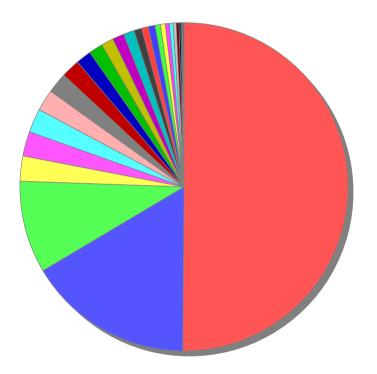

- Desenvolvimento [50.13%]
- Analise de Sistema [16.34%]
- Code Review [9.08%]
- Cafe [2.48%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [2.42%]
- Daily Scrum [2.34%]
- Ausencia [2.1%]
- Atualizacao de Versao [2.02%]
- Retrospectiva [1.83%]
- Sizing [1.52%]
- Reuniao [1.38%]
- Ginastica Laboral [1.22%]
- Outros [1.12%]
- Sprint Planning 1 [1.07%]
- Analise de O.S [0.76%]
- Planejamento de Projeto [0.67%]
- Analise Retorno O.S. [0.67%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.54%]
- Verificando apontamento [0.47%]
- Manutenção de Servidores [0.4%]
- Sprint Planning 2 [0.36%]
- Atividades Gerenciais [0.31%]
- Merge O.S. [0.27%]
- Particular [0.18%]
- Banheiro [0.13%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.09%]
- Geração de Atas [0.09%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	int 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	S	89,17	72,78	98,08	89,32	139	138,15	107,33	99,28	433,58	399,53	92,1 %
REQM - Gestao de Requisitos		21	44,02	22	38,77	28,75	41,55	25,75	37,27	97,5	161,61	165,8 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	18,17	16,48	19,5	14,68	28,5	22,93	25,83	24,73	92	78,82	85,7 %
DIV - Diversos*		10,83	15,73	11,25	12,88	15,92	24,78	13,33	16,62	51,33	70,01	136,4 %
PI - Integracao de Produto		3	2,27	3	3,65	4,5	4,78	3,5	3,78	14	14,48	103,4 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	1,25	1,25	1,25	1,25	100,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		0	0	0,17	0	0,5	0	0,5	0	1,17	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	142,17	151,28	154	159,3	217,17	232,19	177,49	182,93	690,83	725,7	105,0 %

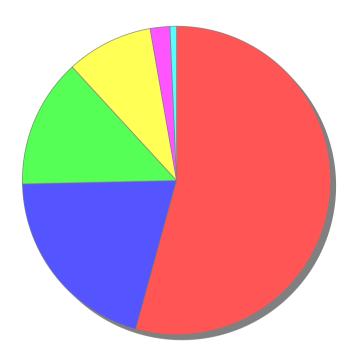


- Desenvolvimento de Requisitos [54.27%]
- Gestao de Requisitos [20.37%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [13.52%]
- Oiversos* [9.09%]
- Integracao de Produto [2.07%]
- O Planejamento de Projeto [0.68%]

INDICADORES DO PROJETO


	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505
01. Horas planejadas de todas atividades	1712h00m	1488h00m	922h00m	854h00m	1176h00m	968h00m	734h00m	700h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1735h03m	1467h27m	968h44m	924h35m	1227h32m	990h22m	749h59m	737h25m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1376h10m	1175h59m	669h35m	627h10m	887h30m	740h15m	560h25m	505h40m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	1285h16m	1019h42m	630h15m	596h30m	757h47m	605h07m	458h21m	450h32m
05. Pontos planejados para o projeto	385,0	330,0	194,0	180,0	256,0	218,0	165,0	148,0
06. Pontos planejados	463,5	410,5	199,0	242,0	314,0	276,5	179,5	153,5
07. Pontos entregues	413,5	319,5	183	173,5	228	178,5	140,5	134
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	331,00	289,50	150,00	134,00	200,00	147,00	134,00	120,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	82,50	30,00	33,00	39,50	28,00	31,50	6,50	13,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	4	4	6	6	3	3	3	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	100	87	52	49	53	47	30	30
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	48	36	23	23	22	21	6	13
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	2	2	2	2	1	1	1	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	1h55m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	3	11	2,5	4,5	1,5	2,5	1	0
16. Produtividade planejada	0,337	0,350	0,298	0,386	0,354	0,374	0,321	0,304
17. Produtividade realizada	0,322	0,314	0,291	0,291	0,301	0,295	0,307	0,298
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	107,5	96,9	94,4	96,4	89,1	81,9	85,2	90,6
19. % Pontos NP / Pontos entregues	20	9,4	18,1	22,8	12,3	17,7	4,7	10,1

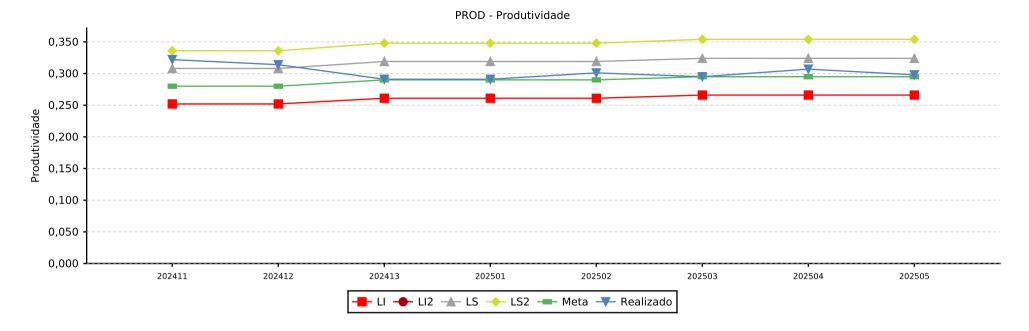


	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505
Realizado	0,322	0,314	0,291	0,291	0,301	0,295	0,307	0,298
Meta	0,280	0,280	0,290	0,290	0,290	0,295	0,295	0,295
LS2	0,336	0,336	0,348	0,348	0,348	0,354	0,354	0,354
LS	0,308	0,308	0,319	0,319	0,319	0,324	0,324	0,324
LI2								
LI	0,252	0,252	0,261	0,261	0,261	0,266	0,266	0,266

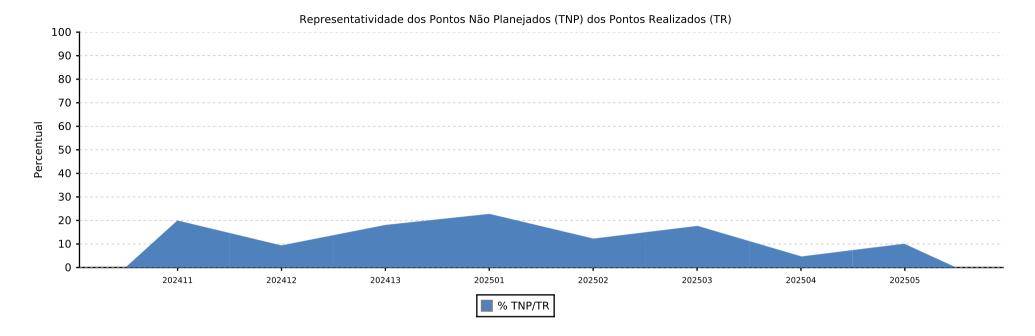


	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505
TR - Pontos Realizados	413.5	319.5	183	173.5	228	178.5	140.5	134
TNP - Pontos Não Planejados	82.5	30	33	39.5	28	31.5	6.5	13.5
% TNP/TR	20,0	9,4	18,1	22,8	12,3	17,7	4,7	10,1

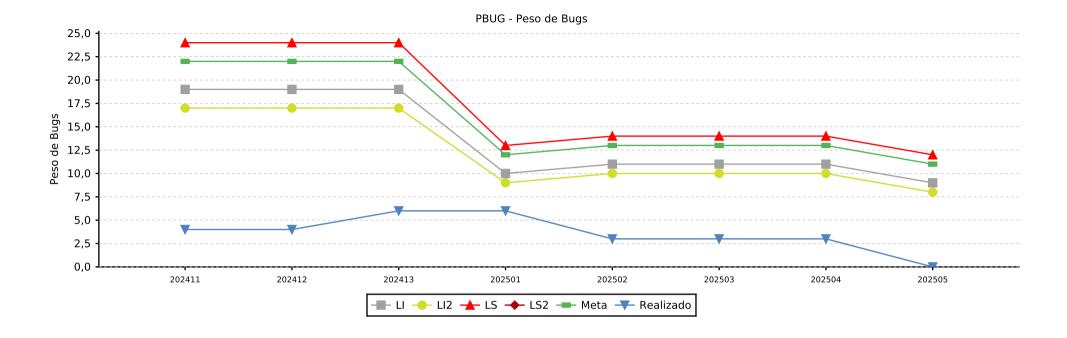


	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505
Realizado	4	4	6	6	3	3	3	0
Meta	22	22	22	12	13	13	13	11
LS2								
LS	24	24	24	13	14	14	14	12
LI2	17	17	17	9	10	10	10	8
LI	19	19	19	10	11	11	11	9
Pontos Entregues	413.5	319.5	183	173.5	228	178.5	140.5	134
% PBUG / TR	0,97	1,26	3,28	3,46	1,32	1,69	2,14	0,00

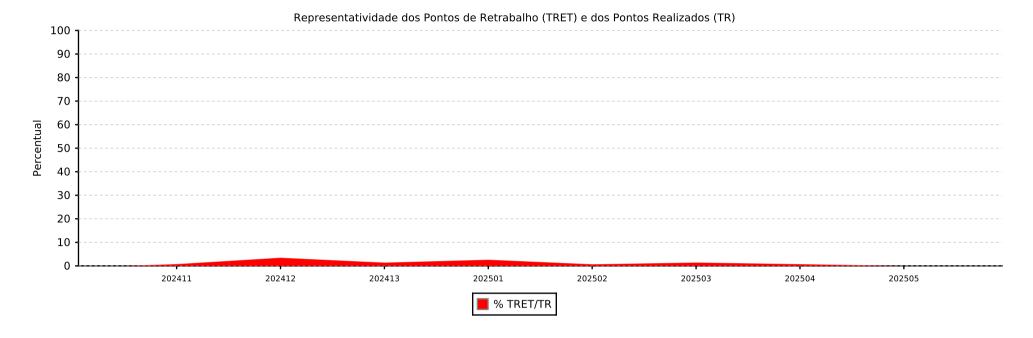

	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505
TR - Pontos Realizados	413.5	319.5	183	173.5	228	178.5	140.5	134
TRET - Pontos de Retrabalho	3	11	2.5	4.5	1.5	2.5	1	0
% TRET/TR	0,7	3,4	1,4	2,6	0,7	1,4	0,7	0,0

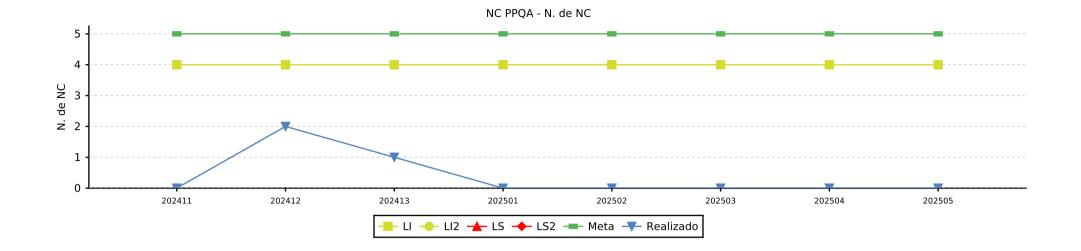

	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505
Realizado	0	2	1	0	0	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

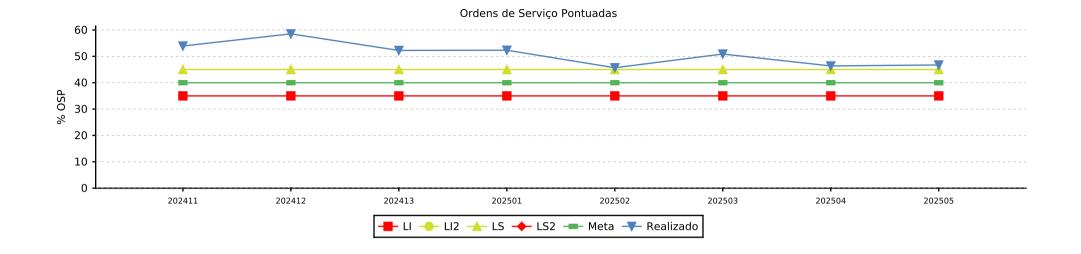

	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504	202505
Realizado	53.93	58.54	52.25	52.34	45.68	50.89	46.37	46.74
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35


% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [51.81%]
- Analise de Sistema [17.13%]

Particular [0.04%]

Verificar o.s no nome [0.03%]

- Code Review [6.64%]
- Sizing [2.75%]
- Cafe [2.65%]
- Daily Scrum [2.5%]
- Ausencia [2.11%]
- Atualizacao de Versao [1.96%]
- Reuniao [1.89%]
- Retrospectiva [1.55%]
- Ginastica Laboral [1.52%]
- Sprint Planning 1 [1.35%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.02%]
- Outros [0.83%]
- Analise de O.S [0.82%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.8%]
- Sprint Planning 2 [0.52%]
- Verificando apontamento [0.47%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.46%]
- Atividades Gerenciais [0.32%]
- Planejamento de Projeto [0.17%]
- Analise Retorno O.S. [0.17%]
- Manutenção de Servidores [0.1%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.1%]
- Correção de Erros Interno [0.08%]
- Merge O.S. [0.07%]
- Geração de Atas [0.07%]
- Banheiro [0.05%]

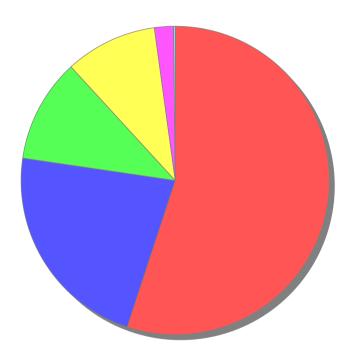

- Desenvolvimento de Requisitos [54.18%]
- Gestao de Requisitos [21.91%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [10.69%]
- Diversos* [9.5%]
- Integracao de Produto [1.96%]
- Planejamento de Projeto [0.17%]
