

INDICADORES DA SPRINT

		202	409			202	410	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	404h08m	490h00m	462h00m	383h36m	400h00m	372h00m	416h00m	431h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	393h44m	489h54m	441h42m	385h04m	380h38m	351h29m	398h50m	465h26m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	308h03m	393h30m	371h35m	308h21m	316h25m	293h15m	331h20m	344h05m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	296h56m	382h56m	308h58m	276h33m	298h24m	265h12m	293h44m	343h42m
05. Pontos planejados	110,5	118,0	126,0	107,5	96,5	93,0	104,0	121,0
06. Pontos entregues	60,5	122	101,5	91,5	85	80,5	92	112,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	47,50	98,50	87,50	80,00	73,00	66,00	70,50	71,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	13,00	23,50	14,00	11,50	12,00	14,50	21,50	41,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	4	6	0	3	0	0	3
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	11	22	21	27	28	13	14	25
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	12	15	10	10	17	24	15	19
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	2	2	0	1	0	0	1
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	2	1,5	0	0	0,5	0	1
15. Produtividade planejada	0,359	0,300	0,340	0,349	0,305	0,318	0,314	0,352
16. Produtividade realizada	0,204	0,319	0,329	0,331	0,285	0,304	0,314	0,328
17. % Pontos NP / Pontos entregues	21,5	19,3	13,8	12,6	14,2	18,1	23,4	36,9

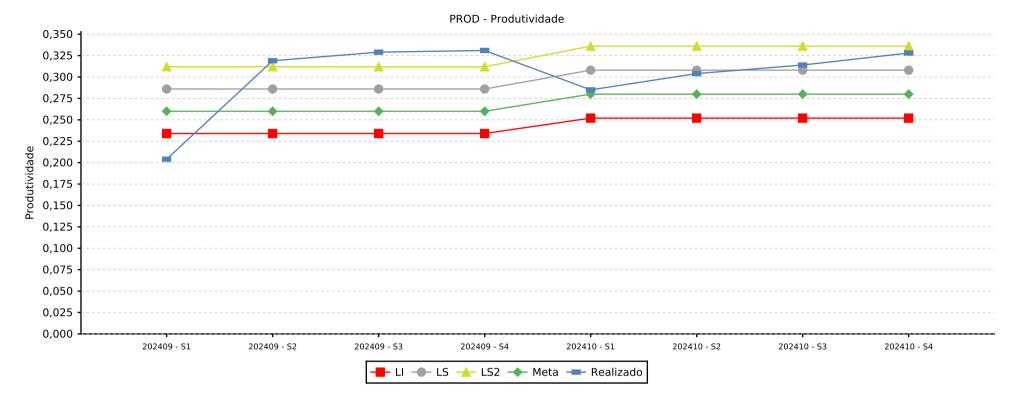


		202	409			202	410	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,204	0,319	0,329	0,331	0,285	0,304	0,314	0,328
Meta	0,260	0,260	0,260	0,260	0,280	0,280	0,280	0,280
LS2	0,312	0,312	0,312	0,312	0,336	0,336	0,336	0,336
LS	0,286	0,286	0,286	0,286	0,308	0,308	0,308	0,308
LI	0,234	0,234	0,234	0,234	0,252	0,252	0,252	0,252

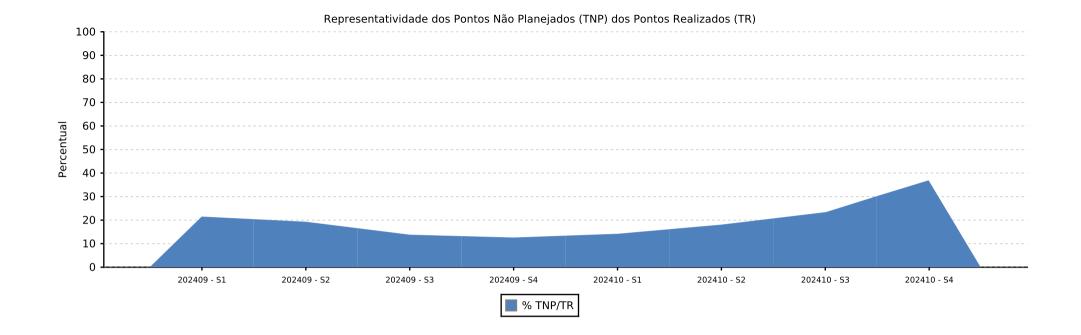


		202	409			202	410	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	60.5	122	101.5	91.5	85	80.5	92	112.5
TNP - Pontos Não Planejados	13	23.5	14	11.5	12	14.5	21.5	41.5
% TNP/TR	21,5	19,3	13,8	12,6	14,2	18,1	23,4	36,9

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

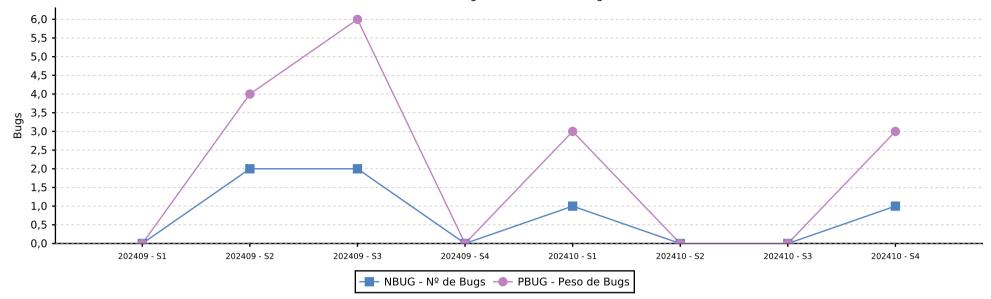

		202	409			202	410	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	2	2	0	1	0	0	1
PBUG - Peso de Bugs	0	4	6	0	3	0	0	3
Pontos Entregues	60.5	122	101.5	91.5	85	80.5	92	112.5
% PBUG / TR	0,00	3,28	5,92	0,00	3,53	0,00	0,00	2,67

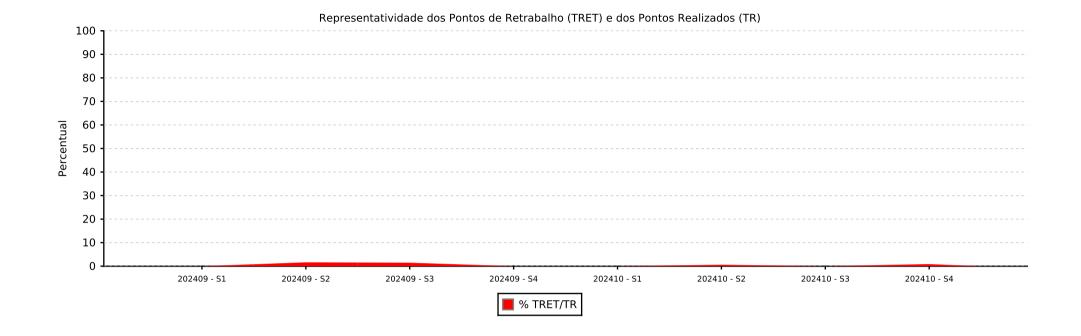


		202	409			202	410	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	60.5	122	101.5	91.5	85	80.5	92	112.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	2	1.5	0	0	0.5	0	1
% TRET/TR	0,0	1,6	1,5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,9

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	261,33	247,68	240,33	211,53	272,83	246,47	278,42	284,18	1.052,91	989,86	94,0 %
Analise de Sistema	17,5	21,52	17,75	12,45	18,75	22,25	19,75	33,77	73,75	89,99	122,0 %
Code Review	19	10,82	17	26,08	17	17,93	17	21,48	70	76,31	109,0 %
Daily Scrum	14,33	18,1	13,33	17,48	14,67	13,63	16	16,05	58,33	65,26	111,9 %
Sprint Planning 1	13,5	9,78	13,5	9,83	15	13,5	16,5	14,17	58,5	47,28	80,8 %
Cafe	12,17	11,15	11,42	10,65	12,67	10,77	12,67	12,3	48,93	44,87	91,7 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	4,5	1,17	4,67	7,43	5,33	7,23	5,58	11,18	20,08	27,01	134,5 %
Analise de O.S	1,67	0	1,67	0,25	2,33	2,75	2,33	10,22	8	13,22	165,2 %
Retrospectiva	12,83	7	12,83	9,83	14,33	9	15,83	9,95	55,82	35,78	64,1 %
Ausencia	1	12,48	1	6,12	1	11,03	1	7,95	4	37,58	939,5 %
Atualizacao de Versao	2,5	3,27	2,5	4,37	2,5	2,12	2,5	7,68	10	17,44	174,4 %
Reuniao	2,67	5,03	2	3,92	2,67	4,73	2	7,33	9,34	21,01	224,9 %
Ginastica Laboral	6,83	5,02	6,17	8,88	7	6,42	7,83	6,12	27,83	26,44	95,0 %
Sprint Planning 2	4,5	6,57	4,5	3,53	5	5,25	5,5	4,82	19,5	20,17	103,4 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,5	5,08	0,5	7	0,5	1,88	0,5	4,27	2	18,23	911,5 %
Verificando apontamento	5,42	2,28	4,67	1,38	5,5	3,28	6,33	3,48	21,92	10,42	47,5 %
Sizing	6	3,05	6	1,17	6	3,17	6	2,95	24	10,34	43,1 %
Banheiro	1,5	1,8	1,5	1,7	1,5	1,13	1,5	1,78	6	6,41	106,8 %
Clean Code	3,17	0	3	0,83	3,5	0	3,83	1,58	13,5	2,41	17,9 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,75	1	1,75	1	57,1 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,58	0	0,58	0,55	0,58	0	0,58	1	2,32	1,55	66,8 %
Documentação	0	0,5	0	0	0	0	0	0,83	0	1,33	0,0 %
Atividades Gerenciais	1,25	0,97	1	0	1	0	1	0,58	4,25	1,55	36,5 %
Outros	1	3,75	1	2,88	1	0,83	1	0,38	4	7,84	196,0 %
Analise Retorno O.S.	0,33	0	0,17	0,48	0,17	1,25	0,17	0,37	0,84	2,1	250,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0,75	0	0	0	0,75	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0,33	0,12	0,33	0	0,33	0,4	0,33	0	1,32	0,52	39,4 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0,0 %
Correção de Erros Interno	1,92	0,92	1,67	0,78	1,67	1,88	1,67	0	6,93	3,58	51,7 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	1,67	1	1,55	1	1,58	1	0	4	4,8	120,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0	0,25	0	0,25	0,08	0,25	0	1	0,08	8,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,32	0	0,0 %
Treinamento	0,25	0,92	0,25	0,78	0,25	1,5	0,25	0	1	3,2	320,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,17	0	0,92	0	1,17	0	1,42	0	4,68	0	0,0 %
Total Geral	400	380,65	372,01	351,45	416	398,81	430,99	465,42	1.619	1.596,33	98,6 %

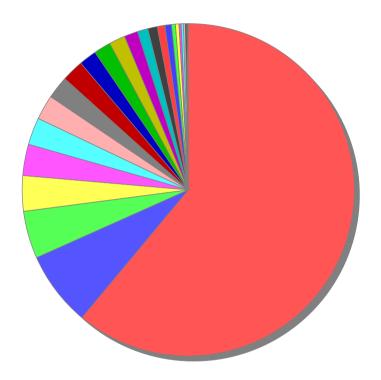

- Desenvolvimento [61.06%]
- Analise de Sistema [7.26%]
- Code Review [4.62%]
- Daily Scrum [3.45%]
- Sprint Planning 1 [3.04%]
- Cafe [2.64%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [2.4%]
- Analise de O.S [2.2%]
- Retrospectiva [2.14%]
- Ausencia [1.71%]
- Atualizacao de Versao [1.65%]
- Reuniao [1.57%]
- Ginastica Laboral [1.31%]
- Sprint Planning 2 [1.04%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.92%]
- Verificando apontamento [0.75%]
- Sizing [0.63%]
- Banheiro [0.38%]
- Clean Code [0.34%]
- Planejamento de Projeto [0.21%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.21%]
- Documentação [0.18%]
- Atividades Gerenciais [0.12%]
- Outros [0.08%]
- Analise Retorno O.S. [0.08%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	int 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	S	273,17	254,85	251,67	228,13	285,58	257,47	292	302,22	1.102,42	1.042,67	94,6 %
REQM - Gestao de Requisitos		42,17	41,03	42,25	27,47	45,25	45,82	48,25	56,07	177,92	170,39	95,8 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	46,17	35,92	43,17	53,4	46	40,57	48,83	47,48	184,17	177,37	96,3 %
DIV - Diversos*		25,92	40,07	23,58	34	26,33	36,12	26,5	34,67	102,33	144,86	141,6 %
PI - Integracao de Produto		2,5	3,27	2,5	4,37	2,5	2,12	2,5	7,68	10	17,44	174,4 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	1,75	1	1,75	1	57,1 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		0,83	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,82	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	390,76	375,14	363,5	347,37	405,99	382,1	420,16	449,12	1.580,41	1.553,73	98,3 %

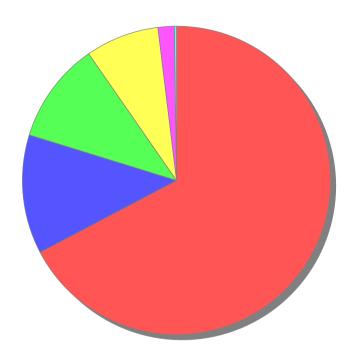


- Desenvolvimento de Requisitos [67.29%]
- Gestao de Requisitos [12.48%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [10.57%]
- Oiversos* [7.72%]
- Integracao de Produto [1.71%]
- O Planejamento de Projeto [0.22%]

INDICADORES DO PROJETO


	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410
01. Horas planejadas de todas atividades	1376h00m	1543h12m	1455h00m	1534h00m	1409h00m	1852h00m	1739h44m	1619h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1479h18m	1607h11m	1619h36m	1608h45m	1556h47m	1874h28m	1710h24m	1596h23m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1057h40m	1229h08m	1130h30m	1193h00m	1094h00m	1483h50m	1381h29m	1285h05m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	1003h37m	1134h08m	1022h38m	1104h55m	1014h08m	1346h36m	1265h23m	1201h02m
05. Pontos planejados para o projeto	312,0	348,0	316,0	334,0	304,0	364,0	462,0	360,0
06. Pontos planejados	316,5	296,5	242,0	302,0	245,0	357,5	462,0	414,5
07. Pontos entregues	293,5	328,5	288,5	335,5	295,5	415,5	375,5	370
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	222,00	270,50	239,00	249,00	207,50	296,00	313,50	280,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	71,50	58,00	49,50	86,50	88,00	119,50	62,00	89,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	5	3	12	13	14	10	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	84	107	106	98	68	92	81	80
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	57	43	32	50	72	78	47	75
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	3	3	5	9	6	4	2
14. Horas de correção de bug	0h00m							
15. Pontos de retrabalho	2,5	3,5	3	4	5	6	3,5	1,5
16. Produtividade planejada	0,300	0,242	0,215	0,254	0,224	0,241	0,335	0,323
17. Produtividade realizada	0,293	0,290	0,283	0,304	0,292	0,309	0,297	0,309
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	94,1	94,4	91,3	100,5	97,3	114,2	81,3	102,8
19. % Pontos NP / Pontos entregues	24,4	17,7	17,2	25,8	29,8	28,8	16,6	24,2

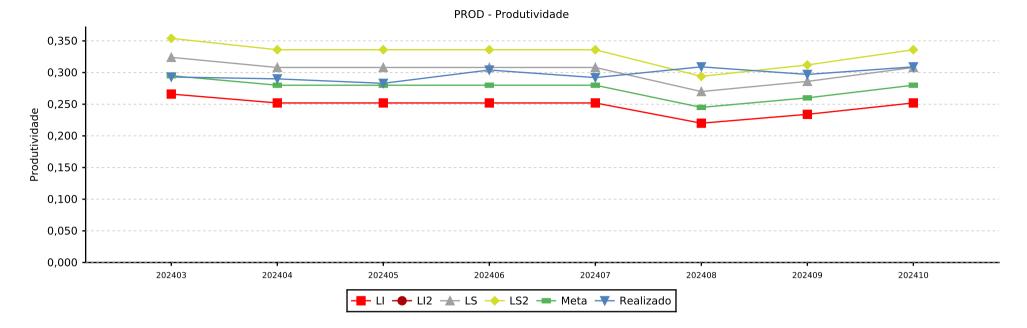


	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410
Realizado	0,293	0,290	0,283	0,304	0,292	0,309	0,297	0,309
Meta	0,295	0,280	0,280	0,280	0,280	0,245	0,260	0,280
LS2	0,354	0,336	0,336	0,336	0,336	0,294	0,312	0,336
LS	0,324	0,308	0,308	0,308	0,308	0,270	0,286	0,308
LI2								
LI	0,266	0,252	0,252	0,252	0,252	0,220	0,234	0,252

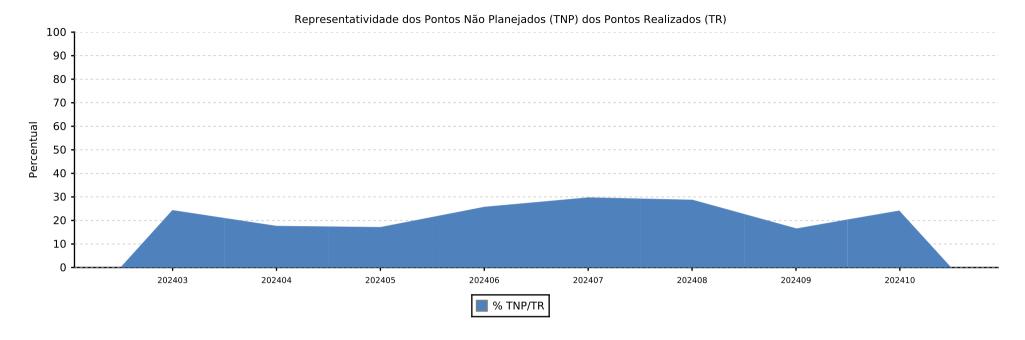


	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410
TR - Pontos Realizados	293.5	328.5	288.5	335.5	295.5	415.5	375.5	370
TNP - Pontos Não Planejados	71.5	58	49.5	86.5	88	119.5	62	89.5
% TNP/TR	24,4	17,7	17,2	25,8	29,8	28,8	16,6	24,2

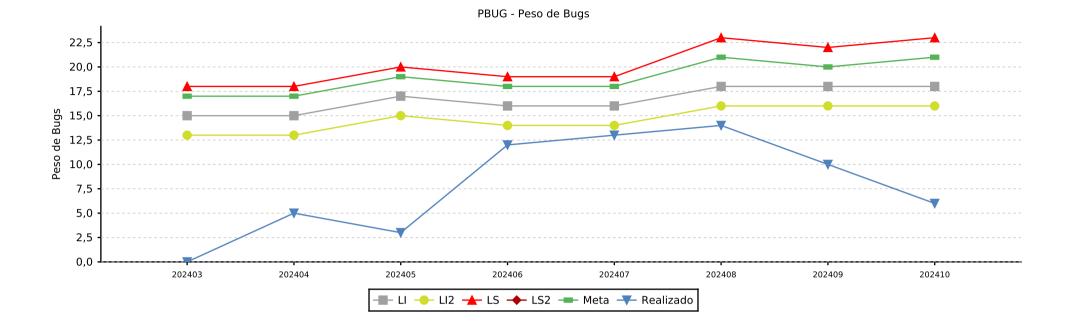


	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410
Realizado	0	5	3	12	13	14	10	6
Meta	17	17	19	18	18	21	20	21
LS2								
LS	18	18	20	19	19	23	22	23
LI2	13	13	15	14	14	16	16	16
LI	15	15	17	16	16	18	18	18
Pontos Entregues	293.5	328.5	288.5	335.5	295.5	415.5	375.5	370
% PBUG / TR	0,00	1,53	1,04	3,58	4,40	3,37	2,67	1,63

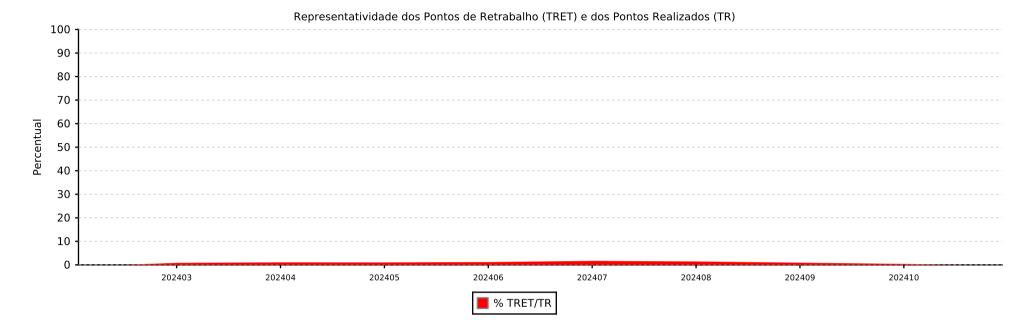


	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410
TR - Pontos Realizados	293.5	328.5	288.5	335.5	295.5	415.5	375.5	370
TRET - Pontos de Retrabalho	2.5	3.5	3	4	5	6	3.5	1.5
% TRET/TR	0,9	1,1	1,0	1,2	1,7	1,4	0,9	0,4

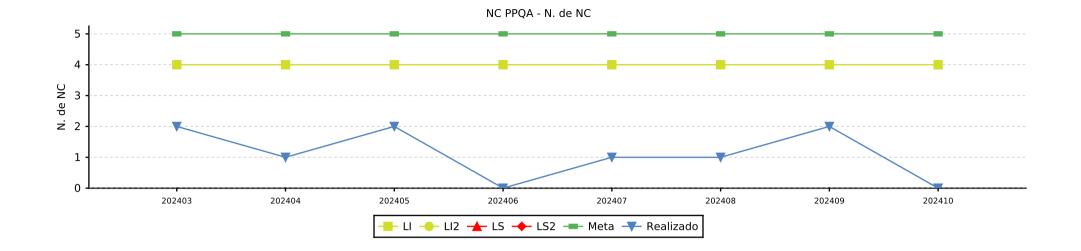

	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410
Realizado	2	1	2	0	1	1	2	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

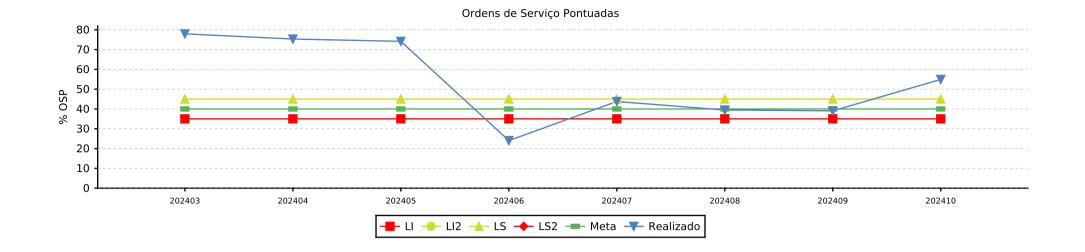


	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409	202410
Realizado	77.95	75.33	74.16	24.03	43.77	39.47	39.06	54.92
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35



% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [62.01%]
- Analise de Sistema [5.64%]
- Code Review [4.78%]
- Daily Scrum [4.09%]
- Sprint Planning 1 [2.96%]
- Cafe [2.81%]
- Ausencia [2.35%]
- Retrospectiva [2.24%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.69%]
- Ginastica Laboral [1.66%]
- Reuniao [1.32%]
- Sprint Planning 2 [1.26%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.14%]
- Atualizacao de Versao [1.09%]
- Analise de O.S [0.83%]
- Verificando apontamento [0.65%]
- Sizing [0.65%]
- Atestado [0.5%]
- Outros [0.49%]
- Banheiro [0.4%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.3%]
- Correção de Erros Interno [0.22%]
- Treinamento [0.2%]
- Clean Code [0.15%]
- Analise Retorno O.S. [0.13%]
- Atividades Gerenciais [0.1%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.1%]
- Documentação [0.08%]

- Planejamento de Projeto [0.06%]
- Merge O.S. [0.05%]
- Preparando ambiente [0.03%]
- O Geração de Atas [0.01%]

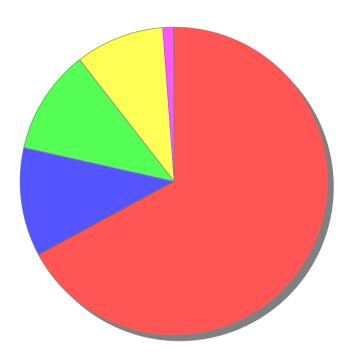

- Desenvolvimento de Requisitos [65.31%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [11.11%]
- Gestao de Requisitos [10.67%]
- Diversos* [9.07%]
- Integracao de Produto [1.09%]
- Planejamento de Projeto [0.06%]
