

INDICADORES DA SPRINT

		202	507			202	508	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	216h00m	264h00m	264h00m	264h00m	264h00m	264h00m	264h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	229h19m	277h43m	278h11m	280h45m	276h29m	280h35m	279h22m	231h05m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	156h55m	195h20m	195h20m	195h10m	186h25m	189h25m	189h25m	151h10m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	163h43m	164h15m	154h49m	148h31m	174h36m	173h41m	176h25m	140h43m
05. Pontos planejados	62,0	70,0	66,0	71,5	59,0	56,5	50,0	57,5
06. Pontos entregues	33	51,5	44	62	40	50	64	46
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	29,50	48,00	38,00	46,50	33,00	35,50	54,50	37,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	3,50	3,50	6,00	15,50	7,00	14,50	9,50	8,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	1	3	0	3	0	2
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	9	13	6	8	6	11	10	12
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	3	4	7	8	6	10	9	4
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	2	1	1	0	1	0	1
13. Horas de correção de bug	0h00m	4h10m	1h40m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	3	1	0,5	0	1	0	0,5
15. Produtividade planejada	0,396	0,359	0,338	0,367	0,317	0,299	0,264	0,381
16. Produtividade realizada	0,202	0,314	0,285	0,418	0,230	0,288	0,363	0,327
17. % Pontos NP / Pontos entregues	10,7	6,8	13,7	25	17,5	29	14,9	18,5

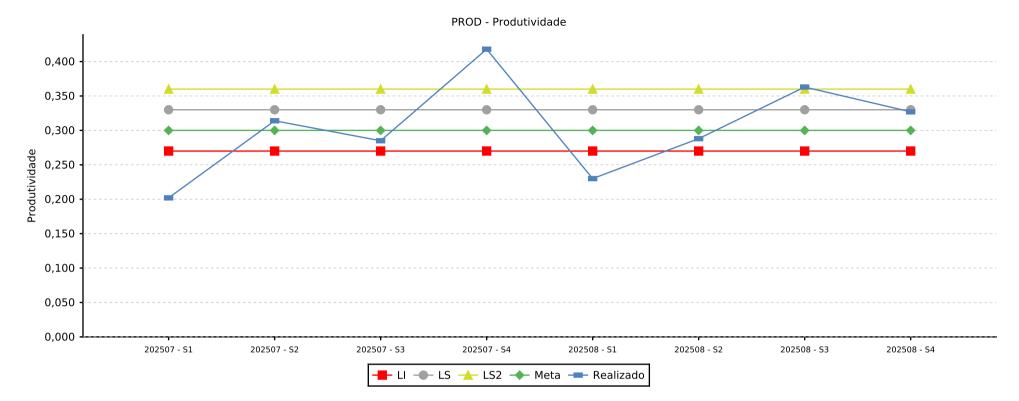


		202	507			202	508	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,202	0,314	0,285	0,418	0,230	0,288	0,363	0,327
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270

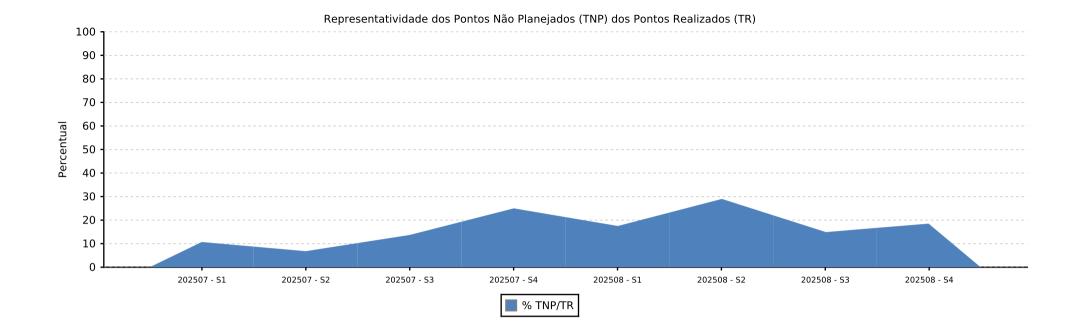


		202	507			202	508	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	33	51.5	44	62	40	50	64	46
TNP - Pontos Não Planejados	3.5	3.5	6	15.5	7	14.5	9.5	8.5
% TNP/TR	10,7	6,8	13,7	25,0	17,5	29,0	14,9	18,5

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

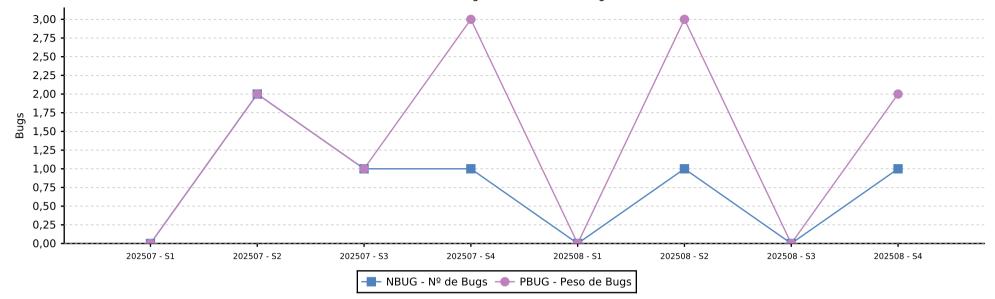

		202	507	-	202508					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
NBUG - Nº de Bugs	0	2	1	1	0	1	0	1		
PBUG - Peso de Bugs	0	2	1	3	0	3	0	2		
Pontos Entregues	33	51.5	44	62	40	50	64	46		
% PBUG / TR	0,00	3,89	2,28	4,84	0,00	6,00	0,00	4,35		

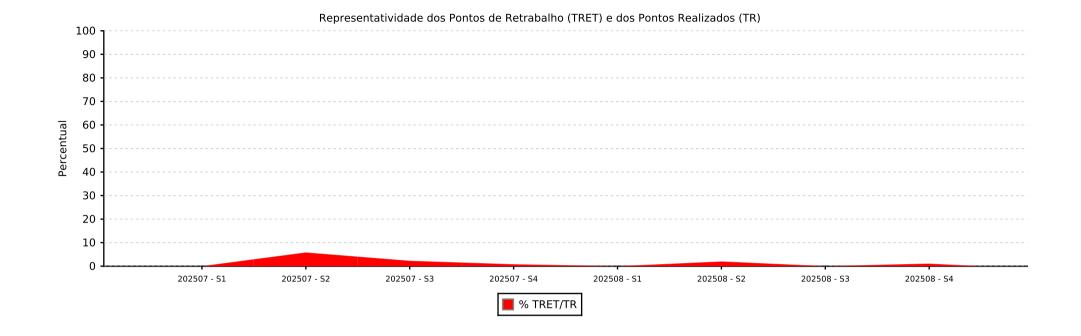


		202	507			202	508	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	33	51.5	44	62	40	50	64	46
TRET - Pontos de Retrabalho	0	3	1	0.5	0	1	0	0.5
% TRET/TR	0,0	5,8	2,3	0,8	0,0	2,0	0,0	1,1

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	nt 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	153,17	148,02	155,83	140,6	155,83	155,87	121,83	121,5	586,66	565,99	96,5 %
Analise de Sistema	18,75	34,78	18,75	25,42	18,75	27,62	15,75	25,67	72	113,49	157,6 %
Code Review	23,5	23,9	23,5	26,82	23,5	20	23,5	21,2	94	91,92	97,8 %
Ausencia	0	4,55	0	4,83	0	3,93	0	13,87	0	27,18	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	3,17	2,12	3,17	4,08	3,17	3,5	2,83	6,32	12,34	16,02	129,8 %
Cafe	7,5	7,3	7,5	7,88	7,5	7,2	6,25	6,07	28,75	28,45	99,0 %
Daily Scrum	8,5	6,43	8,83	8,28	8,83	8,67	7,33	6,05	33,49	29,43	87,9 %
Retrospectiva	6	4,58	6	4,67	6	5,25	5	4,25	23	18,75	81,5 %
Ginastica Laboral	5	5,38	5	4,65	5	4,42	4,17	4,02	19,17	18,47	96,3 %
Sizing	6	5,95	6	3,63	6	6,33	6	3,83	24	19,74	82,3 %
Sprint Planning 1	6	3,92	6	4,67	6	3	5	2,42	23	14,01	60,9 %
Compilacao de sistemas	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	2,33	2	2,33	116,5 %
Auxilio ao Desenvolvimento	2	1,07	2	2,9	2	1	2	2	8	6,97	87,1 %
Treinamento	0,25	0	0,25	0	0,25	3,48	0,25	1,83	1	5,31	531,0 %
Atualizacao de Versao	4	3,77	4	0,25	4	1,08	4	1,58	16	6,68	41,8 %
Verificando apontamento	2,33	3,4	2,33	1,85	2,33	2,53	2,33	1,45	9,32	9,23	99,0 %
Sprint Planning 2	3	2,08	3	2	3	1,5	2,5	1,25	11,5	6,83	59,4 %
Clean Code	2,75	0	2,75	0,33	2,75	0	1,75	1,25	10	1,58	15,8 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	3,75	0	1,03	0	4,78	0,0 %
Reuniao	3,67	5,7	3,67	10,22	3,67	2,53	3,67	0,75	14,68	19,2	130,8 %
Analise de O.S	0,83	1,67	0,83	1,18	0,83	1,5	0,83	0,67	3,32	5,02	151,2 %
Atividades Gerenciais	1	0	1	0,33	1	0,92	1	0,58	4	1,83	45,8 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1	0,42	1	0,42	42,0 %
Outros	0,17	3,5	0,17	7,3	0,17	6,47	0,17	0,33	0,68	17,6	2.588,2
Merge O.S.	0,33	0	0,33	0	0,33	0	0	0,33	0,99	0,33	33,3 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	0	1	0	1	0	1	0,08	4	0,08	2,0 %
Correcao de Erros Externo	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,25	0	1,75	0	0,0 %
Particular	3	0	0	0	0	0,67	0	0	3	0,67	22,3 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0,08	0	0,42	0	0,05	0	0	0	0,55	0,0 %


Documentação	0	0,67	0	0,58	0	0	0	0	0	1,25	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	2,97	0	7,48	0	7,75	0	0	0	18,2	0,0 %
Correção de Erros Interno	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	2	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	4,65	0	9,57	0	0	0	0	0	14,22	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0,35	0	0	0	0,35	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,33	0	0,33	0,63	0,33	0	0,33	0	1,32	0,63	47,7 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	264	276,49	263,99	280,57	263,99	279,37	219,99	231,08	1.011,97	1.067,51	105,5 %



- Desenvolvimento [52.58%]
- Analise de Sistema [11.11%]
- Code Review [9.17%]
- O Ausencia [6%]
- Oriacao de Ambiente de Desenv. [2.73%]
- Cafe [2.63%]
- Daily Scrum [2.62%]
- Retrospectiva [1.84%]
- Ginastica Laboral [1.74%]
- Sizing [1.66%]
- Sprint Planning 1 [1.05%]
- Compilacao de sistemas [1.01%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.87%]
- Treinamento [0.79%]
- Atualizacao de Versao [0.68%]
- Verificando apontamento [0.63%]
- Sprint Planning 2 [0.54%]
- Clean Code [0.54%]
- Analise Retorno O.S. [0.45%]
- Reuniao [0.32%]
- Analise de O.S [0.29%]
- Atividades Gerenciais [0.25%]
- Planejamento de Projeto [0.18%]
- Outros [0.14%]
- Merge O.S. [0.14%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.03%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	int 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	int 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	S	162,42	151,2	165,08	148,55	165,08	160,37	129,5	131,07	622,08	591,19	95,0 %
REQM - Gestao de Requisitos		33,75	46,73	33,75	35,72	33,75	42,2	29,25	34,2	130,5	158,85	121,7 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	38	34,92	38,33	39,77	38,33	33,92	35,83	31,5	150,49	140,11	93,1 %
DIV - Diversos*		18,67	26,43	18,67	35,22	18,67	25,47	16,25	26,03	72,26	113,15	156,6 %
CM - Gerencia de Configuração		0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	2,33	2	2,33	116,5 %
PI - Integracao de Produto		4	3,77	4	0,25	4	1,08	4	1,58	16	6,68	41,8 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	1	0,42	1	0,42	42,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	257,34	263,05	260,33	259,51	260,33	263,04	216,33	227,13	994,33	1.012,73	101,9 %

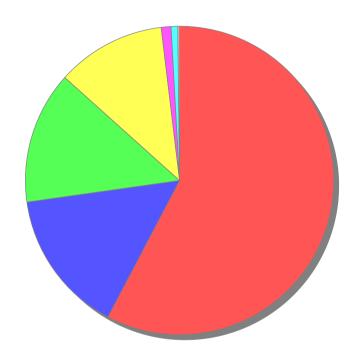


- Desenvolvimento de Requisitos [57.71%]
- Gestao de Requisitos [15.06%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [13.87%]
- Diversos* [11.46%]
- Gerencia de Configuracao [1.03%]
- Integracao de Produto [0.7%]
- Planejamento de Projeto [0.18%]

INDICADORES DO PROJETO


	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508
01. Horas planejadas de todas atividades	854h00m	1176h00m	968h00m	734h00m	700h00m	1056h00m	1008h00m	1012h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	924h35m	1227h32m	990h22m	749h59m	737h25m	1145h23m	1065h58m	1067h31m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	627h10m	887h30m	740h15m	560h25m	505h40m	788h50m	742h45m	716h25m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	596h30m	757h47m	605h07m	458h21m	450h32m	723h16m	631h18m	665h25m
05. Pontos planejados para o projeto	180,0	256,0	218,0	165,0	148,0	232,0	218,0	216,0
06. Pontos planejados	242,0	314,0	276,5	179,5	153,5	248,5	269,5	223,0
07. Pontos entregues	173,5	228	178,5	140,5	134	216,5	190,5	200
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	134,00	200,00	147,00	134,00	120,50	188,50	162,00	160,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	39,50	28,00	31,50	6,50	13,50	28,00	28,50	39,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	6	3	3	3	0	6	6	5
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	49	53	47	30	30	42	36	39
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	23	22	21	6	13	19	22	29
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	2	1	1	1	0	2	4	2
14. Horas de correção de bug	0h00m	1h55m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	5h50m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	4,5	1,5	2,5	1	0	2	4,5	1,5
16. Produtividade planejada	0,386	0,354	0,374	0,321	0,304	0,316	0,363	0,312
17. Produtividade realizada	0,291	0,301	0,295	0,307	0,298	0,300	0,302	0,301
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	96,4	89,1	81,9	85,2	90,6	93,4	87,4	92,6
19. % Pontos NP / Pontos entregues	22,8	12,3	17,7	4,7	10,1	13	15	19,8

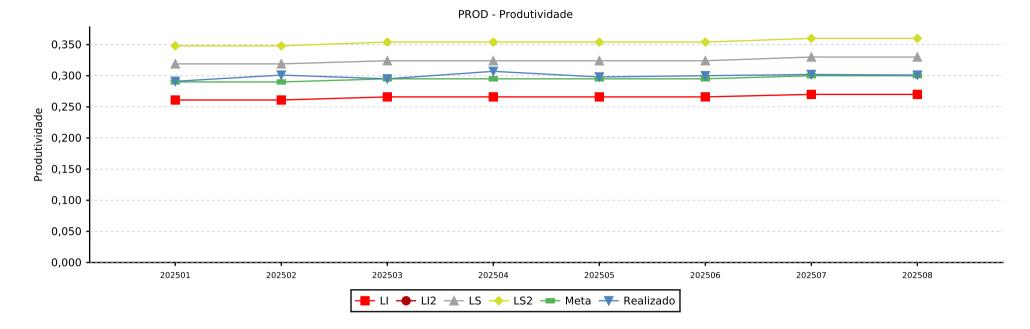


	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508
Realizado	0,291	0,301	0,295	0,307	0,298	0,300	0,302	0,301
Meta	0,290	0,290	0,295	0,295	0,295	0,295	0,300	0,300
LS2	0,348	0,348	0,354	0,354	0,354	0,354	0,360	0,360
LS	0,319	0,319	0,324	0,324	0,324	0,324	0,330	0,330
LI2								
LI	0,261	0,261	0,266	0,266	0,266	0,266	0,270	0,270

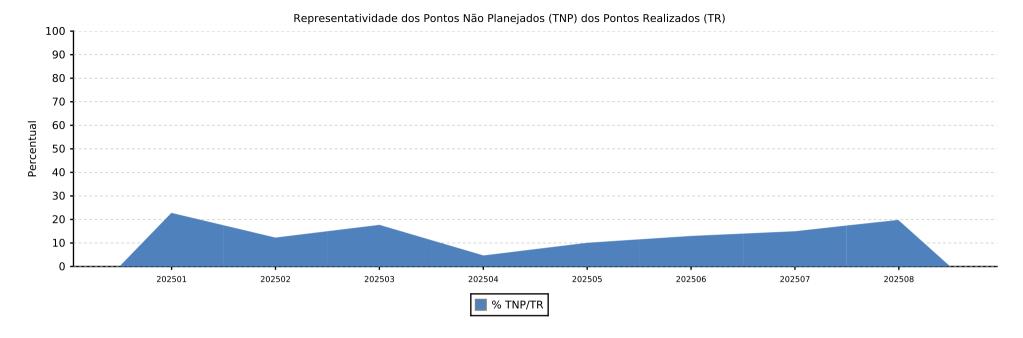


	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508
TR - Pontos Realizados	173.5	228	178.5	140.5	134	216.5	190.5	200
TNP - Pontos Não Planejados	39.5	28	31.5	6.5	13.5	28	28.5	39.5
% TNP/TR	22,8	12,3	17,7	4,7	10,1	13,0	15,0	19,8

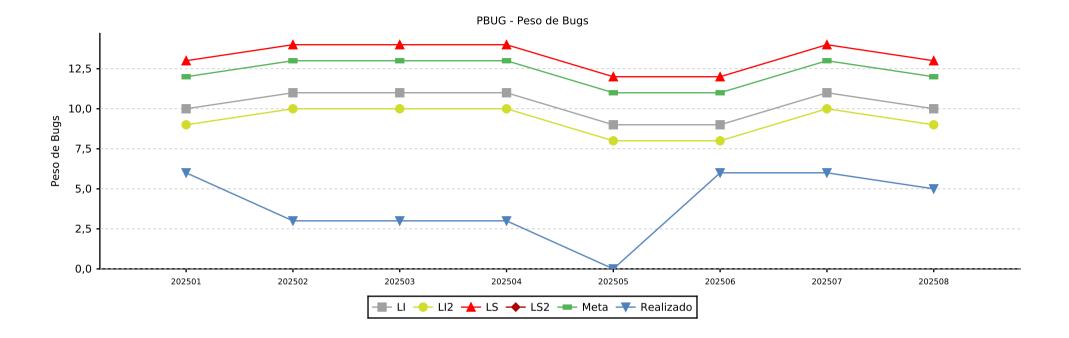


	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508
Realizado	6	3	3	3	0	6	6	5
Meta	12	13	13	13	11	11	13	12
LS2								
LS	13	14	14	14	12	12	14	13
LI2	9	10	10	10	8	8	10	9
LI	10	11	11	11	9	9	11	10
Pontos Entregues	173.5	228	178.5	140.5	134	216.5	190.5	200
% PBUG / TR	3,46	1,32	1,69	2,14	0,00	2,78	3,15	2,50

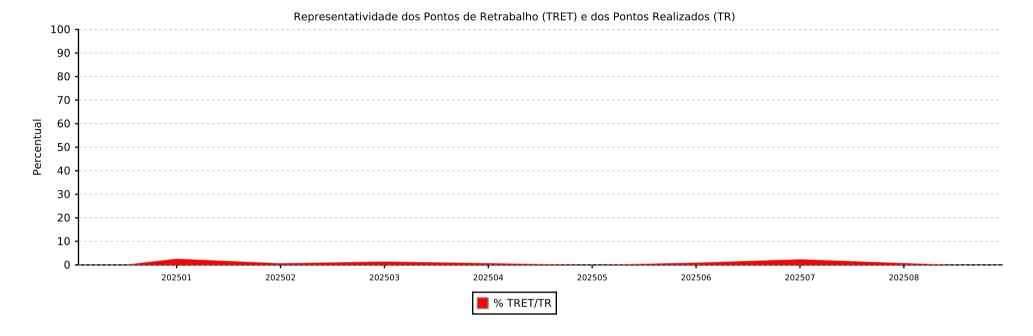

	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508
TR - Pontos Realizados	173.5	228	178.5	140.5	134	216.5	190.5	200
TRET - Pontos de Retrabalho	4.5	1.5	2.5	1	0	2	4.5	1.5
% TRET/TR	2,6	0,7	1,4	0,7	0,0	0,9	2,4	0,8

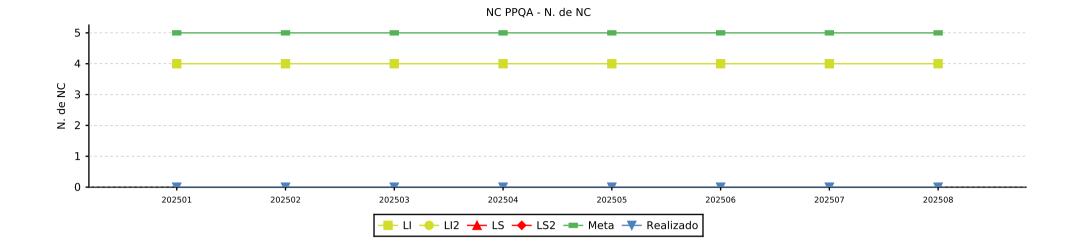

	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

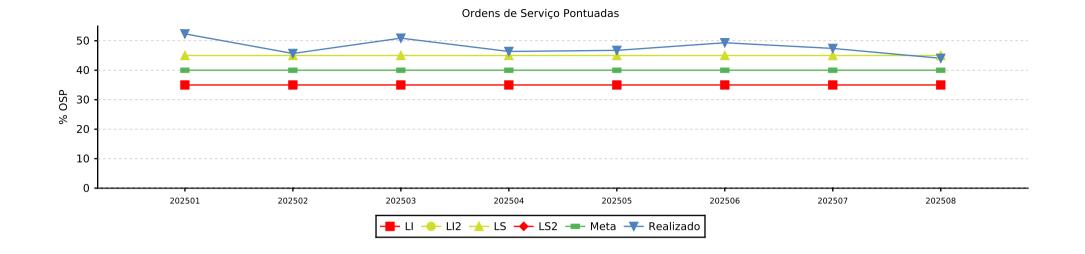


	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507	202508
Realizado	52.34	45.68	50.89	46.37	46.74	49.32	47.4	44.05
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [53.02%]
- Analise de Sistema [10.63%]
- Code Review [8.61%]
- Daily Scrum [2.76%]
- Cafe [2.67%]
- Ausencia [2.55%]
- Sizing [1.85%]
- Reuniao [1.8%]
- Retrospectiva [1.76%]
- Ginastica Laboral [1.73%]
- Atestado [1.7%]
- Outros [1.65%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.5%]
- Manutenção de Servidores [1.33%]
- Sprint Planning 1 [1.31%]
- Verificando apontamento [0.86%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.65%]
- Sprint Planning 2 [0.64%]
- Atualizacao de Versao [0.63%]
- Treinamento [0.5%]
- Analise de O.S [0.47%]
- Analise Retorno O.S. [0.45%]
- Compilacao de sistemas [0.22%]
- Atividades Gerenciais [0.17%]
- Clean Code [0.15%]
- Documentação [0.12%]
- Particular [0.06%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.06%]

- Verificar o.s no nome [0.05%]
- Planejamento de Projeto [0.04%]
- Banheiro [0.03%]
- Merge O.S. [0.03%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.01%]

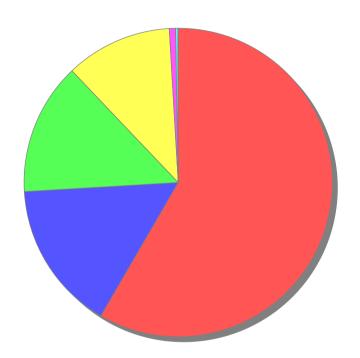

- Desenvolvimento de Requisitos [55.38%]
- Gestao de Requisitos [14.88%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [13.12%]
- Diversos* [10.6%]
- Integracao de Produto [0.63%]
- Gerencia de Configuração [0.22%]
- Planejamento de Projeto [0.04%]
