

INDICADORES DA SPRINT

		202	501			202	502	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	128h00m	226h00m	250h00m	250h00m	294h00m	294h00m	294h00m	294h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	121h06m	256h20m	258h19m	287h20m	305h04m	307h45m	313h31m	301h12m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	96h40m	162h30m	183h40m	184h20m	221h55m	221h55m	221h55m	221h45m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	74h38m	171h49m	179h16m	170h22m	193h01m	189h52m	194h33m	180h21m
05. Pontos planejados	17,0	63,5	90,5	71,0	71,5	80,0	91,5	71,0
06. Pontos entregues	18	38,5	45	72	41,5	68	57,5	61
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	17,00	33,00	37,50	46,50	36,50	51,00	56,50	56,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	1,00	5,50	7,50	25,50	5,00	17,00	1,00	5,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	6	0	0	3	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	12	13	10	14	15	12	13	13
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	2	6	5	10	7	10	2	3
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	2	0	0	1	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h30m	0h00m	0h00m	1h25m
14. Pontos de retrabalho	0,5	0	0	4	0,5	0	1	0
15. Produtividade planejada	0,176	0,391	0,493	0,386	0,323	0,361	0,413	0,321
16. Produtividade realizada	0,242	0,225	0,252	0,423	0,216	0,359	0,296	0,339
17. % Pontos NP / Pontos entregues	5,6	14,3	16,7	35,5	12,1	25	1,8	8,2

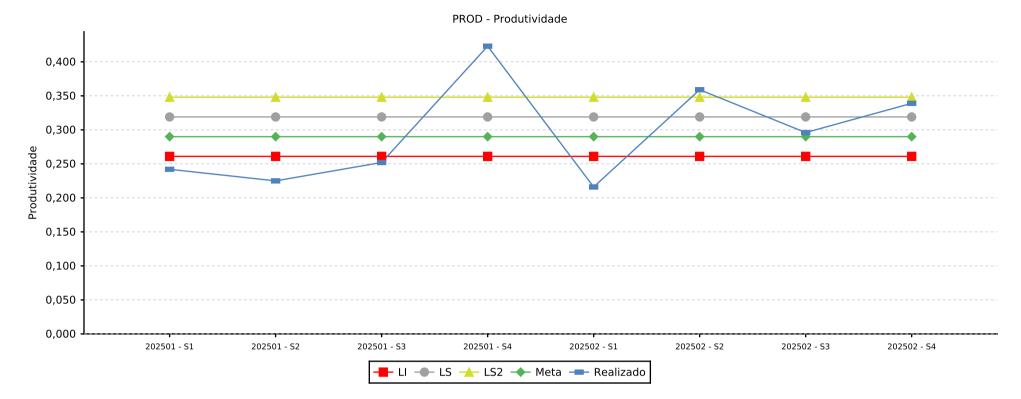


		202	501		202502					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,242	0,225	0,252	0,423	0,216	0,359	0,296	0,339		
Meta	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290	0,290		
LS2	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348		
LS	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319	0,319		
LI	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261	0,261		

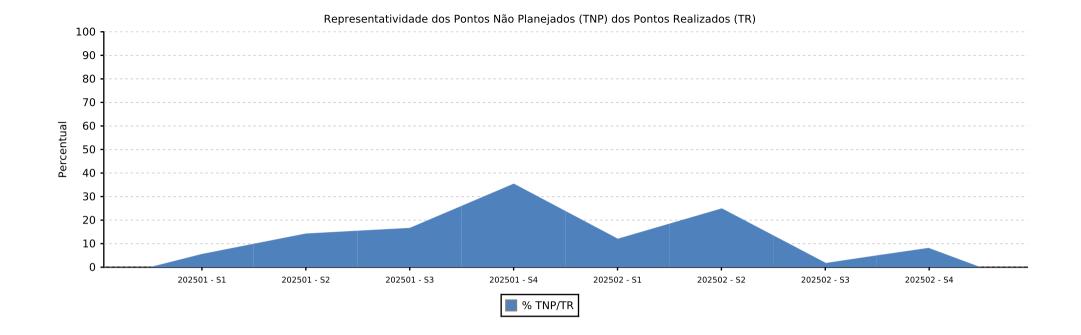


		202	501			202	502	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	18	38.5	45	72	41.5	68	57.5	61
TNP - Pontos Não Planejados	1	5.5	7.5	25.5	5	17	1	5
% TNP/TR	5,6	14,3	16,7	35,5	12,1	25,0	1,8	8,2

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

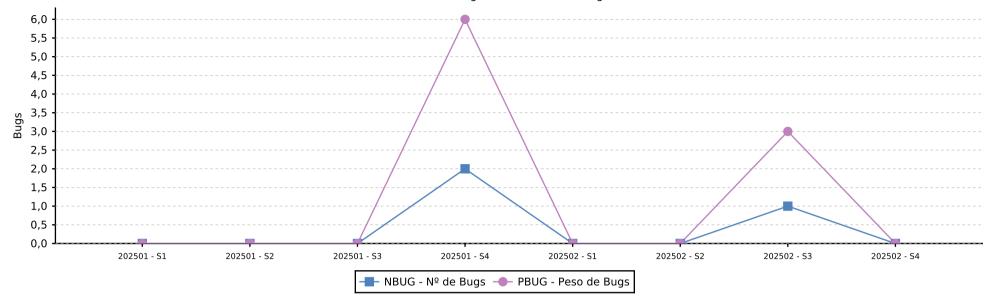

		202	501			202	502	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	2	0	0	1	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	6	0	0	3	0
Pontos Entregues	18	38.5	45	72	41.5	68	57.5	61
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	5,22	0,00

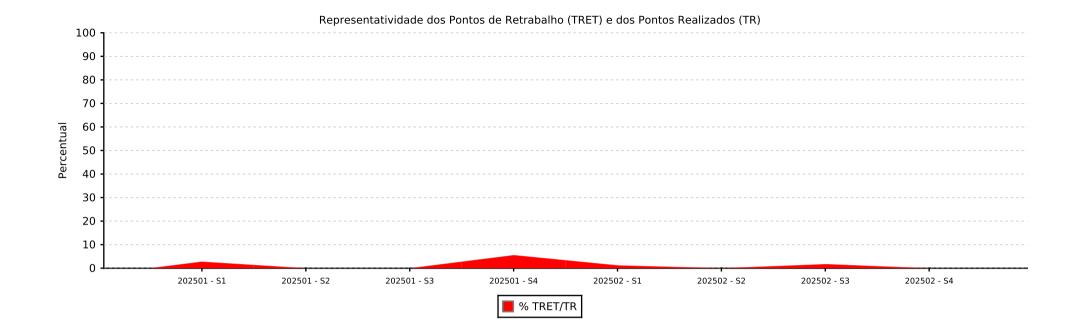


		202	501			202	502	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	18	38.5	45	72	41.5	68	57.5	61
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	0	4	0.5	0	1	0
% TRET/TR	2,8	0,0	0,0	5,6	1,2	0,0	1,7	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	nt 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	int 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	180,17	161,43	180,67	169,13	180,67	165,6	178,75	153,47	720,26	649,63	90,2 %
Analise de Sistema	19,5	32,38	19,5	39,82	19,5	19,6	19,5	30,38	78	122,18	156,6 %
Code Review	15	11,08	15	15,55	15	20,55	15	16,47	60	63,65	106,1 %
Ausencia	0	15,15	0	29,15	0	5,45	0	15,52	0	65,27	0,0 %
Daily Scrum	12	8,92	12	8,85	12	7,75	12	11,27	48	36,79	76,6 %
Sizing	6	10,38	6	3,15	6	4,2	6	9,48	24	27,21	113,4 %
Cafe	7,67	7,42	7,67	6,72	7,67	6,32	7,67	8,65	30,68	29,11	94,9 %
Outros	0,5	4,75	0,5	2,42	0,5	1,57	0,5	6,25	2	14,99	749,5 %
Atestado	0	0	0	0	0	30,78	0	6	0	36,78	0,0 %
Ginastica Laboral	5,67	5,15	5,67	4,8	5,67	4,9	5,67	4,97	22,68	19,82	87,4 %
Reuniao	3	2,33	3	1	3	3,92	3,17	4,83	12,17	12,08	99,3 %
Analise Retorno O.S.	0	1,5	0	1,08	0	0,67	0	4,25	0	7,5	0,0 %
Retrospectiva	8,5	5,42	8,5	3,5	8,5	4,75	8,5	3	34	16,67	49,0 %
Sprint Planning 1	8,5	6,17	8,5	2,5	8,5	5,25	8,5	2,95	34	16,87	49,6 %
Analise de O.S	1,67	0,8	1,67	3,7	1,67	0,62	1,67	2,93	6,68	8,05	120,5 %
Banheiro	1,5	1,25	1,5	1,32	1,5	1,97	1,5	2,38	6	6,92	115,3 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1	5,37	1	0,42	1	5,53	1	2,25	4	13,57	339,2 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	4	9,13	4	1,17	4	14,42	4	2,2	16	26,92	168,2 %
Correção de Erros Interno	2	0,5	2	0	2	0	2	2	8	2,5	31,2 %
Atualizacao de Versao	2,5	2,22	2,5	4,13	2,5	4	2,5	2	10	12,35	123,5 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	1,98	0	1,98	0,0 %
Verificando apontamento	3	3	3	1,68	3	1,6	3	1,55	12	7,83	65,2 %
Correcao de Erros Externo	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	0,5	1,42	2	1,92	96,0 %
Sprint Planning 2	3,5	2	3,5	1	3,5	1,67	3,5	1	14	5,67	40,5 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,75	1	1,75	1	57,1 %
Atividades Gerenciais	1	3,7	1	0	1	0	1	0,75	4	4,45	111,2 %
Treinamento	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0,75	1	0,75	75,0 %
Merge O.S.	0	1,5	0	0,33	0	0	0	0,67	0	2,5	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	1,58	1,25	1,58	1,92	1,58	1,25	1,58	0,58	6,32	5	79,1 %
Geração de Atas	0,25	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1	1,1	110,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %

Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0,0 %
Clean Code	2,58	0,5	2,58	0,33	2,58	0	2,58	0	10,32	0,83	8,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	0,5	0,92	0,5	0	0,5	0	0,5	0	2	0,92	46,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	2,33	0	0,67	0	0	0	3	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,17	0	0,68	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0	1,5	0,0 %
Total Geral	294,01	305,07	294,01	307,75	294,01	313,54	294,01	301,2	1.176,04	1.227,56	104,4 %




% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [50.95%]
- Analise de Sistema [10.09%]
- Code Review [5.47%]
- Ausencia [5.15%]
- Daily Scrum [3.74%]
- Sizing [3.15%]
- Cafe [2.87%]
- Outros [2.08%]
- Atestado [1.99%]
- Ginastica Laboral [1.65%]
- Reuniao [1.6%]
- Analise Retorno O.S. [1.41%]
- Retrospectiva [1%]
- Sprint Planning 1 [0.98%]
- Analise de O.S [0.97%]
- Banheiro [0.79%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.75%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.73%]
- Ocrreção de Erros Interno [0.66%]
- Atualizacao de Versao [0.66%]
- Levantamento de Requisito [0.66%]
- Verificando apontamento [0.51%]
- Correcao de Erros Externo [0.47%]
- Sprint Planning 2 [0.33%]
- Planejamento de Projeto [0.33%]
- Atividades Gerenciais [0.25%]
- Treinamento [0.25%]

- Merge O.S. [0.22%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.19%]
- Geração de Atas [0.08%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	int 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	S	191,83	178,68	192,33	172,97	192,33	186,8	190,42	161,92	766,91	700,37	91,3 %
REQM - Gestao de Requisitos		37,5	52,43	37,5	49,05	37,5	31,38	37,5	50,05	150	182,91	121,9 %
DIV - Diversos*		18,83	40	18,83	44,42	18,83	22,15	19	41,63	75,49	148,2	196,3 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	35,5	25,42	35,5	27,9	35,5	33,05	35,5	30,73	142	117,1	82,5 %
PI - Integracao de Produto		2,5	2,22	2,5	4,13	2,5	4	2,5	2	10	12,35	123,5 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	1,75	1	1,75	1	57,1 %
CM - Gerencia de Configuração		1	0,92	0,5	0	0,5	0	0,5	0	2,5	0,92	36,8 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	2,33	0	0,67	0	0	0	3	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	287,16	299,67	287,16	300,8	287,16	278,05	287,17	287,33	1.148,65	1.165,85	101,5 %




- Desenvolvimento de Requisitos [56.35%]
- Gestao de Requisitos [17.42%]
- Diversos* [14.49%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [10.7%]
- Integracao de Produto [0.7%]
- Planejamento de Projeto [0.35%]

INDICADORES DO PROJETO


	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502
01. Horas planejadas de todas atividades	1852h00m	1739h44m	1619h00m	1712h00m	1488h00m	922h00m	854h00m	1176h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1874h28m	1710h24m	1596h58m	1735h03m	1467h27m	968h44m	924h35m	1227h32m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1483h50m	1381h29m	1285h05m	1376h10m	1175h59m	669h35m	627h10m	887h30m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	1346h36m	1265h23m	1201h02m	1285h16m	1019h42m	630h15m	596h30m	757h47m
05. Pontos planejados para o projeto	364,0	462,0	360,0	385,0	330,0	194,0	180,0	256,0
06. Pontos planejados	357,5	462,0	414,5	463,5	410,5	203,0	242,0	314,0
07. Pontos entregues	415,5	375,5	370	413,5	319,5	183	173,5	228
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	296,00	313,50	280,50	331,00	289,50	150,00	134,00	200,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	119,50	62,00	89,50	82,50	30,00	33,00	39,50	28,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	14	10	6	4	4	6	6	3
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	92	81	80	100	87	52	49	53
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	78	47	75	48	36	23	23	22
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	6	4	2	2	2	2	2	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	1h55m
15. Pontos de retrabalho	6	3,5	1,5	3	11	2,5	4,5	1,5
16. Produtividade planejada	0,241	0,335	0,323	0,337	0,350	0,304	0,386	0,354
17. Produtividade realizada	0,309	0,297	0,309	0,322	0,314	0,291	0,291	0,301
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	114,2	81,3	102,8	107,5	96,9	94,4	96,4	89,1
19. % Pontos NP / Pontos entregues	28,8	16,6	24,2	20	9,4	18,1	22,8	12,3

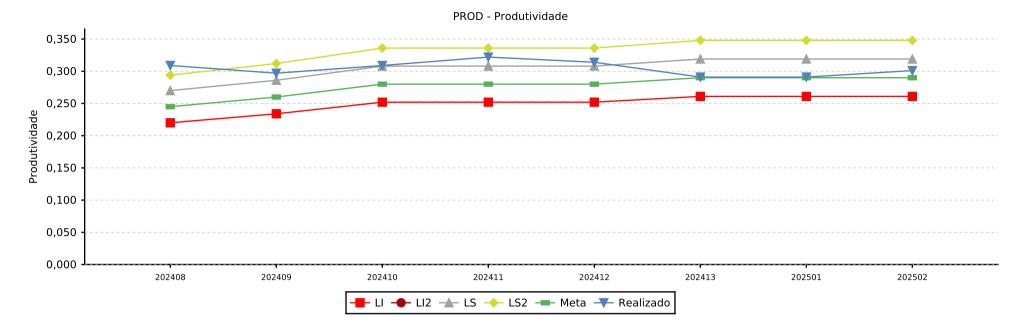


	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502
Realizado	0,309	0,297	0,309	0,322	0,314	0,291	0,291	0,301
Meta	0,245	0,260	0,280	0,280	0,280	0,290	0,290	0,290
LS2	0,294	0,312	0,336	0,336	0,336	0,348	0,348	0,348
LS	0,270	0,286	0,308	0,308	0,308	0,319	0,319	0,319
LI2								
LI	0,220	0,234	0,252	0,252	0,252	0,261	0,261	0,261

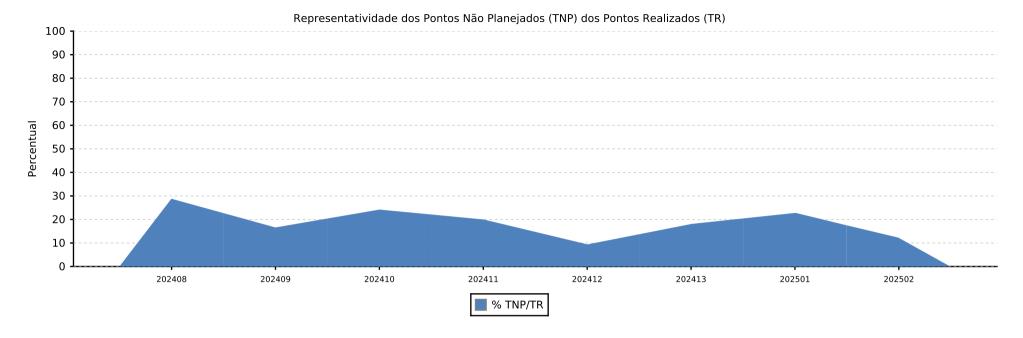


	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502
TR - Pontos Realizados	415.5	375.5	370	413.5	319.5	183	173.5	228
TNP - Pontos Não Planejados	119.5	62	89.5	82.5	30	33	39.5	28
% TNP/TR	28,8	16,6	24,2	20,0	9,4	18,1	22,8	12,3

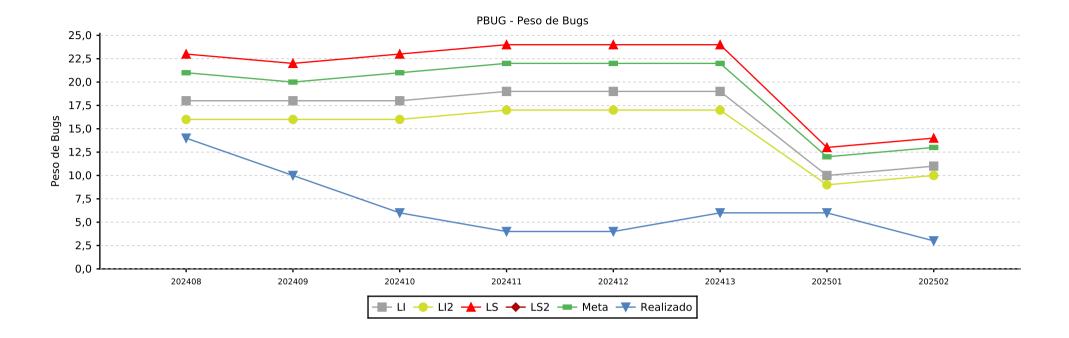


	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502
Realizado	14	10	6	4	4	6	6	3
Meta	21	20	21	22	22	22	12	13
LS2								
LS	23	22	23	24	24	24	13	14
LI2	16	16	16	17	17	17	9	10
LI	18	18	18	19	19	19	10	11
Pontos Entregues	415.5	375.5	370	413.5	319.5	183	173.5	228
% PBUG / TR	3,37	2,67	1,63	0,97	1,26	3,28	3,46	1,32

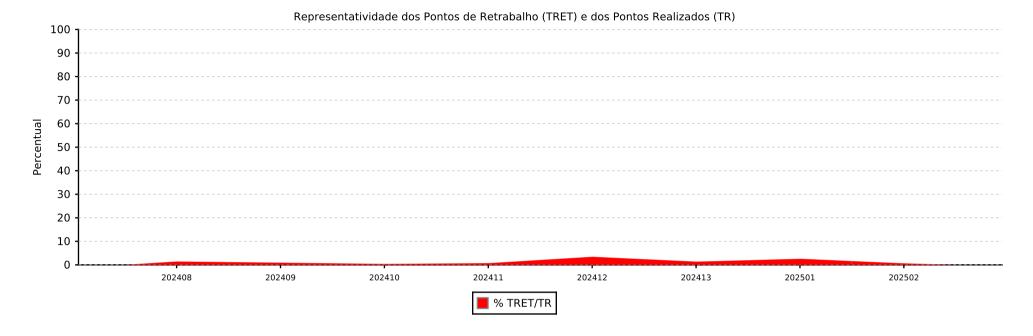

	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502
TR - Pontos Realizados	415.5	375.5	370	413.5	319.5	183	173.5	228
TRET - Pontos de Retrabalho	6	3.5	1.5	3	11	2.5	4.5	1.5
% TRET/TR	1,4	0,9	0,4	0,7	3,4	1,4	2,6	0,7

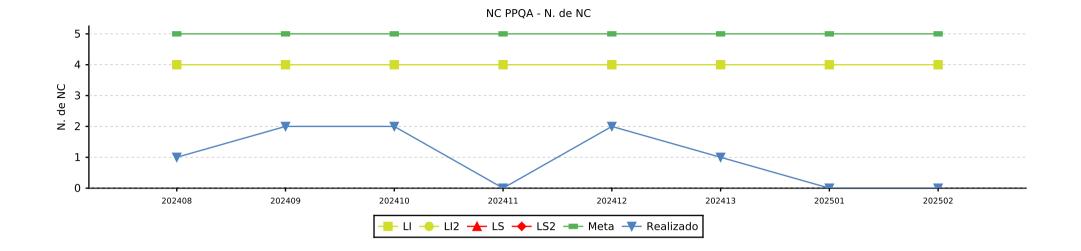

	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502
Realizado	1	2	2	0	2	1	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

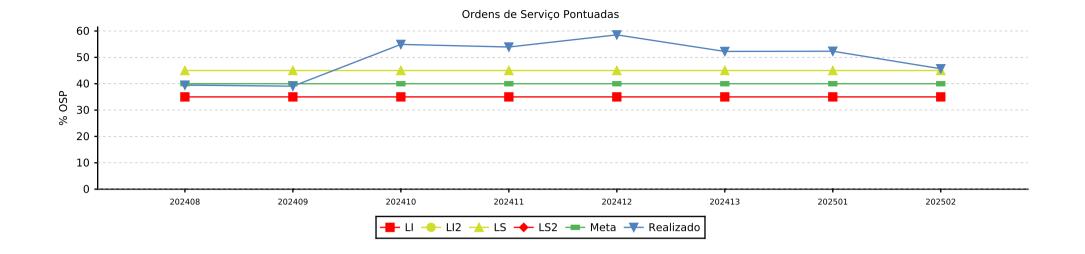


	202408	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502
Realizado	39.47	39.06	54.92	53.93	58.54	52.25	52.34	45.68
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [52.92%]
- Analise de Sistema [9.95%]
- Ausencia [5.32%]
- Code Review [5.19%]
- Daily Scrum [3%]
- Atestado [3%]
- Cafe [2.37%]
- Sizing [2.22%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [2.19%]
- Ginastica Laboral [1.61%]
- Sprint Planning 1 [1.37%]
- Retrospectiva [1.36%]
- Outros [1.22%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.11%]
- Atualizacao de Versao [1.01%]
- Reuniao [0.98%]
- Analise de O.S [0.66%]
- Verificando apontamento [0.64%]
- Analise Retorno O.S. [0.61%]
- Banheiro [0.56%]
- Sprint Planning 2 [0.46%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.41%]
- Atividades Gerenciais [0.36%]
- Curso/Palestra [0.24%]
- Correção de Erros Interno [0.2%]
- Merge O.S. [0.2%]
- Levantamento de Requisito [0.16%]
- Correcao de Erros Externo [0.16%]

- Preparando ambiente [0.12%]
- Geração de Atas [0.09%]
- Planejamento de Projeto [0.08%]
- Compilacao de sistemas [0.07%]
- Clean Code [0.07%]
- Treinamento [0.06%]
- Documentação [0.02%]



- Desenvolvimento de Requisitos [57.06%]
- Gestao de Requisitos [14.9%]
- Diversos* [12.07%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [9.54%]
- Integracao de Produto [1.01%]
- Treinamento na Organizacao [0.24%]
- Planejamento de Projeto [0.08%]
- Gerencia de Configuração [0.07%]
