

INDICADORES DA SPRINT

		202	408			202	409	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	412h00m	460h00m	490h00m	490h00m	404h08m	490h00m	462h00m	383h36m
02. Horas realizadas de todas atividades	404h17m	473h52m	510h22m	485h57m	393h44m	489h54m	441h42m	385h04m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	328h35m	367h45m	393h40m	393h50m	308h03m	393h30m	371h35m	308h21m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	290h18m	358h37m	354h06m	343h35m	296h56m	382h56m	308h58m	276h33m
05. Pontos planejados	91,0	90,5	89,0	87,0	110,5	118,0	126,0	107,5
06. Pontos entregues	89,5	104	133,5	88,5	60,5	120	101,5	96,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	79,50	60,00	86,00	70,50	47,50	96,50	87,50	80,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	10,00	44,00	47,50	18,00	13,00	23,50	14,00	16,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	7	4	3	0	4	6	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	32	21	18	21	11	21	21	27
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	15	22	26	15	12	15	10	11
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	3	2	1	0	2	2	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	1	3,5	1	0,5	0	2	1,5	0
15. Produtividade planejada	0,277	0,247	0,227	0,221	0,359	0,300	0,340	0,349
16. Produtividade realizada	0,309	0,291	0,378	0,258	0,204	0,314	0,329	0,349
17. % Pontos NP / Pontos entregues	11,2	42,4	35,6	20,4	21,5	19,6	13,8	17,1

PROD - Produtividade

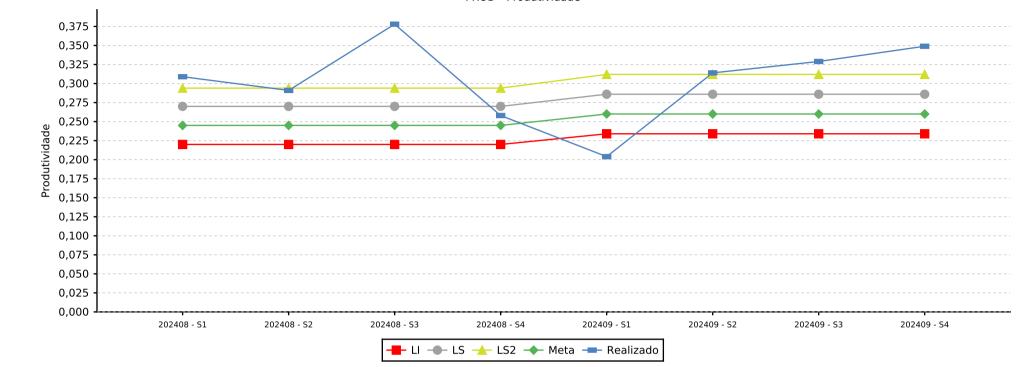


		202	408			202	409	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,309	0,291	0,378	0,258	0,204	0,314	0,329	0,349
Meta	0,245	0,245	0,245	0,245	0,260	0,260	0,260	0,260
LS2	0,294	0,294	0,294	0,294	0,312	0,312	0,312	0,312
LS	0,270	0,270	0,270	0,270	0,286	0,286	0,286	0,286
LI	0,220	0,220	0,220	0,220	0,234	0,234	0,234	0,234

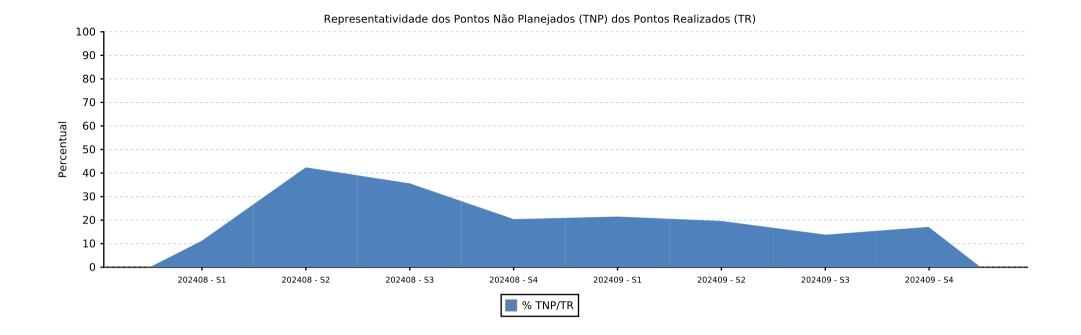


		202	408			202	409	
	1	1 2 3 4				2	3	4
TR - Pontos Realizados	89.5	104	133.5	88.5	60.5	120	101.5	96.5
TNP - Pontos Não Planejados	10	44	47.5	18	13	23.5	14	16.5
% TNP/TR	11,2	42,4	35,6	20,4	21,5	19,6	13,8	17,1

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

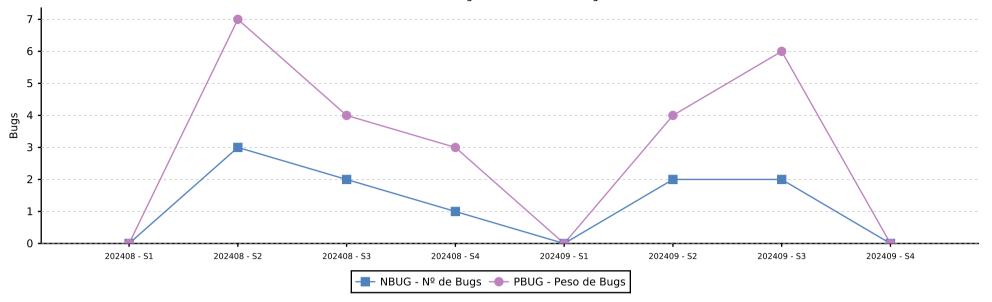

		202	408			202	409	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	3	2	1	0	2	2	0
PBUG - Peso de Bugs	0	7	4	3	0	4	6	0
Pontos Entregues	89.5	104	133.5	88.5	60.5	120	101.5	96.5
% PBUG / TR	0,00	6,74	3,00	3,39	0,00	3,34	5,92	0,00

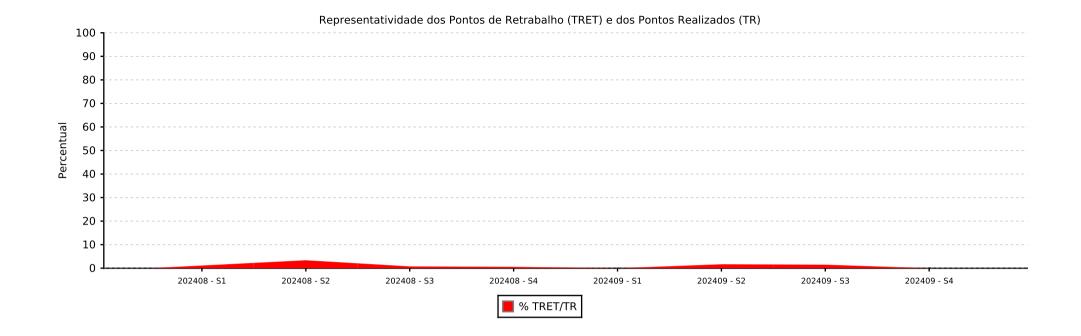


		202	408			202	409	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	89.5	104	133.5	88.5	60.5	120	101.5	96.5
TRET - Pontos de Retrabalho	1	3.5	1	0.5	0	2	1.5	0
% TRET/TR	1,1	3,4	0,7	0,6	0,0	1,7	1,5	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spr	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	242,52	246,28	319,25	322,97	302,83	249,23	245,82	224,45	1.110,42	1.042,93	93,9 %
Analise de Sistema	19	29,47	21,5	30,82	20	29,18	14,33	19,65	74,83	109,12	145,8 %
Code Review	19	11,05	21	29,1	18	9,92	16	18,38	74	68,45	92,5 %
Feriado	8,5	8	0	0	0	0	0	16	8,5	24	282,4 %
Retrospectiva	17,33	17	17,33	14,45	17,33	15,58	15,83	15,07	67,82	62,1	91,6 %
Daily Scrum	13,2	12,37	17,25	22,03	16,25	10,47	13,78	14,87	60,48	59,74	98,8 %
Cafe	11,5	10,3	13,75	13,3	13	12,37	11,75	12,52	50	48,49	97,0 %
Ausencia	0,5	3,48	0,5	4,02	0,5	8,75	0,5	9,55	2	25,8	1.290,0
Sprint Planning 1	18	6,58	18	8	18	14,55	16,5	8,17	70,5	37,3	52,9 %
Sizing	6	2,17	6	5,28	6	0,42	6	7,42	24	15,29	63,7 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,5	6,77	0,5	4,27	0,5	2,62	0,5	6,32	2	19,98	999,0 %
Ginastica Laboral	7,17	5,58	8,67	7,35	8,17	6,65	6,83	5,53	30,84	25,11	81,4 %
Sprint Planning 2	6	2,5	10,5	3,17	6	5,5	5,5	5,15	28	16,32	58,3 %
Reuniao	2	4,17	2	1	2,67	4,75	2	4,97	8,67	14,89	171,7 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	5,33	3,72	5,33	2,35	4,83	8,37	3,42	3,87	18,91	18,31	96,8 %
Verificando apontamento	6,92	3,75	7,58	3,98	7,08	3,17	5,58	3,73	27,16	14,63	53,9 %
Banheiro	0	1,7	0	2,33	0	2,52	0	2,62	0	9,17	0,0 %
Analise de O.S	2,33	1,62	2,33	1,78	2,33	2,25	1,67	2,05	8,66	7,7	88,9 %
Correção de Erros Interno	2,17	1,7	2,17	1,7	2,17	0,45	1,67	1,38	8,18	5,23	63,9 %
Outros	1	4,22	1	0,78	1	0,6	1	1,25	4	6,85	171,2 %
Atualizacao de Versao	2	1,98	2,5	4,77	2,5	3,35	2,5	0,58	9,5	10,68	112,4 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0,33	0	0,5	2	0,5	2	1,33	66,5 %
Analise Retorno O.S.	0,33	0,75	0,33	0,32	0,33	0,55	0,33	0,33	1,32	1,95	147,7 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	3,53	1	2,35	1	8,22	1	0,28	4	14,38	359,5 %
Geração de Atas	0,25	0,33	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,23	1	1,06	106,0 %
Atividades Gerenciais	1,25	2,57	1,25	0,28	1,25	0,78	1,25	0,13	5	3,76	75,2 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0,07	0	0,07	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	0,33	0	0,33	0	0,33	0	0	0	0,99	0	0,0 %


Organização sala / equipamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste		2	0	2	0	2	0	2	0	8	0	0,0 %
Treinamento		0,25	0	0,25	0,38	0,25	0	0,25	0	1	0,38	38,0 %
Manutenção de Servidores		0	0	0	0,67	0	0,75	0	0	0	1,42	0,0 %
Recursos Humanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review		0	0,17	0	0	0	0	0	0	0	0,17	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes		0,58	0	0,58	0	0,58	0	0,25	0	1,99	0	0,0 %
Abrir o.s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo		1,67	0	1,67	0	1,67	0	1,25	0	6,26	0	0,0 %
Particular		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação		0,5	0,23	0,5	0	0,5	0	0,5	0	2	0,23	11,5 %
Gerenciamento de Rede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente		0,33	0	0,33	0,53	0,33	0	0,33	0	1,32	0,53	40,2 %
Folga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado		0	0	0	0,75	0	34	0	0	0	34,75	0,0 %
Clean Code		4,17	1,75	4,33	0,58	4,33	5,97	3	0	15,83	8,3	52,4 %
Teste Automatizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	404,13	393,74	489,98	489,89	461,98	441,72	383,59	385,07	1.739,68	1.710,42	98,3 %

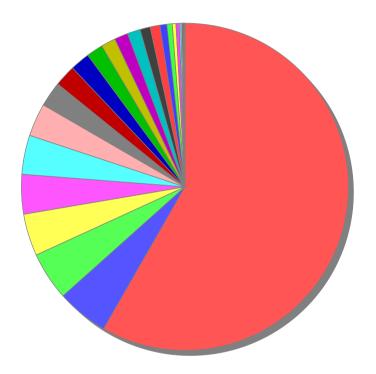

- Desenvolvimento [58.29%]
- Analise de Sistema [5.1%]
- Code Review [4.77%]
- Feriado [4.16%]
- Retrospectiva [3.91%]
- Daily Scrum [3.86%]
- Cafe [3.25%]
- Ausencia [2.48%]
- Sprint Planning 1 [2.12%]
- Sizing [1.93%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.64%]
- Ginastica Laboral [1.44%]
- Sprint Planning 2 [1.34%]
- Reuniao [1.29%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.01%]
- Verificando apontamento [0.97%]
- Banheiro [0.68%]
- Analise de O.S [0.53%]
- Ocrreção de Erros Interno [0.36%]
- Outros [0.32%]
- Atualizacao de Versao [0.15%]
- Planejamento de Projeto [0.13%]
- Analise Retorno O.S. [0.09%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.07%]
- Geração de Atas [0.06%]
- Atividades Gerenciais [0.03%]
- Verificar o.s no nome [0.02%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	nt 3	Spri	nt 4	To	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	S	258,93	260,22	335,83	331,87	318,92	266,63	257,9	236,02	1.171,58	1.094,74	93,4 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	49,53	40,42	55,58	65,58	51,58	35,97	45,62	48,32	202,31	190,29	94,1 %
REQM - Gestao de Requisitos		49,67	41,47	56,67	48,12	50,67	50,2	43	40,72	200,01	180,51	90,3 %
DIV - Diversos*		24,42	33,85	28,17	29,08	27,58	42,12	24,33	34,23	104,5	139,28	133,3 %
PI - Integracao de Produto		2	1,98	2,5	4,77	2,5	3,35	2,5	0,58	9,5	10,68	112,4 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0,33	0	0,5	2	0,5	2	1,33	66,5 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		0,83	0	0,33	0	0,33	0	0	0	1,49	0	0,0 %
	Total Geral	385,38	377,94	479,08	479,75	451,58	398,77	375,35	360,37	1.691,39	1.616,83	95,6 %

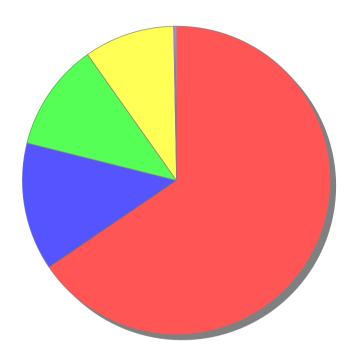


- Desenvolvimento de Requisitos [65.49%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [13.41%]
- Gestao de Requisitos [11.3%]
- Oiversos* [9.5%]
- Integracao de Produto [0.16%]
- O Planejamento de Projeto [0.14%]

INDICADORES DO PROJETO


	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409
01. Horas planejadas de todas atividades	1416h00m	1376h00m	1543h12m	1455h00m	1534h00m	1409h00m	1852h00m	1739h44m
02. Horas realizadas de todas atividades	1483h22m	1479h18m	1607h11m	1619h36m	1608h45m	1556h47m	1874h28m	1710h24m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1116h50m	1057h40m	1229h08m	1130h30m	1193h00m	1094h00m	1483h50m	1381h29m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	1101h33m	1003h37m	1134h08m	1022h38m	1104h55m	1014h08m	1346h36m	1265h23m
05. Pontos planejados para o projeto	327,0	312,0	348,0	316,0	334,0	304,0	364,0	0,0
06. Pontos planejados	297,5	316,5	296,5	242,0	302,0	245,0	357,5	462,0
07. Pontos entregues	344	293,5	328,5	288,5	335,5	295,5	415,5	378,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	257,50	222,00	270,50	239,00	249,00	207,50	296,00	311,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	86,50	71,50	58,00	49,50	86,50	88,00	119,50	67,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	4	0	5	3	12	13	14	10
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	67	84	107	106	98	68	92	80
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	71	57	43	32	50	72	78	48
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	2	0	3	3	5	9	6	4
14. Horas de correção de bug	0h00m							
15. Pontos de retrabalho	0,5	2,5	3,5	3	4	5	6	3,5
16. Produtividade planejada	0,267	0,300	0,242	0,215	0,254	0,224	0,241	0,335
17. Produtividade realizada	0,313	0,293	0,290	0,283	0,304	0,292	0,309	0,300
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	105,2	94,1	94,4	91,3	100,5	97,3	114,2	0
19. % Pontos NP / Pontos entregues	25,2	24,4	17,7	17,2	25,8	29,8	28,8	17,8

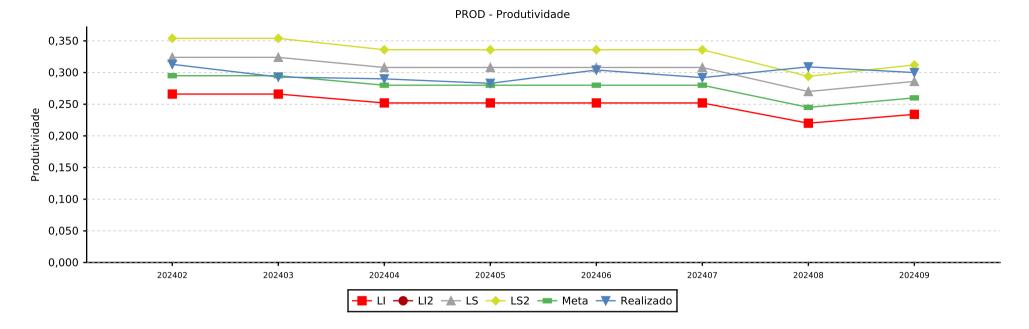


	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409
Realizado	0,313	0,293	0,290	0,283	0,304	0,292	0,309	0,300
Meta	0,295	0,295	0,280	0,280	0,280	0,280	0,245	0,260
LS2	0,354	0,354	0,336	0,336	0,336	0,336	0,294	0,312
LS	0,324	0,324	0,308	0,308	0,308	0,308	0,270	0,286
LI2								
LI	0,266	0,266	0,252	0,252	0,252	0,252	0,220	0,234

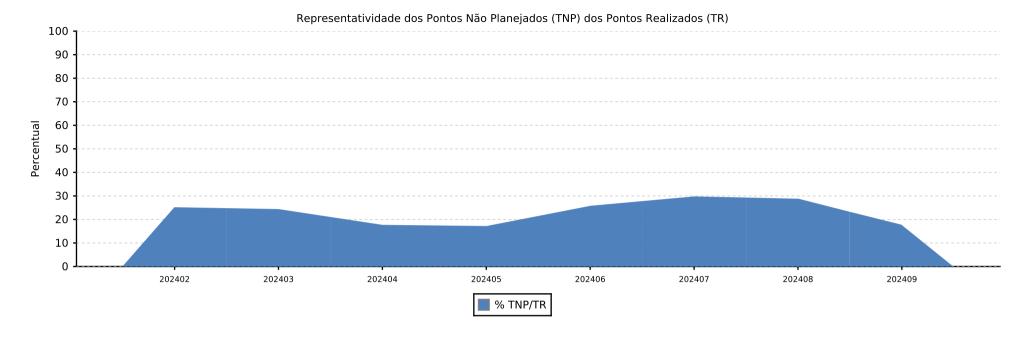


	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409
TR - Pontos Realizados	344	293.5	328.5	288.5	335.5	295.5	415.5	378.5
TNP - Pontos Não Planejados	86.5	71.5	58	49.5	86.5	88	119.5	67
% TNP/TR	25,2	24,4	17,7	17,2	25,8	29,8	28,8	17,8

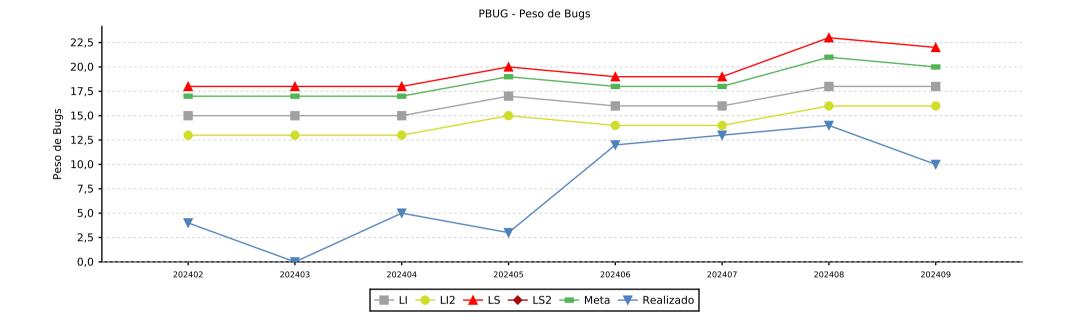


	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409
Realizado	4	0	5	3	12	13	14	10
Meta	17	17	17	19	18	18	21	20
LS2								
LS	18	18	18	20	19	19	23	22
LI2	13	13	13	15	14	14	16	16
LI	15	15	15	17	16	16	18	18
Pontos Entregues	344	293.5	328.5	288.5	335.5	295.5	415.5	378.5
% PBUG / TR	1,17	0,00	1,53	1,04	3,58	4,40	3,37	2,65



	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409
TR - Pontos Realizados	344	293.5	328.5	288.5	335.5	295.5	415.5	378.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	2.5	3.5	3	4	5	6	3.5
% TRET/TR	0,1	0,9	1,1	1,0	1,2	1,7	1,4	0,9

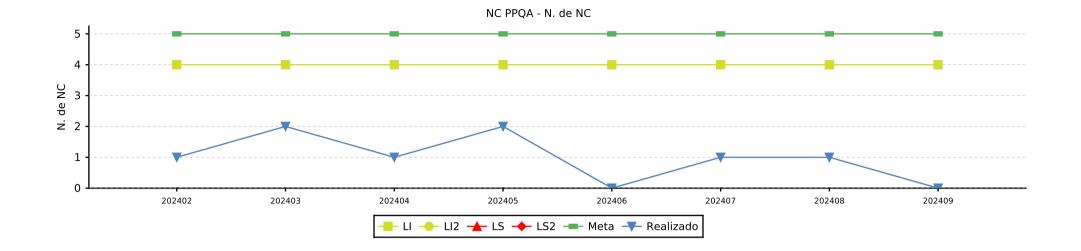

	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409
Realizado	1	2	1	2	0	1	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

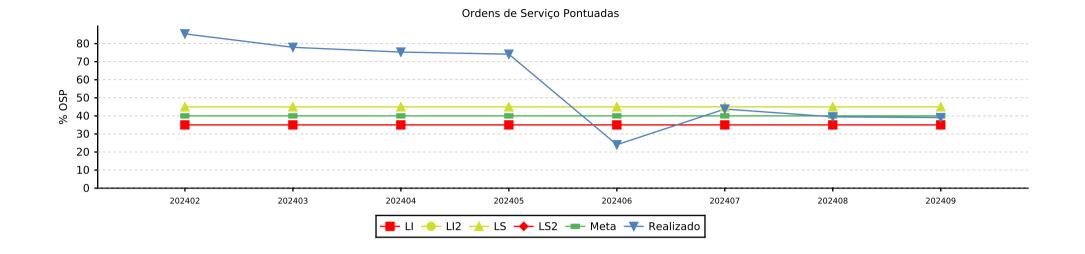


	202402	202403	202404	202405	202406	202407	202408	202409
Realizado	85.4	77.95	75.33	74.16	24.03	43.77	39.47	39.06
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [60.98%]
- Analise de Sistema [6.38%]
- Code Review [4%]
- Retrospectiva [3.63%]
- Daily Scrum [3.49%]
- Cafe [2.83%]
- Sprint Planning 1 [2.18%]
- Atestado [2.03%]
- Ausencia [1.51%]
- Ginastica Laboral [1.47%]
- Feriado [1.4%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.17%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.07%]
- Sprint Planning 2 [0.95%]
- Sizing [0.89%]
- Reuniao [0.87%]
- Verificando apontamento [0.86%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.84%]
- Atualizacao de Versao [0.62%]
- Banheiro [0.54%]
- Clean Code [0.49%]
- Analise de O.S [0.45%]
- Outros [0.4%]
- Correção de Erros Interno [0.31%]
- Atividades Gerenciais [0.22%]
- Analise Retorno O.S. [0.11%]
- Manutenção de Servidores [0.08%]
- Planejamento de Projeto [0.08%]

- Geração de Atas [0.06%]
- Preparando ambiente [0.03%]
- Treinamento [0.02%]
- O Documentação [0.01%]
- Auxilio Review [0.01%]
- Verificar o.s no nome [0%]

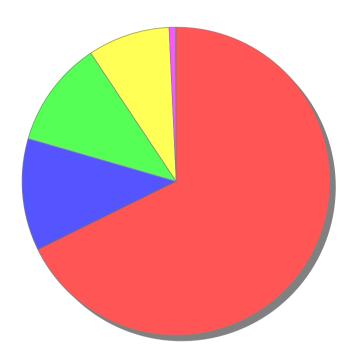

- Desenvolvimento de Requisitos [64%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [11.12%]
- Gestao de Requisitos [10.55%]
- Diversos* [8.14%]
- Integracao de Produto [0.62%]
- Planejamento de Projeto [0.08%]
