

INDICADORES DA SPRINT

| | | 202 | 407 | | | 202 | 408 | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01. Horas planejadas de todas atividades | 358h00m | 343h00m | 350h00m | 358h00m | 412h00m | 460h00m | 490h00m | 490h00m |
| 02. Horas realizadas de todas atividades | 381h28m | 382h42m | 384h04m | 408h33m | 404h17m | 473h52m | 510h22m | 486h52m |
| 03. Horas planejadas de desenvolvimento | 279h00m | 265h45m | 270h25m | 278h50m | 328h35m | 367h45m | 393h40m | 393h50m |
| 04. Horas realizadas de desenvolvimento | 250h39m | 245h54m | 260h17m | 257h18m | 290h18m | 358h37m | 354h06m | 343h35m |
| 05. Pontos planejados | 64,0 | 53,5 | 50,5 | 77,0 | 91,0 | 90,5 | 89,0 | 87,0 |
| 06. Pontos entregues | 65 | 79,5 | 52,5 | 98,5 | 89,5 | 104 | 133,5 | 88,5 |
| 07. Pontos entregues (apenas Tarefa) | 42,00 | 50,00 | 45,50 | 70,00 | 79,50 | 60,00 | 86,00 | 70,50 |
| 08. Pontos entregues (apenas NP) | 23,00 | 29,50 | 7,00 | 28,50 | 10,00 | 44,00 | 47,50 | 18,00 |
| 09. Pontos entregues (apenas Erro) | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa) | 19 | 16 | 14 | 19 | 32 | 21 | 18 | 21 |
| 11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP) | 14 | 23 | 9 | 26 | 15 | 22 | 26 | 15 |
| 12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro) | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 13. Horas de correção de bug | 0h00m |
| 14. Pontos de retrabalho | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3,5 | 1 | 0,5 |
| 15. Produtividade planejada | 0,230 | 0,202 | 0,187 | 0,277 | 0,277 | 0,247 | 0,227 | 0,221 |
| 16. Produtividade realizada | 0,260 | 0,324 | 0,202 | 0,383 | 0,309 | 0,291 | 0,378 | 0,258 |
| 17. % Pontos NP / Pontos entregues | 35,4 | 37,2 | 13,4 | 29 | 11,2 | 42,4 | 35,6 | 20,4 |

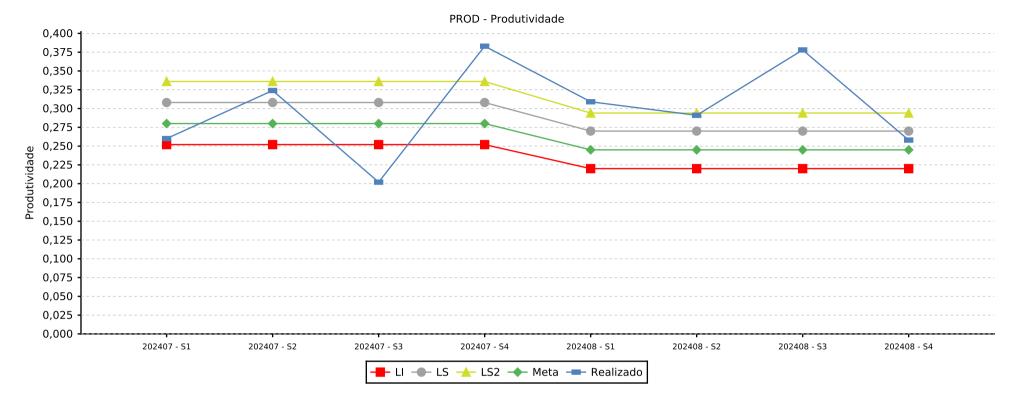


| | | 202 | 407 | | 202408 | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Realizado | 0,260 | 0,324 | 0,202 | 0,383 | 0,309 | 0,291 | 0,378 | 0,258 | | |
| Meta | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | 0,245 | | |
| LS2 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,294 | | |
| LS | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | | |
| LI | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | | |

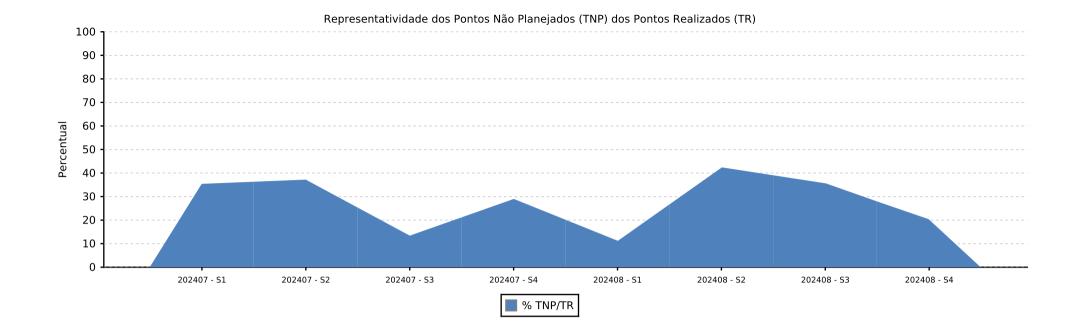


| | | 202 | 407 | | | 202 | 408 | |
|-----------------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------|------|
| | 1 | 1 2 3 4 1 2 | | | | | 3 | 4 |
| TR - Pontos Realizados | 65 | 79.5 | 52.5 | 98.5 | 89.5 | 104 | 133.5 | 88.5 |
| TNP - Pontos Não Planejados | 23 | 29.5 | 7 | 28.5 | 10 | 44 | 47.5 | 18 |
| % TNP/TR | 35,4 | 37,2 | 13,4 | 29,0 | 11,2 | 42,4 | 35,6 | 20,4 |

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

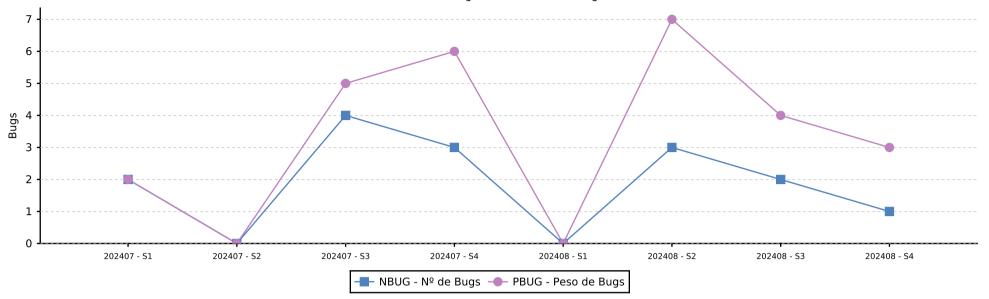

| | | 202 | 407 | | 202408 | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|--------|------|-------|------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| NBUG - Nº de Bugs | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| PBUG - Peso de Bugs | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
| Pontos Entregues | 65 | 79.5 | 52.5 | 98.5 | 89.5 | 104 | 133.5 | 88.5 | |
| % PBUG / TR | 3,08 | 0,00 | 9,53 | 6,10 | 0,00 | 6,74 | 3,00 | 3,39 | |

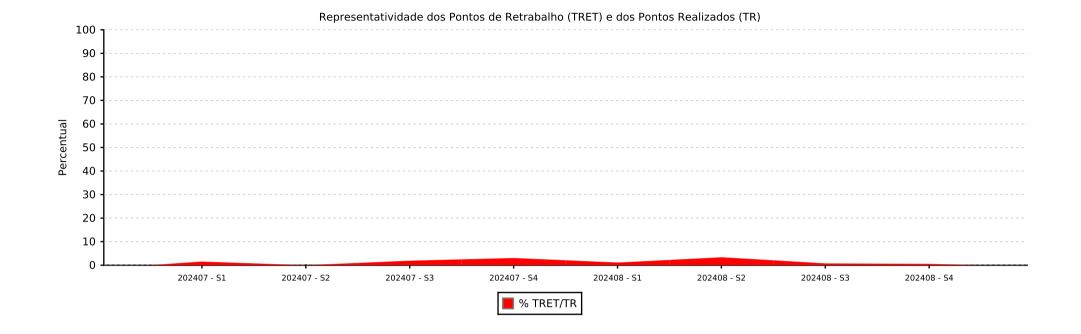


| | | 202 | 407 | | | 202 | 408 | |
|-----------------------------|-----|------|------|------|------|-----|-------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TR - Pontos Realizados | 65 | 79.5 | 52.5 | 98.5 | 89.5 | 104 | 133.5 | 88.5 |
| TRET - Pontos de Retrabalho | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.5 | 1 | 0.5 |
| % TRET/TR | 1,5 | 0,0 | 1,9 | 3,0 | 1,1 | 3,4 | 0,7 | 0,6 |

HORAS POR ATIVIDADE

| | Spri | int 1 | Spri | int 2 | Spri | nt 3 | Spri | nt 4 | То | tal | % HP/HR |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Atividade | Planejado | Realizado | Total |
| Desenvolvimento | 272,25 | 233,67 | 301,92 | 307,02 | 326,92 | 288,22 | 324,58 | 294,05 | 1.225,67 | 1.122,96 | 91,6 % |
| Analise de Sistema | 18,08 | 34,1 | 19,25 | 26,8 | 20,75 | 61,03 | 20,75 | 55,37 | 78,83 | 177,3 | 224,9 % |
| Code Review | 16 | 20,67 | 21 | 24,77 | 21 | 19,85 | 21 | 15,45 | 79 | 80,74 | 102,2 % |
| Retrospectiva | 12 | 17 | 13,17 | 9,22 | 14,33 | 14,92 | 14,33 | 15,08 | 53,83 | 56,22 | 104,4 % |
| Cafe | 12,25 | 9,75 | 13,75 | 14 | 13,75 | 12,55 | 13,75 | 13,32 | 53,5 | 49,62 | 92,7 % |
| Ausencia | 0,5 | 10,53 | 0,5 | 12,25 | 0,5 | 10,88 | 0,5 | 12,13 | 2 | 45,79 | 2.289,5 |
| Reuniao | 2,67 | 5,62 | 2 | 4,2 | 2,67 | 8,22 | 2,5 | 9,77 | 9,84 | 27,81 | 282,6 % |
| Daily Scrum | 14 | 7,13 | 15,33 | 10,65 | 17 | 17,47 | 17 | 9 | 63,33 | 44,25 | 69,9 % |
| Auxilio ao Desenvolvimento | 1 | 10,32 | 1 | 5,32 | 1 | 13,45 | 1 | 8,97 | 4 | 38,06 | 951,5 % |
| Ginastica Laboral | 7,17 | 5,32 | 8,17 | 6,53 | 9 | 7,33 | 9 | 7,5 | 33,34 | 26,68 | 80,0 % |
| Sizing | 6 | 3,27 | 6 | 0 | 6 | 8,4 | 6 | 7,18 | 24 | 18,85 | 78,5 % |
| Analise de O.S | 2,33 | 3,4 | 2,33 | 5,65 | 2,33 | 5,05 | 2,33 | 7,15 | 9,32 | 21,25 | 228,0 % |
| Verificando apontamento | 6,92 | 3,72 | 7,42 | 2,98 | 8,25 | 4,78 | 8,25 | 5,6 | 30,84 | 17,08 | 55,4 % |
| Sprint Planning 1 | 15 | 12 | 16,5 | 15,25 | 18 | 9,47 | 18 | 4,92 | 67,5 | 41,64 | 61,7 % |
| Atualizacao de Versao | 2,5 | 5,58 | 2,5 | 5,67 | 2,5 | 6,25 | 2,5 | 4,58 | 10 | 22,08 | 220,8 % |
| Criacao de Ambiente de Desenv. | 3,92 | 8,45 | 4,25 | 4,83 | 4,5 | 6,97 | 4,5 | 2,12 | 17,17 | 22,37 | 130,3 % |
| Outros | 1 | 1,67 | 1 | 3,15 | 1 | 6,27 | 1 | 1,75 | 4 | 12,84 | 321,0 % |
| Sprint Planning 2 | 5 | 3,75 | 10 | 4 | 6 | 3,42 | 6 | 1,75 | 27 | 12,92 | 47,9 % |
| Correção de Erros Interno | 1,92 | 0 | 2,17 | 0 | 2,17 | 0 | 2,17 | 1,75 | 8,43 | 1,75 | 20,8 % |
| Treinamento | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,08 | 0,25 | 1,5 | 0,25 | 1,68 | 1 | 3,26 | 326,0 % |
| Planejamento de Projeto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1,65 | 2,5 | 1,65 | 66,0 % |
| Banheiro | 0 | 0,08 | 0 | 0,75 | 0 | 1,15 | 0 | 1,5 | 0 | 3,48 | 0,0 % |
| Auxilio ao Suporte e Implantacao | 1 | 0,6 | 1 | 1,95 | 1 | 0 | 1 | 1,08 | 4 | 3,63 | 90,8 % |
| Clean Code | 3 | 0,52 | 3,5 | 0,33 | 3,83 | 0,92 | 3,83 | 1 | 14,16 | 2,77 | 19,6 % |
| Atividades Gerenciais | 1 | 4,7 | 1 | 1,33 | 1 | 0,98 | 1 | 0,93 | 4 | 7,94 | 198,5 % |
| Manutenção de Servidores | 0 | 0,33 | 0 | 1,17 | 0 | 0 | 0 | 0,83 | 0 | 2,33 | 0,0 % |
| Geração de Atas | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,5 | 1 | 0,5 | 50,0 % |
| Compilacao de sistemas | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,17 | 1,32 | 0,17 | 12,9 % |
| Analise Retorno O.S. | 0,33 | 0 | 0,33 | 1,75 | 0,33 | 0,67 | 0,33 | 0,08 | 1,32 | 2,5 | 189,4 % |
| Teste Automatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Zabbix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auditoria da Garantia da Qualidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Férias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Manutenção Preventiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |

| Release Notes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
|---------------------------------------|------------|------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|---------|
| Atraso / Saida antecipada | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Levantamento de Requisito | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Feriado | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Organização sala / equipamento | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Teste | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0,0 % |
| Recursos Humanos | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Integrações de sistemas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Geracao de Baseline | | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,0 % |
| Atividade Externa | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio suporte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Análise de Sistemas H/FW | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Instrutor Treinamento | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atendimento GBS | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Fazendo manual | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Curso/Palestra | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio Review | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auditoria de Gerencia de Configuracao | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxílio Desenv. Outras Equipes | | 0,58 | 0,92 | 0,58 | 0 | 0,58 | 0 | 0,58 | 0 | 2,32 | 0,92 | 39,7 % |
| Abrir o.s | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Particular | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio Comercial / Backoffice | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Solicitar merge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Correcao de Erros Externo | | 1,42 | 0 | 1,67 | 0 | 1,92 | 0 | 1,92 | 0 | 6,93 | 0 | 0,0 % |
| Check List | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Merge O.S. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auditoria de DD | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Pre-teste | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Verificar o.s no nome | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Documentação | | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,28 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 0,28 | 14,0 % |
| Gerenciamento de Rede | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Preparando ambiente | | 0,33 | 1,2 | 0,33 | 3,93 | 0,33 | 0,63 | 0,33 | 0 | 1,32 | 5,76 | 436,4 % |
| Folga | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Checklist dos Backups | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atendimento | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Recesso | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atestado | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| To | otal Geral | 412 | 404,3 | 460 | 473,86 | 489,99 | 510,38 | 489,98 | 486,86 | 1.851,97 | 1.875,4 | 101,3 % |




% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [60.4%]
- Analise de Sistema [11.37%]
- Code Review [3.17%]
- Retrospectiva [3.1%]
- Cafe [2.74%]
- Ausencia [2.49%]
- Reuniao [2.01%]
- Daily Scrum [1.85%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.84%]
- Ginastica Laboral [1.54%]
- Sizing [1.47%]
- Analise de O.S [1.47%]
- Verificando apontamento [1.15%]
- Sprint Planning 1 [1.01%]
- Atualizacao de Versao [0.94%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.44%]
- Outros [0.36%]
- Sprint Planning 2 [0.36%]
- O Correção de Erros Interno [0.36%]
- Treinamento [0.35%]
- Planejamento de Projeto [0.34%]
- Banheiro [0.31%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.22%]
- Clean Code [0.21%]
- Atividades Gerenciais [0.19%]
- Manutenção de Servidores [0.17%]
- Geração de Atas [0.1%]

- Compilação de sistemas [0.03%]
- Analise Retorno O.S. [0.02%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


| | | Spri | nt 1 | Spri | nt 2 | Spri | int 3 | Spri | nt 4 | То | tal | % HP/HR |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Area CMMI | | Planejado | Realizado | Total |
| RD - Desenvolvimento de Requisitos | 3 | 286,08 | 253,87 | 317,08 | 317,5 | 342,92 | 309,55 | 340,58 | 307,88 | 1.286,66 | 1.188,8 | 92,4 % |
| REQM - Gestao de Requisitos | | 44,75 | 54,32 | 52,42 | 51,73 | 51,42 | 83,62 | 51,42 | 69,3 | 200,01 | 258,97 | 129,5 % |
| DIV - Diversos* | | 25,58 | 38,18 | 27,42 | 43,42 | 28,92 | 46,23 | 28,75 | 46,48 | 110,67 | 174,31 | 157,5 % |
| PMC - Monitoramento e Controle de | Projeto | 42 | 44,8 | 49,5 | 44,63 | 52,33 | 52,23 | 52,33 | 39,53 | 196,16 | 181,19 | 92,4 % |
| PI - Integracao de Produto | | 2,5 | 5,58 | 2,5 | 5,67 | 2,5 | 6,25 | 2,5 | 4,58 | 10 | 22,08 | 220,8 % |
| PP - Planejamento de Projeto | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1,65 | 2,5 | 1,65 | 66,0 % |
| CM - Gerencia de Configuração | | 0,83 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0 | 0,33 | 0,17 | 1,82 | 0,17 | 9,3 % |
| OT - Treinamento na Organizacao | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| PPQA - Garantia da Qualidade de P | rocesso e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| | Total Geral | 401,74 | 396,75 | 449,25 | 462,95 | 478,42 | 497,88 | 478,41 | 469,59 | 1.807,82 | 1.827,17 | 101,1 % |

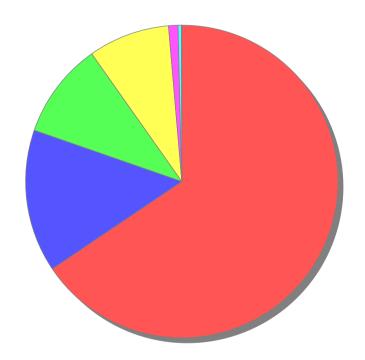


- Desenvolvimento de Requisitos [65.56%]
- Gestao de Requisitos [14.76%]
- Diversos* [9.9%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [8.42%]
- Integracao de Produto [0.98%]
- Planejamento de Projeto [0.35%]
- Gerencia de Configuracao [0.04%]

INDICADORES DO PROJETO

| | 202401 | 202402 | 202403 | 202404 | 202405 | 202406 | 202407 | 202408 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 01. Horas planejadas de todas atividades | 1451h12m | 1416h00m | 1376h00m | 1543h12m | 1455h00m | 1534h00m | 1409h00m | 1852h00m |
| 02. Horas realizadas de todas atividades | 1563h21m | 1483h22m | 1479h18m | 1607h11m | 1619h36m | 1608h45m | 1556h47m | 1875h23m |
| 03. Horas planejadas de desenvolvimento | 1172h42m | 1116h50m | 1057h40m | 1229h08m | 1130h30m | 1193h00m | 1094h00m | 1483h50m |
| 04. Horas realizadas de desenvolvimento | 1063h55m | 1101h33m | 1003h37m | 1134h08m | 1022h38m | 1104h55m | 1014h08m | 1346h36m |
| 05. Pontos planejados para o projeto | 339,5 | 327,0 | 312,0 | 348,0 | 316,0 | 334,0 | 304,0 | 364,0 |
| 06. Pontos planejados | 282,0 | 297,5 | 316,5 | 296,5 | 242,0 | 302,0 | 245,0 | 357,5 |
| 07. Pontos entregues | 338 | 344 | 293,5 | 328,5 | 288,5 | 335,5 | 295,5 | 415,5 |
| 08. Pontos entregues (apenas Tarefa) | 261,00 | 257,50 | 222,00 | 270,50 | 239,00 | 249,00 | 207,50 | 296,00 |
| 09. Pontos entregues (apenas NP) | 77,00 | 86,50 | 71,50 | 58,00 | 49,50 | 86,50 | 88,00 | 119,50 |
| 10. Pontos entregues (apenas Erro) | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 | 13 | 14 |
| 11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa) | 74 | 67 | 84 | 107 | 106 | 98 | 68 | 92 |
| 12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP) | 64 | 71 | 57 | 43 | 32 | 50 | 72 | 78 |
| 13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro) | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 |
| 14. Horas de correção de bug | 0h00m |
| 15. Pontos de retrabalho | 2,5 | 0,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. Produtividade planejada | 0,241 | 0,267 | 0,300 | 0,242 | 0,215 | 0,254 | 0,224 | 0,241 |
| 17. Produtividade realizada | 0,318 | 0,313 | 0,293 | 0,290 | 0,283 | 0,304 | 0,292 | 0,309 |
| 18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto | 99,6 | 105,2 | 94,1 | 94,4 | 91,3 | 100,5 | 97,3 | 114,2 |
| 19. % Pontos NP / Pontos entregues | 22,8 | 25,2 | 24,4 | 17,7 | 17,2 | 25,8 | 29,8 | 28,8 |

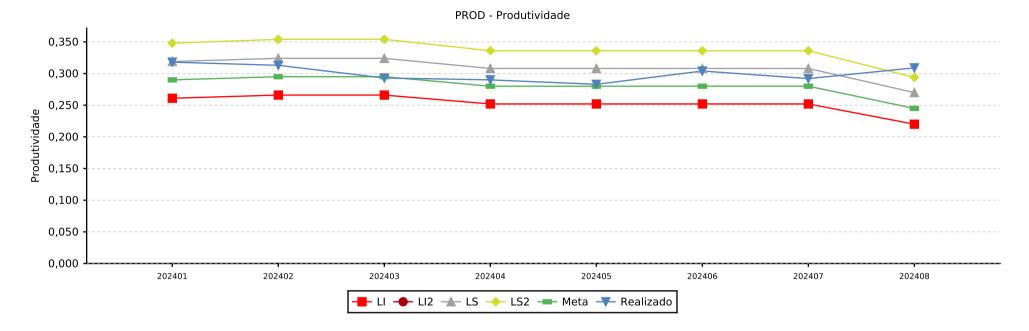


| | 202401 | 202402 | 202403 | 202404 | 202405 | 202406 | 202407 | 202408 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 0,318 | 0,313 | 0,293 | 0,290 | 0,283 | 0,304 | 0,292 | 0,309 |
| Meta | 0,290 | 0,295 | 0,295 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,245 |
| LS2 | 0,348 | 0,354 | 0,354 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,294 |
| LS | 0,319 | 0,324 | 0,324 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,270 |
| LI2 | | | | | | | | |
| LI | 0,261 | 0,266 | 0,266 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,252 | 0,220 |

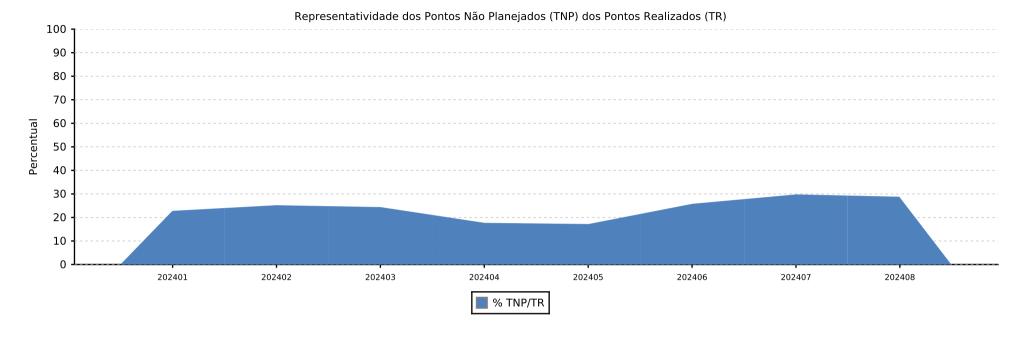


| | 202401 | 202402 | 202403 | 202404 | 202405 | 202406 | 202407 | 202408 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TR - Pontos Realizados | 338 | 344 | 293.5 | 328.5 | 288.5 | 335.5 | 295.5 | 415.5 |
| TNP - Pontos Não Planejados | 77 | 86.5 | 71.5 | 58 | 49.5 | 86.5 | 88 | 119.5 |
| % TNP/TR | 22,8 | 25,2 | 24,4 | 17,7 | 17,2 | 25,8 | 29,8 | 28,8 |


PBUG - Peso de Bugs

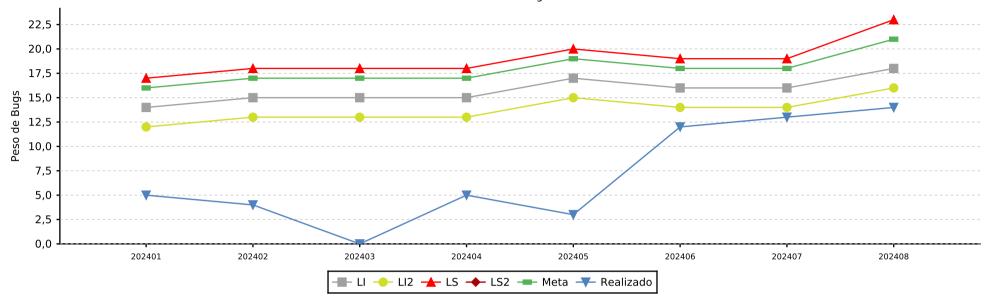


| | 202401 | 202402 | 202403 | 202404 | 202405 | 202406 | 202407 | 202408 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 12 | 13 | 14 |
| Meta | 16 | 17 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 21 |
| LS2 | | | | | | | | |
| LS | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 23 |
| LI2 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 |
| LI | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 |
| Pontos Entregues | 338 | 344 | 293.5 | 328.5 | 288.5 | 335.5 | 295.5 | 415.5 |
| % PBUG / TR | 1,48 | 1,17 | 0,00 | 1,53 | 1,04 | 3,58 | 4,40 | 3,37 |

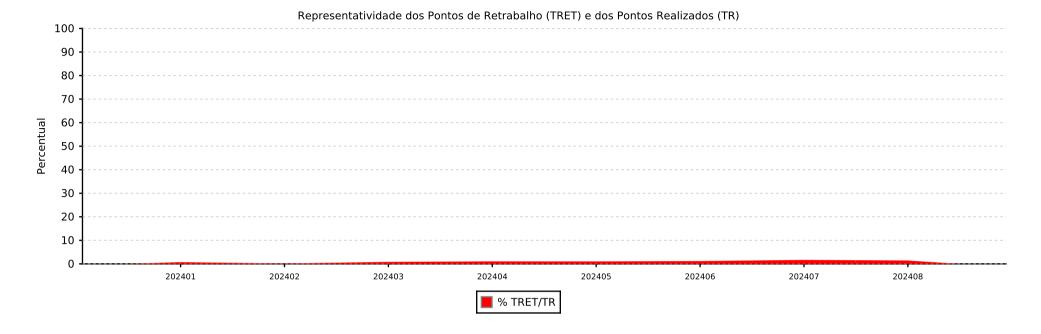

| | 202401 | 202402 | 202403 | 202404 | 202405 | 202406 | 202407 | 202408 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TR - Pontos Realizados | 338 | 344 | 293.5 | 328.5 | 288.5 | 335.5 | 295.5 | 415.5 |
| TRET - Pontos de Retrabalho | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| % TRET/TR | 0,7 | 0,1 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 1,4 |

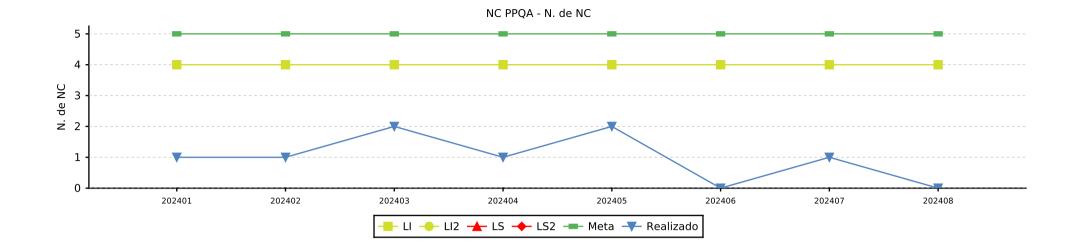

| | 202401 | 202402 | 202403 | 202404 | 202405 | 202406 | 202407 | 202408 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Meta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LS2 | | | | | | | | |
| LS | | | | | | | | |
| LI2 | | | | | | | | |
| LI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

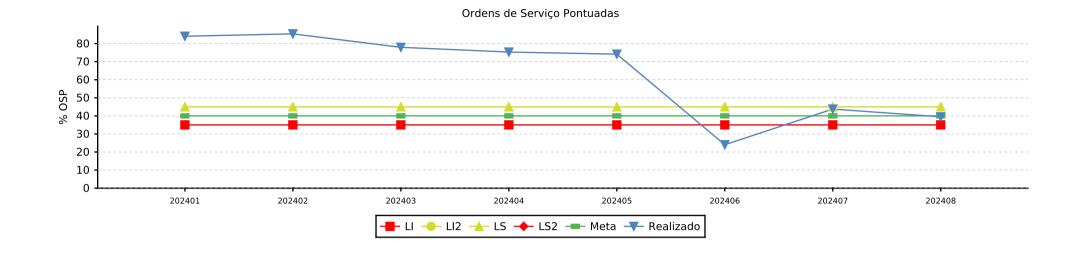


| | 202401 | 202402 | 202403 | 202404 | 202405 | 202406 | 202407 | 202408 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 84.09 | 85.4 | 77.95 | 75.33 | 74.16 | 24.03 | 43.77 | 39.47 |
| Meta | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| LS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| LI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [59.88%]
- Analise de Sistema [9.45%]
- Code Review [4.3%]
- Retrospectiva [3%]
- Ocafe [2.65%]
- Ausencia [2.44%]
- Daily Scrum [2.36%]
- Sprint Planning 1 [2.22%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [2.03%]
- Reuniao [1.48%]
- Ginastica Laboral [1.42%]
- Oriacao de Ambiente de Desenv. [1.19%]
- Atualizacao de Versao [1.18%]
- Analise de O.S [1.13%]
- Sizing [1.01%]
- Verificando apontamento [0.91%]
- Sprint Planning 2 [0.69%]
- Outros [0.68%]
- Atividades Gerenciais [0.42%]
- Preparando ambiente [0.31%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.19%]
- Banheiro [0.19%]
- Treinamento [0.17%]
- Clean Code [0.15%]
- Analise Retorno O.S. [0.13%]
- Manutenção de Servidores [0.12%]
- Ocrreção de Erros Interno [0.09%]
- Planejamento de Projeto [0.09%]

- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.05%]
- Geração de Atas [0.03%]
- Documentação [0.01%]
- Compilação de sistemas [0.01%]

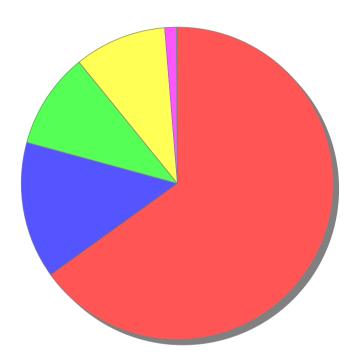

- Desenvolvimento de Requisitos [63.39%]
- Gestao de Requisitos [13.81%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [9.66%]
- Diversos* [9.3%]
- Integracao de Produto [1.18%]
- Planejamento de Projeto [0.09%]
- Gerencia de Configuracao [0.01%]
