



INDICADORES DA SPRINT


	202513				202601			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	176h00m	135h00m	132h00m	88h00m	92h00m	136h00m	176h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	186h13m	162h52m	148h15m	91h01m	87h07m	133h25m	189h30m	232h28m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	120h15m	94h05m	89h30m	58h20m	68h45m	113h35m	124h05m	160h50m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	110h29m	93h02m	105h37m	40h21m	40h12m	90h08m	111h45m	137h51m
05. Pontos planejados	40,0	28,5	29,0	11,0	28,5	53,5	35,0	37,5
06. Pontos entregues	39	28	27	17,5	4,5	36	27	54
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	31,00	23,50	26,00	11,00	2,50	30,50	24,00	29,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	8,00	4,50	1,00	6,50	2,00	5,50	3,00	24,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	2	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	9	6	2	3	2	6	10	14
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	10	4	1	7	1	2	2	8
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	1	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	1	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,333	0,303	0,325	0,189	0,415	0,472	0,283	0,234
16. Produtividade realizada	0,354	0,301	0,256	0,434	0,112	0,400	0,242	0,392
17. % Pontos NP / Pontos entregues	20,6	16,1	3,8	37,2	44,5	15,3	11,2	45,4

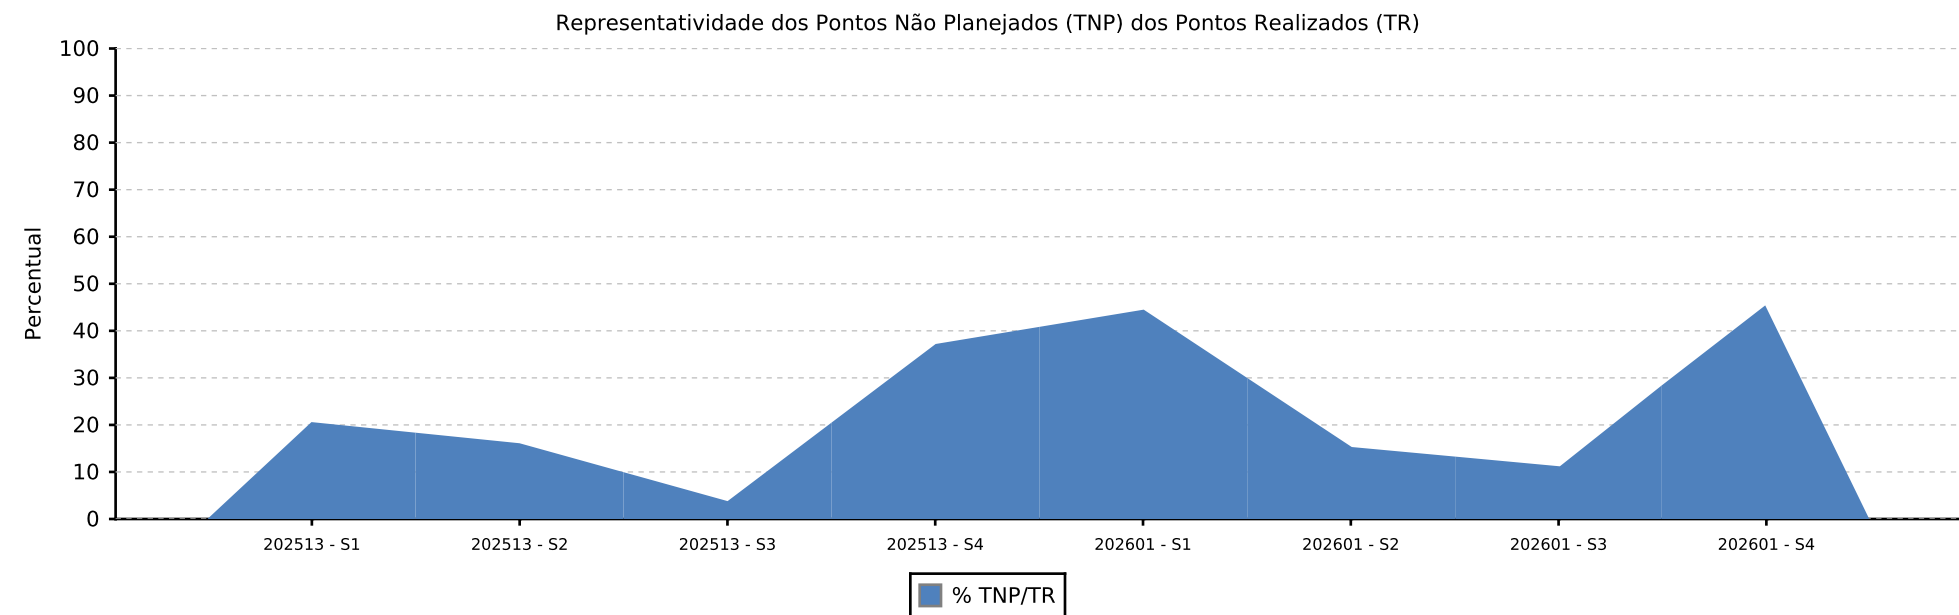

	202513				202601			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	39	28	27	17.5	4.5	36	27	54
TNP - Pontos Não Planejados	8	4.5	1	6.5	2	5.5	3	24.5
% TNP/TR	20,6	16,1	3,8	37,2	44,5	15,3	11,2	45,4

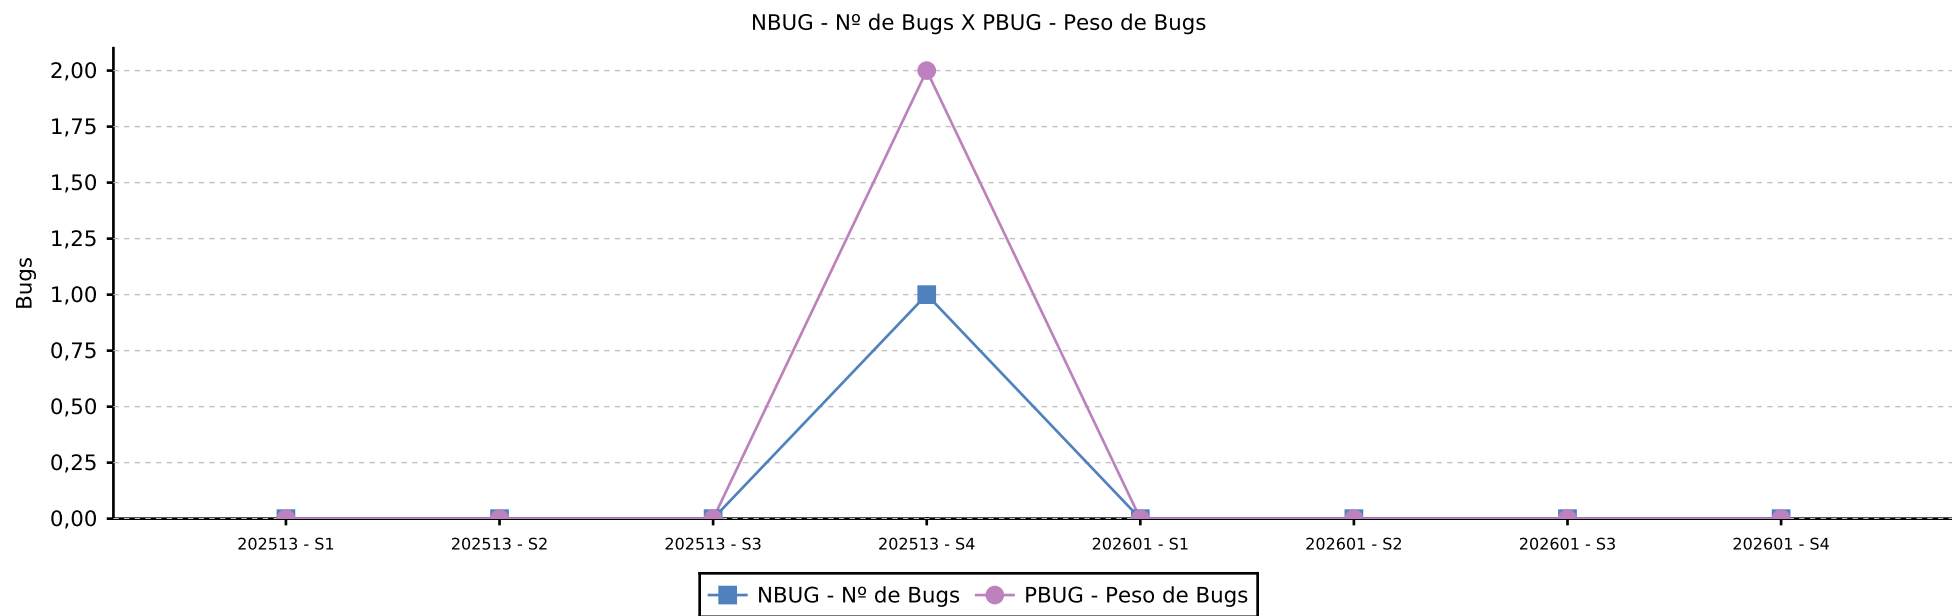

	202513				202601			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	1	0	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	2	0	0	0	0
Pontos Entregues	39	28	27	17.5	4.5	36	27	54
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00

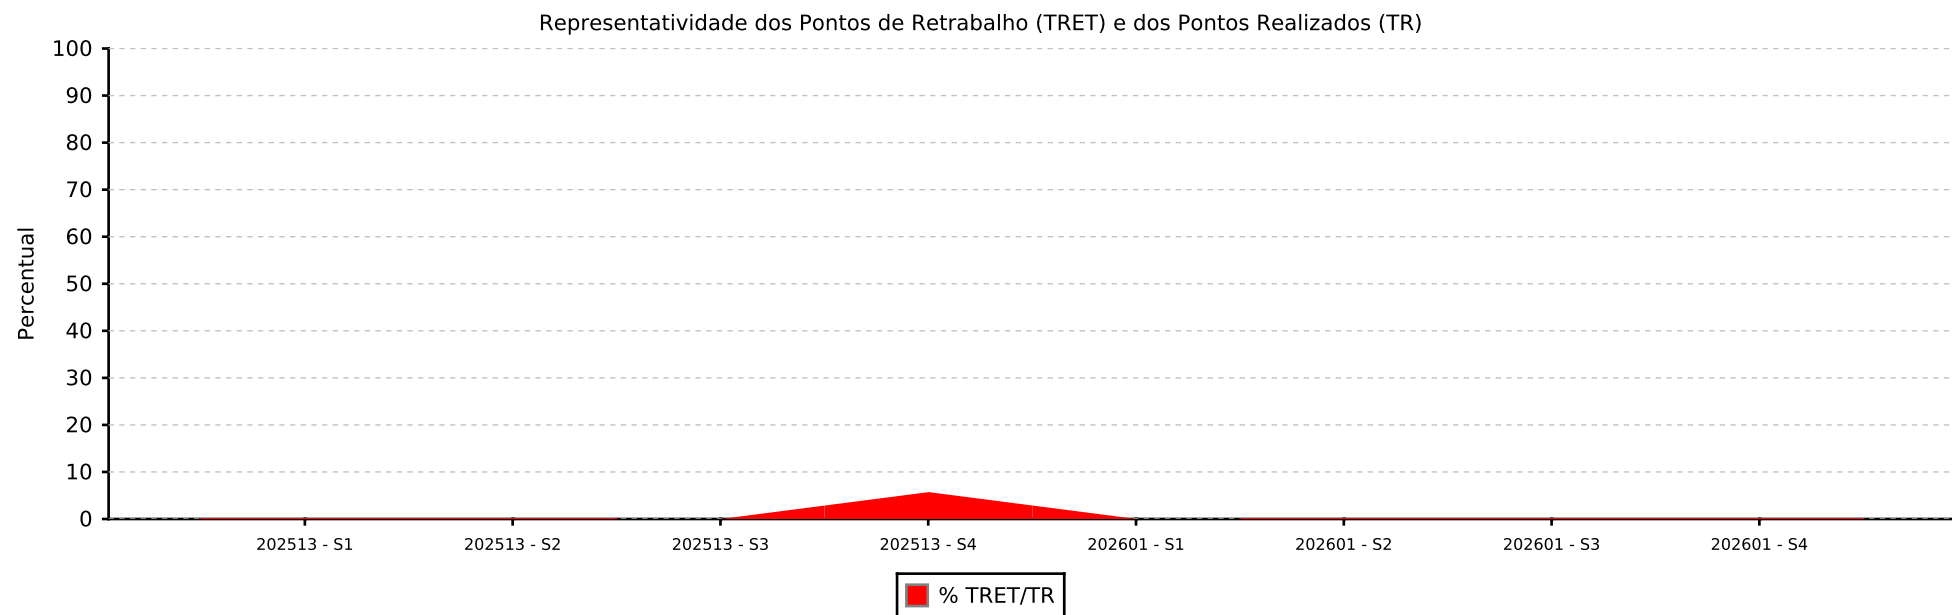



	202513				202601			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	39	28	27	17.5	4.5	36	27	54
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	1	0	0	0	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0,33	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	1,83	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	0	11,55	0	0	6	3,17	6	0	12	14,72	122,7 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0,25	0	0,17	0,25	0	0,25	0	0,75	0,42	56,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0,25	0,52	0	2,77	0,25	0	0,25	0	0,75	3,29	438,7 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0,08	0	0,53	0	0	0	0,61	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	92,01	87,12	135,99	133,41	176	189,51	220	232,48	624	642,52	103,0 %


% de Horas por Atividade

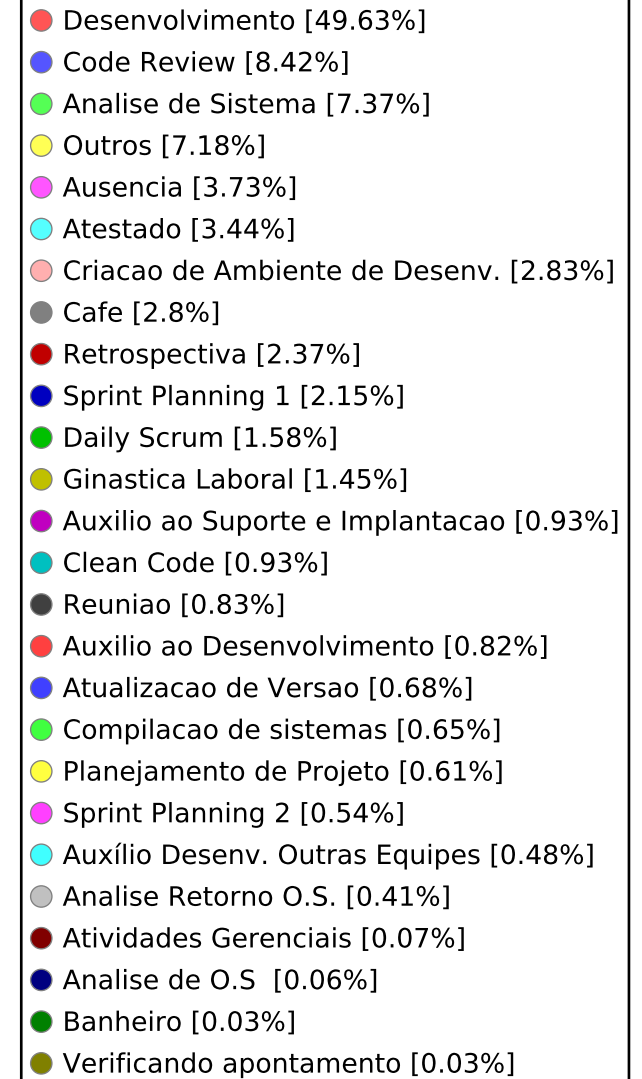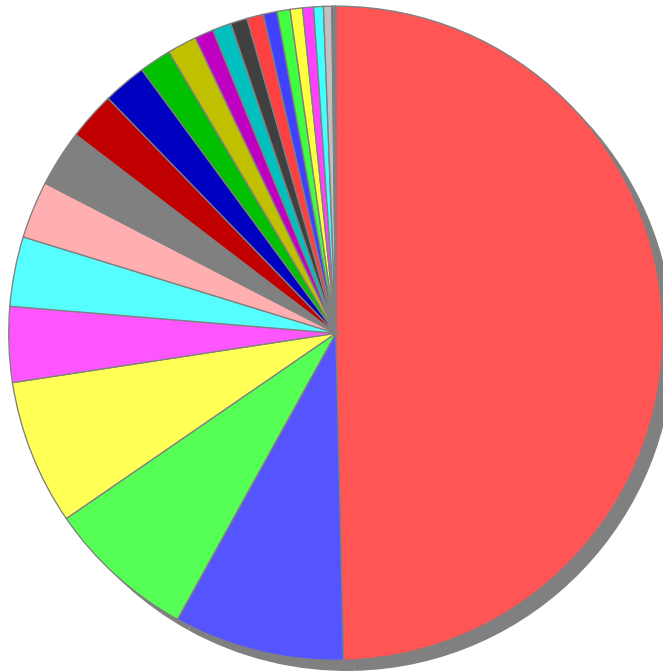

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos		59,33	39,03	104,08	87,23	107	97,37	139,17	127,13	409,58	350,76	85,6 %
DIV - Diversos*		6,08	20,42	7,75	16,22	15,33	25,08	17,58	39,48	46,74	101,2	216,5 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto		13,67	5,92	13,33	9,78	23,67	23,07	28	28,73	78,67	67,5	85,8 %
REQM - Gestao de Requisitos		10,5	19,97	9,5	12,23	24	33,3	27,5	24,33	71,5	89,83	125,6 %
PI - Integracao de Produto		1	0,42	0	0	4	8,15	4	1,58	9	10,15	112,8 %
CM - Gerencia de Configuracao		0,25	0,42	0,5	4,52	0,5	0,58	0,5	1,5	1,75	7,02	401,1 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	1,25	1,42	1,25	1,42	113,6 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	90,83	86,18	135,16	129,98	174,5	187,55	218	224,17	618,49	627,88	101,5 %

% de Horas por Área do CMMI

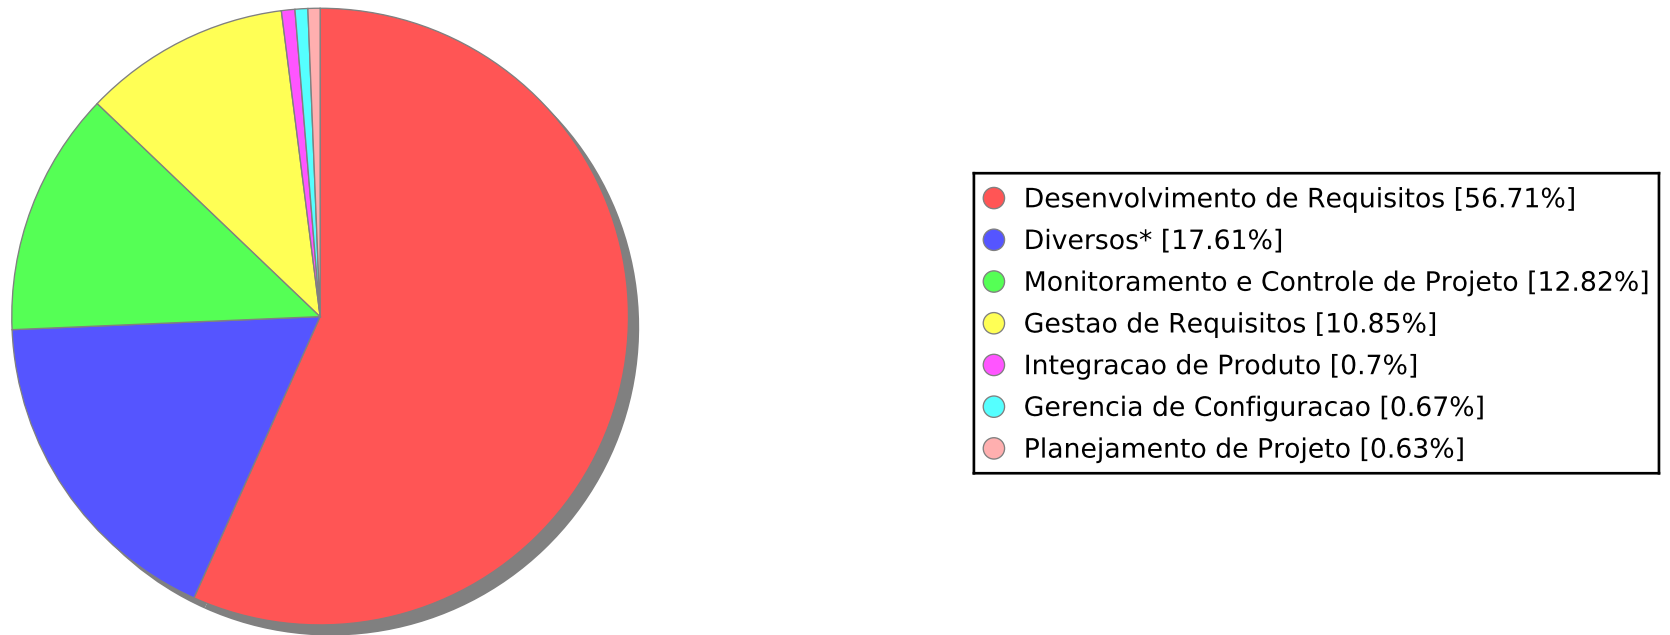


INDICADORES DO PROJETO


	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601
01. Horas planejadas de todas atividades	1008h00m	1012h00m	972h00m	880h00m	880h00m	712h00m	531h00m	624h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1065h58m	1067h31m	1031h19m	977h42m	945h46m	774h53m	588h21m	642h30m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	742h45m	716h25m	687h30m	615h45m	610h47m	477h55m	362h10m	467h15m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	631h18m	665h25m	609h08m	602h21m	544h09m	397h01m	349h29m	379h56m
05. Pontos planejados para o projeto	218,0	216,0	205,0	188,0	186,0	145,0	110,0	4,0
06. Pontos planejados	269,5	223,0	219,0	196,0	235,5	161,0	108,5	154,5
07. Pontos entregues	190,5	200	187,5	185	171,5	123,5	111,5	121,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	162,00	160,50	146,50	113,50	154,50	109,00	91,50	86,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	28,50	39,50	41,00	71,50	17,00	14,50	20,00	35,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	6	5	9	0	3	0	2	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	36	39	30	25	38	31	20	32
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	22	29	32	51	20	10	22	13
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	4	2	3	0	1	0	1	0
14. Horas de correção de bug	5h50m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	4,5	1,5	2,5	0	1	0	1	0
16. Produtividade planejada	0,363	0,312	0,319	0,319	0,386	0,337	0,300	0,331
17. Produtividade realizada	0,302	0,301	0,308	0,308	0,316	0,312	0,320	0,320
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	87,4	92,6	91,5	98,5	92,3	85,2	101,4	3037,5
19. % Pontos NP / Pontos entregues	15	19,8	21,9	38,7	10	11,8	18	28,9

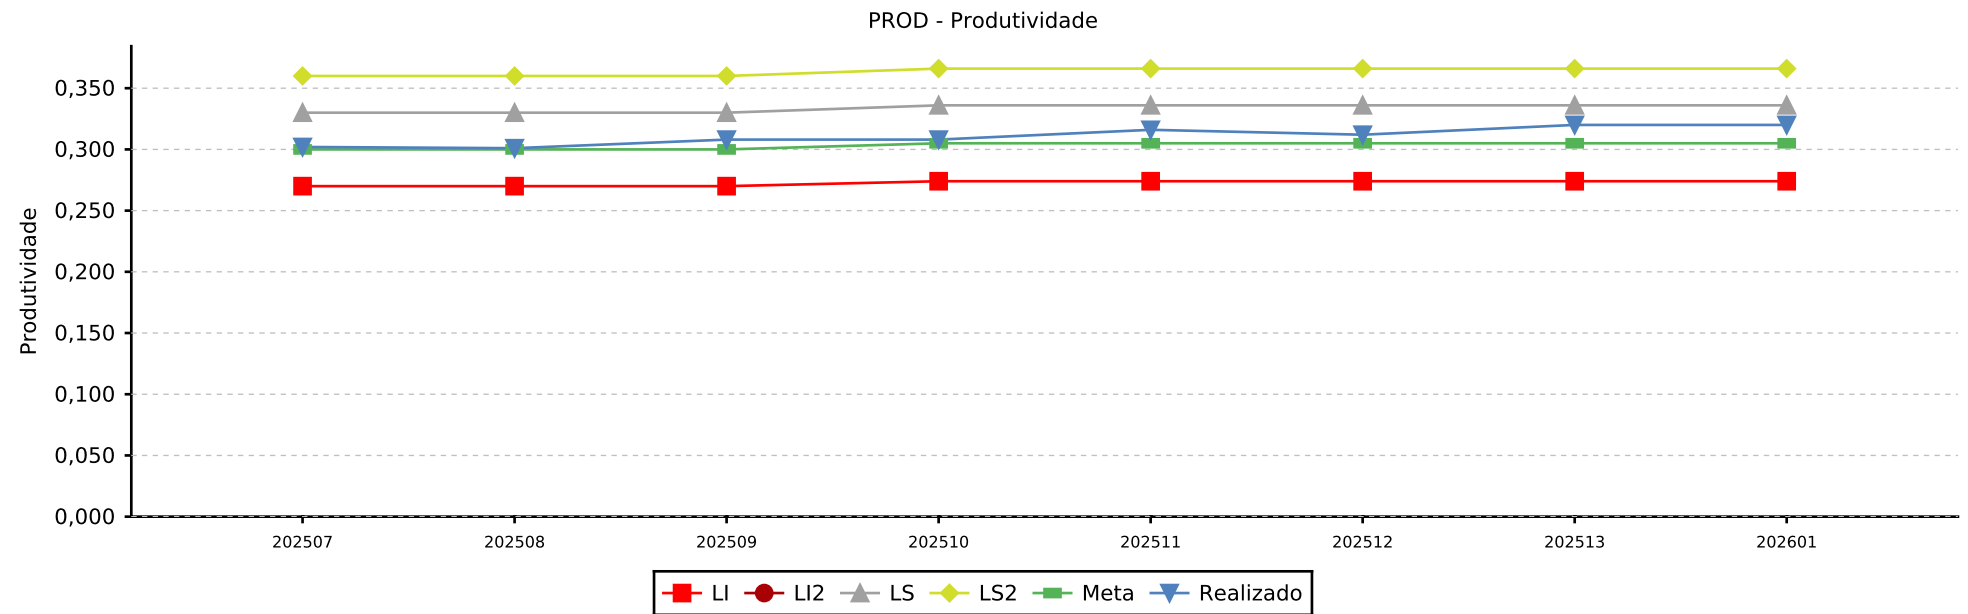


	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601
Realizado	0,302	0,301	0,308	0,308	0,316	0,312	0,320	0,320
Meta	0,300	0,300	0,300	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305
LS2	0,360	0,360	0,360	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366
LS	0,330	0,330	0,330	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
LI2								
LI	0,270	0,270	0,270	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274

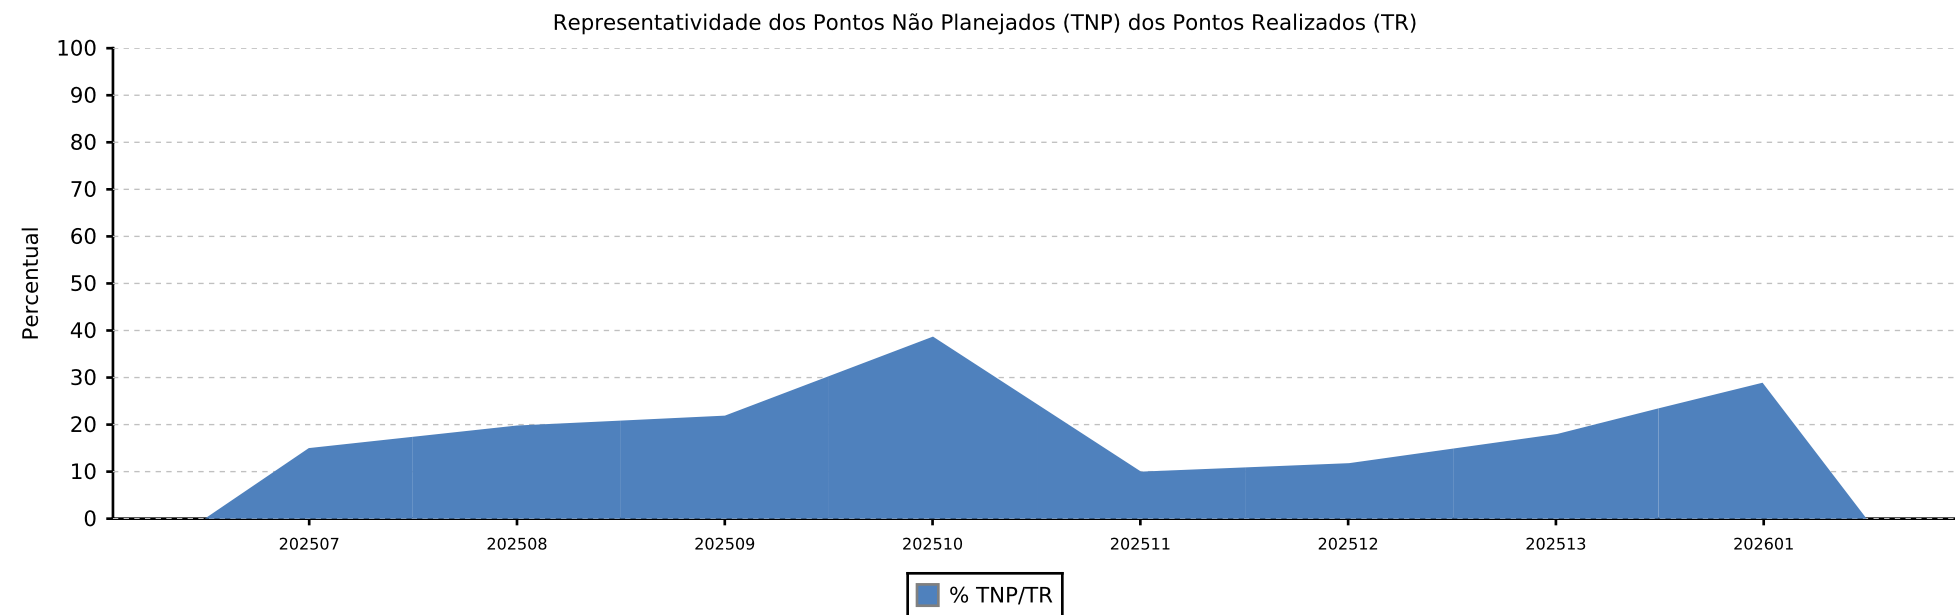


	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601
TR - Pontos Realizados	190.5	200	187.5	185	171.5	123.5	111.5	121.5
TNP - Pontos Não Planejados	28.5	39.5	41	71.5	17	14.5	20	35
% TNP/TR	15,0	19,8	21,9	38,7	10,0	11,8	18,0	28,9

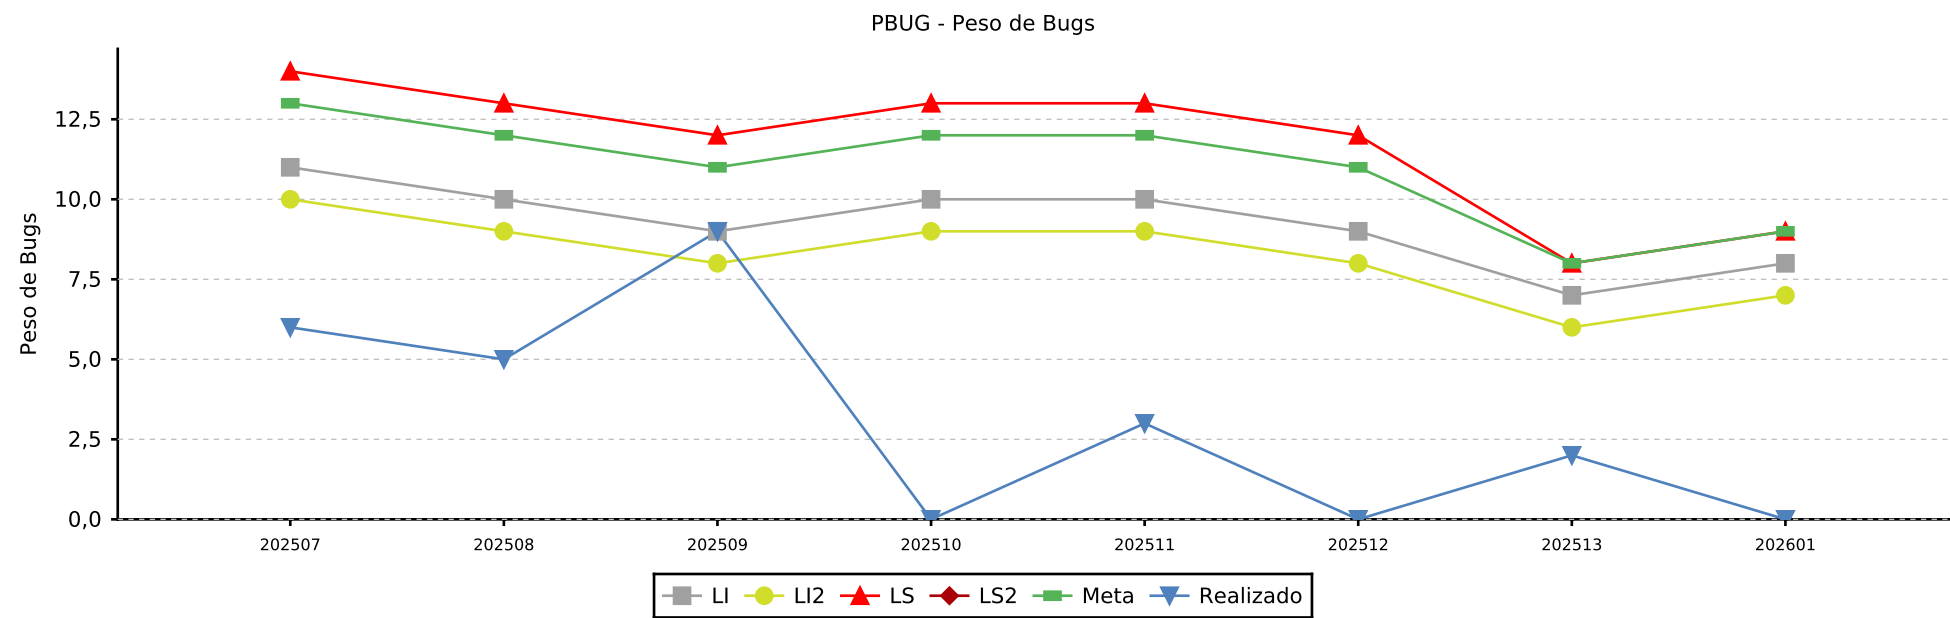


	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601
Realizado	6	5	9	0	3	0	2	0
Meta	13	12	11	12	12	11	8	9
LS2								
LS	14	13	12	13	13	12	8	9
LI2	10	9	8	9	9	8	6	7
LI	11	10	9	10	10	9	7	8
Pontos Entregues	190.5	200	187.5	185	171.5	123.5	111.5	121.5
% PBUG / TR	3,15	2,50	4,80	0,00	1,75	0,00	1,80	0,00

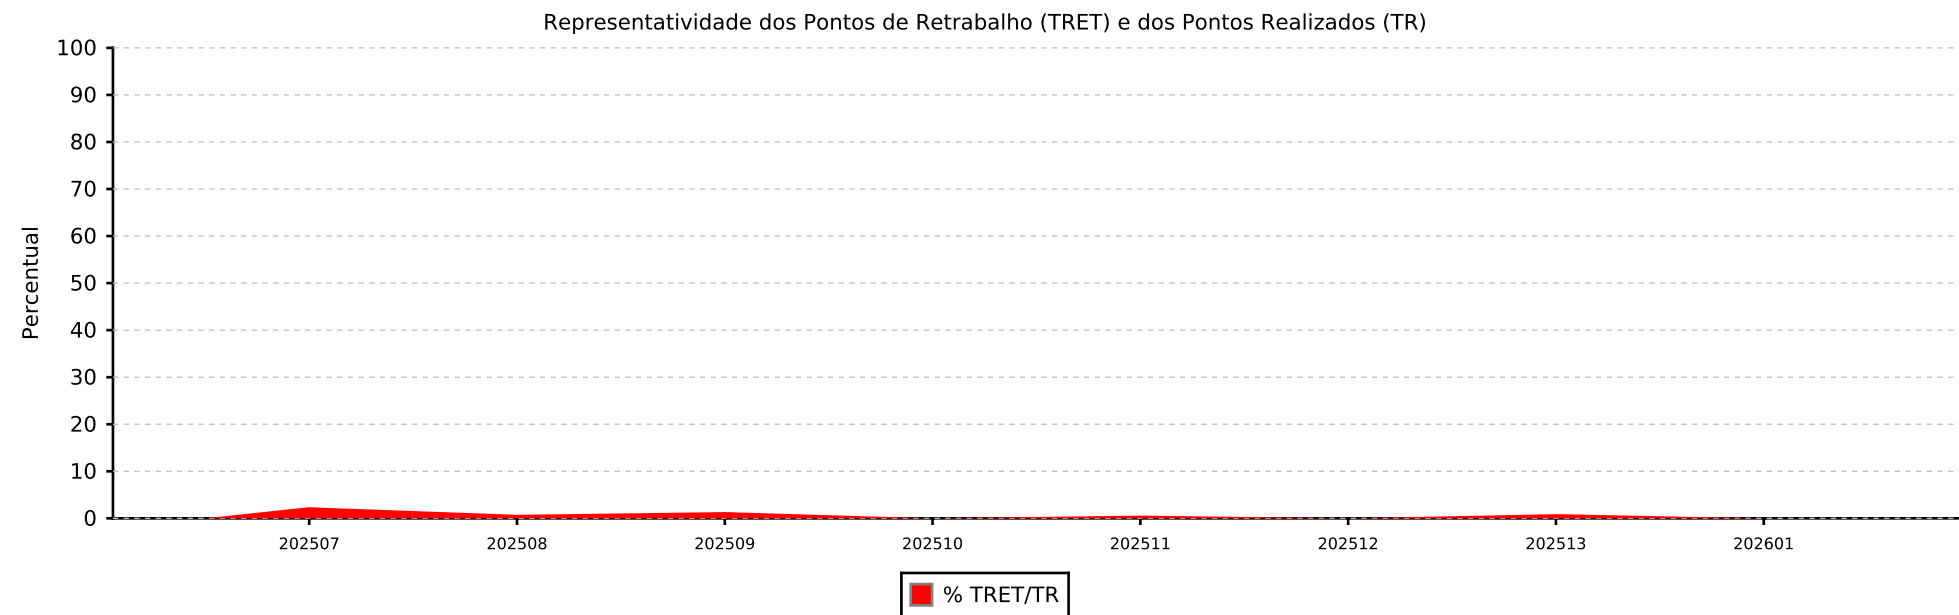


	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601
TR - Pontos Realizados	190.5	200	187.5	185	171.5	123.5	111.5	121.5
TRET - Pontos de Retrabalho	4.5	1.5	2.5	0	1	0	1	0
% TRET/TR	2,4	0,8	1,3	0,0	0,6	0,0	0,9	0,0

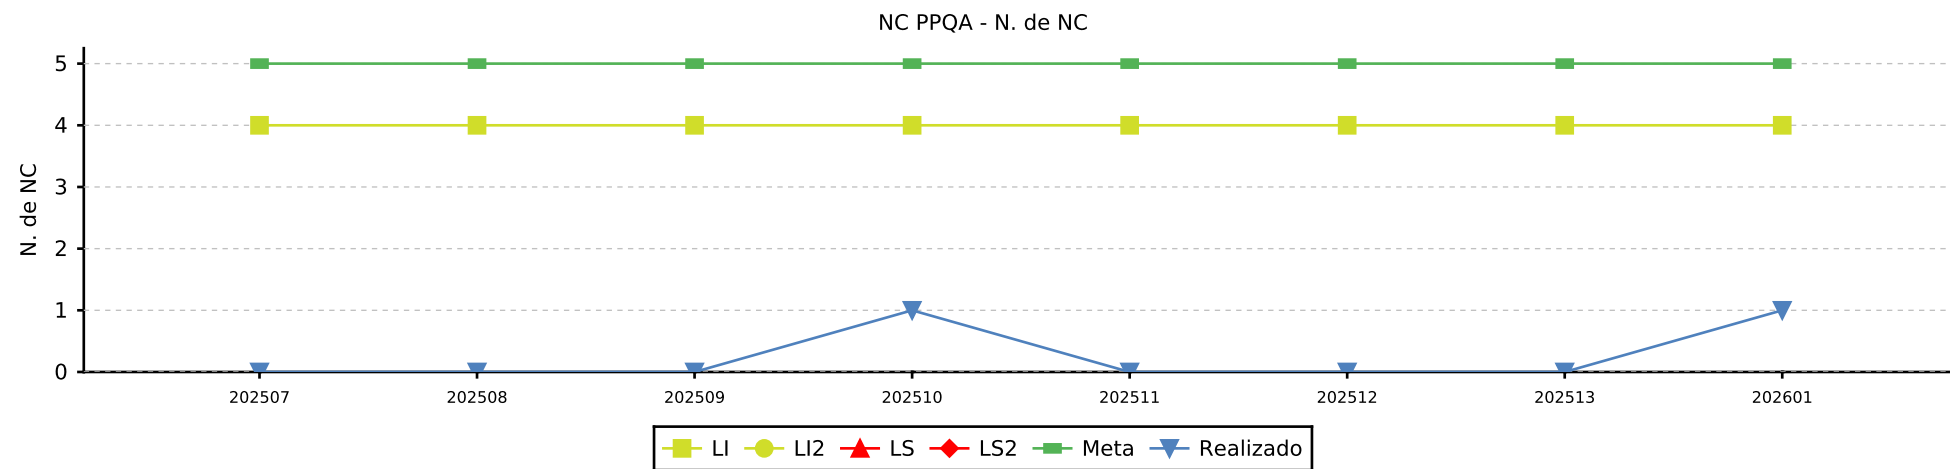

	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601
Realizado	0	0	0	1	0	0	0	1
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

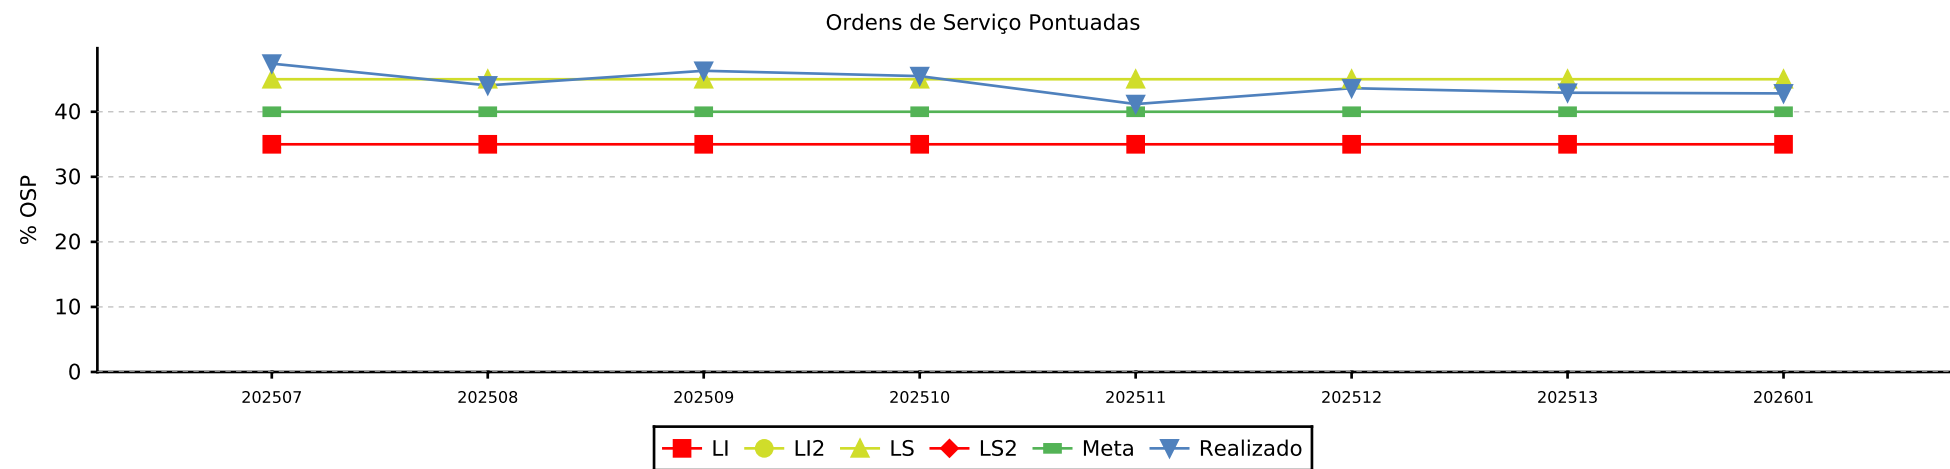

	202507	202508	202509	202510	202511	202512	202513	202601
Realizado	47.4	44.05	46.3	45.48	41.18	43.62	42.93	42.82
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

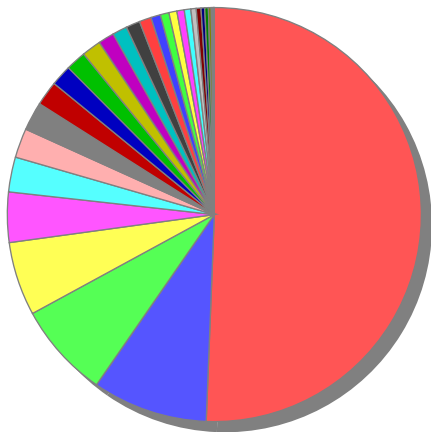

% de Horas por Atividade

● Desenvolvimento [50.63%]	● Banheiro [0.04%]
● Analise de Sistema [9.01%]	● Verificando apontamento [0.04%]
● Code Review [7.44%]	
● Ausencia [5.76%]	
● Outros [3.92%]	
● Cafe [2.72%]	
● Sizing [2.29%]	
● Criacao de Ambiente de Desenv. [2.23%]	
● Retrospectiva [1.92%]	
● Sprint Planning 1 [1.63%]	
● Atualizacao de Versao [1.58%]	
● Ginastica Laboral [1.5%]	
● Atestado [1.25%]	
● Daily Scrum [1.15%]	
● Compilacao de sistemas [1.09%]	
● Reuniao [0.93%]	
● Auxilio ao Desenvolvimento [0.75%]	
● Sprint Planning 2 [0.67%]	
● Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.62%]	
● Clean Code [0.58%]	
● Treinamento [0.51%]	
● Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.42%]	
● Analise Retorno O.S. [0.37%]	
● Atividades Gerenciais [0.29%]	
● Analise de O.S [0.28%]	
● Planejamento de Projeto [0.22%]	
● Recursos Humanos [0.1%]	
● Geração de Atas [0.07%]	

% de Horas por Área do CMMI

