
INDICADORES DA SPRINT


		202	509			202	510	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	180h00m	264h00m	264h00m	264h00m	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	189h29m	283h11m	278h04m	280h35m	245h21m	238h33m	251h49m	241h59m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	119h25m	189h25m	189h25m	189h15m	154h10m	153h55m	153h55m	153h45m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	109h07m	161h54m	161h12m	176h55m	154h37m	132h53m	153h48m	161h03m
05. Pontos planejados	47,5	50,0	63,0	58,5	51,0	44,0	42,5	58,5
06. Pontos entregues	23,5	47,5	59,5	57	54	25,5	39	66,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	19,50	38,00	47,00	42,00	26,00	16,50	27,50	56,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	4,00	9,50	12,50	15,00	28,00	9,00	11,50	10,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	6	3	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	8	9	5	8	6	5	6	10
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	3	12	5	12	24	10	9	6
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	2	1	0	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	1	1	0	0,5	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,398	0,264	0,333	0,310	0,331	0,286	0,277	0,381
16. Produtividade realizada	0,216	0,294	0,370	0,323	0,350	0,192	0,254	0,413
17. % Pontos NP / Pontos entregues	17,1	20	21,1	26,4	51,9	35,3	29,5	15,1

PROD - Produtividade

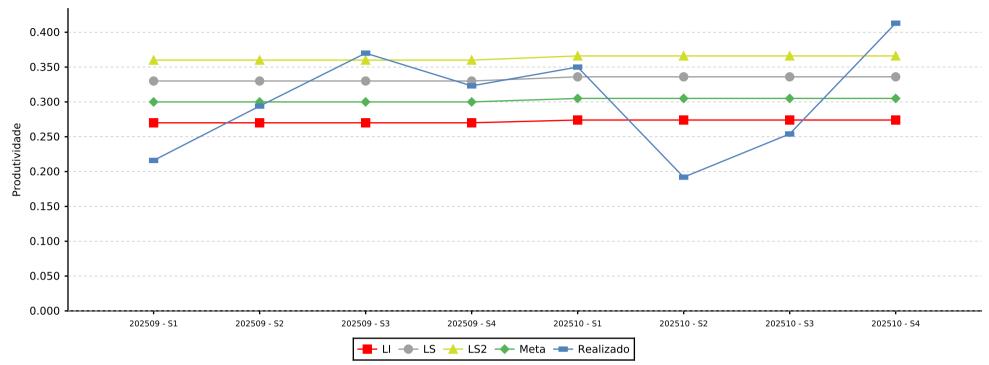


		202	509		202510					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,216	0,294	0,370	0,323	0,350	0,192	0,254	0,413		
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,305	0,305	0,305	0,305		
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,366	0,366	0,366	0,366		
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,336	0,336	0,336	0,336		
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,274	0,274	0,274	0,274		

Representatividade dos Pontos Não Planejados (TNP) dos Pontos Realizados (TR)




		202	509			202	510	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	235	475	595	57	54	255	39	665
TNP - Pontos Não Planejados	400	950	1250	1500	2800	900	1150	1000
% TNP/TR	17100.0	200.0	21100.0	26400.0	51900.0	35300.0	29500.0	15100.0

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

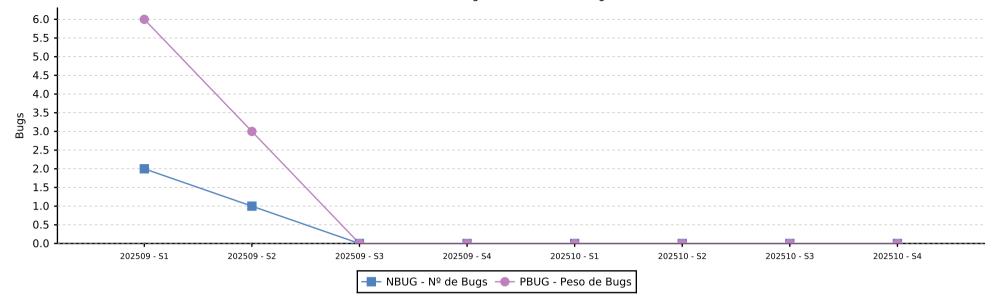

		202	509			202	510	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	2	1	0	0	0	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	6	3	0	0	0	0	0	0
Pontos Entregues	235	475	595	57	54	255	39	665
% PBUG / TR	25540	63200.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

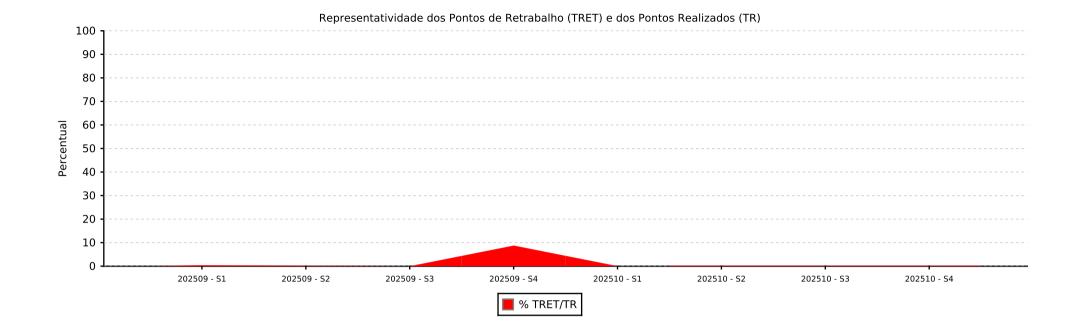


		202	509			202	510	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	235	475	595	57	54	255	39	665
TRET - Pontos de Retrabalho	1	1	0	5	0	0	0	0
% TRET/TR	0.4	0.2	0.0	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	nt 1	Spr	int 2	Spr	int 3	Spri	int 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	12,575	12,157	12,550	10,717	12,550	13,185	12,408	13,397	50,083	49,456	98.7 %
Analise de Sistema	1,650	2,340	1,650	1,665	1,650	2,113	1,650	1,823	6,600	7,941	120.3 %
Code Review	2,100	1,910	2,100	2,883	2,100	2,087	2,100	1,702	8,400	8,582	102.2 %
Daily Scrum	717	888	717	642	717	817	717	998	2,868	3,345	116.6 %
Reuniao	367	565	367	1,255	367	1,303	383	865	1,484	3,988	268.7 %
Sizing	600	287	600	608	600	1,797	600	732	2,400	3,424	142.7 %
Cafe	600	585	625	612	625	667	625	575	2,475	2,439	98.5 %
Ausencia	0	722	0	603	0	840	0	525	0	2,690	0.0 %
Atualizacao de Versao	400	348	400	250	400	583	400	438	1,600	1,619	101.2 %
Atestado	0	0	0	1,600	0	0	0	400	0	2,000	0.0 %
Ginastica Laboral	417	385	417	340	417	367	417	397	1,668	1,489	89.3 %
Retrospectiva	500	855	500	458	500	617	500	333	2,000	2,263	113.1 %
Sprint Planning 1	500	450	500	375	500	75	500	292	2,000	1,192	59.6 %
Clean Code	225	192	225	242	225	0	225	275	900	709	78.8 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	233	192	233	200	233	80	233	255	932	727	78.0 %
Sprint Planning 2	250	200	250	167	250	25	250	208	1,000	600	60.0 %
Analise Retorno O.S.	0	67	0	137	0	0	0	183	0	387	0.0 %
Atividades Gerenciais	100	55	100	17	100	0	100	138	400	210	52.5 %
Manutenção de Servidores	0	147	0	0	0	0	0	118	0	265	0.0 %
Verificando apontamento	233	202	233	212	233	95	233	110	932	619	66.4 %
Treinamento	25	0	25	160	25	0	25	108	100	268	268.0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	33	33	33	50	33	0	33	98	132	181	137.1 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	92	0	92	0.0 %
Outros	17	808	17	0	17	98	17	67	68	973	1,430.9
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	125	25	125	25	20.0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23	0.0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	200	217	200	425	200	78	200	20	800	740	92.5 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0.0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %


Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Auxilio Review	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0.0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Correcao de Erros Externo	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	0.0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Merge O.S.	33	225	33	100	33	0	33	0	132	325	246.2 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Verificar o.s no nome	0	8	0	13	0	0	0	0	0	21	0.0 %
Documentação	0	67	0	17	0	0	0	0	0	84	0.0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Correção de Erros Interno	25	0	25	0	25	0	25	0	100	0	0.0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	100	557	100	58	100	255	100	0	400	870	217.5 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Geração de Atas	25	25	25	0	25	0	25	0	100	25	25.0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Compilacao de sistemas	50	25	50	50	50	0	50	0	200	75	37.5 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
Total Geral	22,000	24,537	22,000	23,856	22,000	25,182	21,999	24,197	87,999	97,772	111.1 %



- Desenvolvimento [5536%]
- Analise de Sistema [753%]
- Code Review [703%]
- O Daily Scrum [412%]
- Reuniao [357%]
- Sizing [303%]
- Cafe [238%]
- Ausencia [217%]
- Atualizacao de Versao [181%]
- Atestado [165%]
- Ginastica Laboral [164%]
- Retrospectiva [138%]
- Sprint Planning 1 [121%]
- Clean Code [114%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [105%]
- Sprint Planning 2 [86%]
- Analise Retorno O.S. [76%]
- Atividades Gerenciais [57%]
- Manutenção de Servidores [49%]
- Verificando apontamento [45%]
- Treinamento [45%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [40%]
- Preparando ambiente [38%]
- Outros [28%]
- Planejamento de Projeto [10%]
- Banheiro [10%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [8%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	int 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	int 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	S	13,317	12,790	13,292	11,633	13,292	13,343	13,150	14,045	53,051	51,811	97.7 %
REQM - Gestao de Requisitos		3,000	3,343	3,000	2,952	3,000	4,010	3,000	3,330	12,000	13,635	113.6 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	3,317	3,653	3,317	3,983	3,317	3,520	3,317	3,033	13,268	14,189	106.9 %
DIV - Diversos*		1,633	3,902	1,658	2,985	1,658	3,530	1,675	2,567	6,624	12,984	196.0 %
PI - Integracao de Produto		400	348	400	250	400	583	400	438	1,600	1,619	101.2 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	125	25	125	25	20.0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0 %
CM - Gerencia de Configuração		50	25	50	50	50	0	50	0	200	75	37.5 %
	Total Geral	21,717	24,061	21,717	21,853	21,717	24,986	21,717	23,438	86,868	94,338	108.6 %

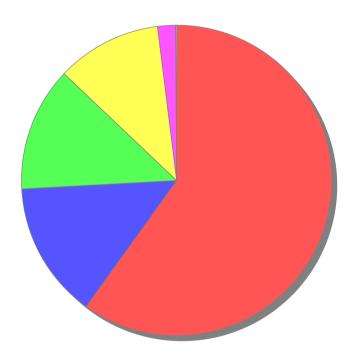

- Desenvolvimento de Requisitos [5992%]
- Gestao de Requisitos [1421%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [1294%]
- Oiversos* [1095%]
- Integracao de Produto [187%]
- Planejamento de Projeto [11%]


INDICADORES DO PROJETO

	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510
01. Horas planejadas de todas atividades	968h00m	734h00m	700h00m	1056h00m	1008h00m	1012h00m	972h00m	880h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	990h22m	749h59m	737h25m	1145h23m	1065h58m	1067h31m	1031h19m	977h42m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	740h15m	560h25m	505h40m	788h50m	742h45m	716h25m	687h30m	615h45m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	605h07m	458h21m	450h32m	723h16m	631h18m	665h25m	609h08m	602h21m
05. Pontos planejados para o projeto	218,0	165,0	148,0	232,0	218,0	216,0	205,0	188,0
06. Pontos planejados	276,5	179,5	153,5	248,5	269,5	223,0	219,0	196,0
07. Pontos entregues	178,5	140,5	134	216,5	190,5	200	187,5	185
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	147,00	134,00	120,50	188,50	162,00	160,50	146,50	126,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	31,50	6,50	13,50	28,00	28,50	39,50	41,00	58,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	3	3	0	6	6	5	9	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	47	30	30	42	36	39	30	27
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	21	6	13	19	22	29	32	49
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	1	0	2	4	2	3	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	5h50m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	2,5	1	0	2	4,5	1,5	2,5	0
16. Produtividade planejada	0,374	0,321	0,304	0,316	0,363	0,312	0,319	0,319
17. Produtividade realizada	0,295	0,307	0,298	0,300	0,302	0,301	0,308	0,308
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	81,9	85,2	90,6	93,4	87,4	92,6	91,5	98,5
19. % Pontos NP / Pontos entregues	17,7	4,7	10,1	13	15	19,8	21,9	31,7

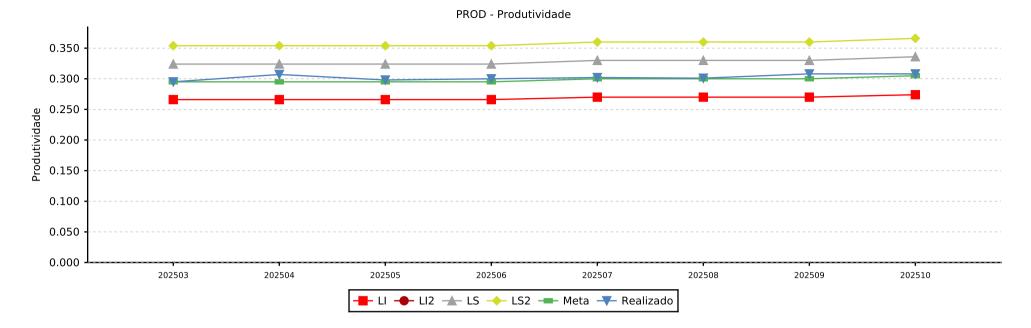


	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510
Realizado	0,295	0,307	0,298	0,300	0,302	0,301	0,308	0,308
Meta	0,295	0,295	0,295	0,295	0,300	0,300	0,300	0,305
LS2	0,354	0,354	0,354	0,354	0,360	0,360	0,360	0,366
LS	0,324	0,324	0,324	0,324	0,330	0,330	0,330	0,336
LI2								
LI	0,266	0,266	0,266	0,266	0,270	0,270	0,270	0,274


Representatividade dos Pontos Não Planejados (TNP) dos Pontos Realizados (TR)

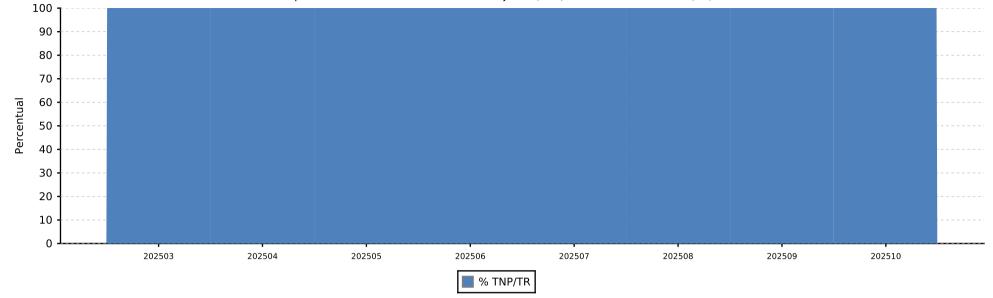


	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510
TR - Pontos Realizados	1785	1405	134	2165	1905	200	1875	185
TNP - Pontos Não Planejados	3150	650	1350	2800	2850	3950	4100	5850
% TNP/TR	17700.0	4700.0	10100.0	1300.0	1500.0	19800.0	21900.0	31700.0




	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510
Realizado	3	3	0	6	6	5	9	0
Meta	130000	130000	110000	110000	130000	120000	110000	120000
LS2								
LS	143000	143000	121000	121000	143000	132000	121000	132000
LI2	104000	104000	88000	88000	104000	96000	88000	96000
LI	117000	117000	99000	99000	117000	108000	99000	108000
Pontos Entregues	1785	1405	134	2165	1905	200	1875	185
% PBUG / TR	16900.	21400.	0.00	27800.	31500.	2500.0	4800.0	0.00

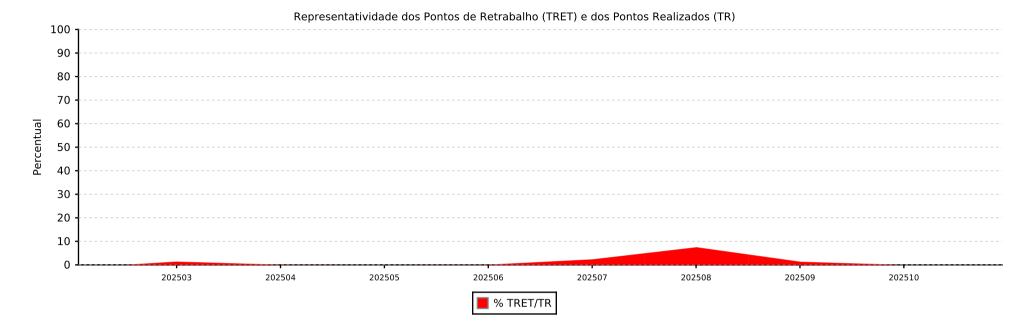

	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510
TR - Pontos Realizados	1785	1405	134	2165	1905	200	1875	185
TRET - Pontos de Retrabalho	25	1	0	2	45	15	25	0
% TRET/TR	1.4	0.1	0.0	0.1	2.4	7.5	1.3	0.0

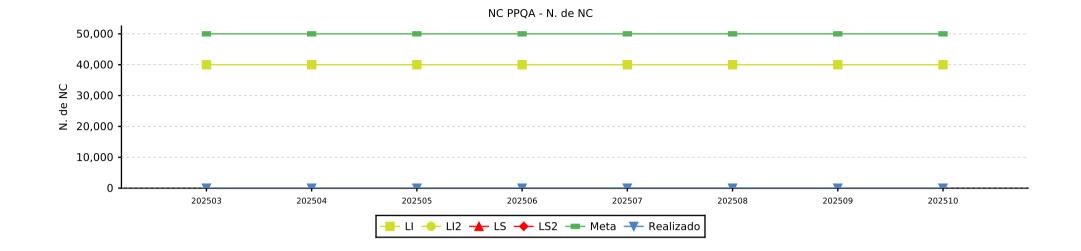

	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510
Realizado	0	0	0	0	0	0	0	0
Meta	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
LS2								
LS								
LI2								
LI	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000

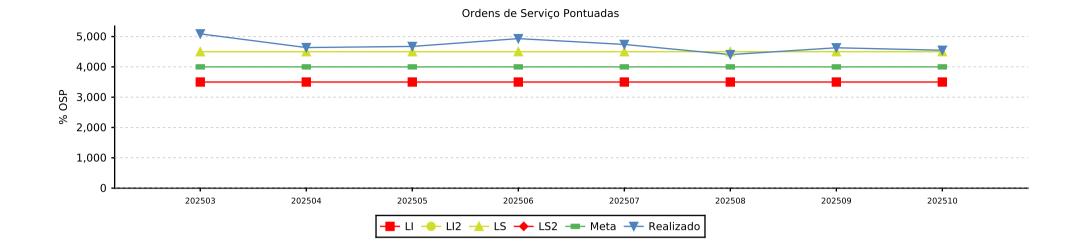


	202503	202504	202505	202506	202507	202508	202509	202510
Realizado	5089	4637	4674	4932	4740	4405	4630	4548
Meta	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [5058%]
- Code Review [878%]
- Analise de Sistema [812%]
- Reuniao [408%]
- Sizing [350%]
- Daily Scrum [342%]
- Ausencia [275%]
- Cafe [249%]
- Retrospectiva [231%]
- Atestado [205%]
- Atualizacao de Versao [166%]
- Ginastica Laboral [152%]
- Sprint Planning 1 [122%]
- Outros [100%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [89%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [76%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [74%]
- Clean Code [72%]
- Verificando apontamento [63%]
- Sprint Planning 2 [61%]
- Analise Retorno O.S. [40%]
- Merge O.S. [33%]
- Treinamento [27%]
- Manutenção de Servidores [27%]
- Atividades Gerenciais [21%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [19%]
- Auxilio suporte [10%]
- Preparando ambiente [9%]

- Documentação [8%]
- Compilacao de sistemas [8%]
- Auxilio Review [3%]
- Planejamento de Projeto [3%]
- Geração de Atas [3%]
- Banheiro [2%]
- Verificar o.s no nome [2%]

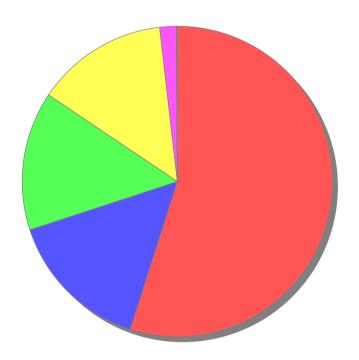

- Desenvolvimento de Requisitos [5299%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [1451%]
- Gestao de Requisitos [1395%]
- Diversos* [1328%]
- Integracao de Produto [166%]
- Gerencia de Configuracao [8%]
- Planejamento de Projeto [3%]
