

## **INDICADORES DA SPRINT**

		202	306			202	307	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	264h00m	264h15m	213h03m	264h18m	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	221h22m	269h47m	215h34m	223h40m	236h24m	235h32m	231h47m	234h56m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	180h10m	215h05m	171h13m	213h08m	174h35m	174h35m	174h50m	172h35m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	185h04m	214h13m	162h35m	170h27m	178h50m	179h52m	171h08m	160h59m
05. Pontos planejados	55,5	72,5	36,0	66,5	52,0	52,0	59,5	45,5
06. Pontos entregues	44,5	70	42	66	53	56,5	64,5	46,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	33,00	57,00	26,50	53,00	43,50	29,00	57,00	39,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	11,50	13,00	15,50	13,00	9,50	27,50	7,50	7,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	1	2	2	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	5	17	12	16	19	20	16	19
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	12	7	10	14	10	13	13	9
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	2	2	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0,5	1,5	1,5	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,309	0,338	0,211	0,313	0,298	0,298	0,341	0,264
16. Produtividade realizada	0,241	0,327	0,259	0,388	0,297	0,315	0,377	0,289
17. % Pontos NP / Pontos entregues	25,9	18,6	37	19,7	18	48,7	11,7	16,2

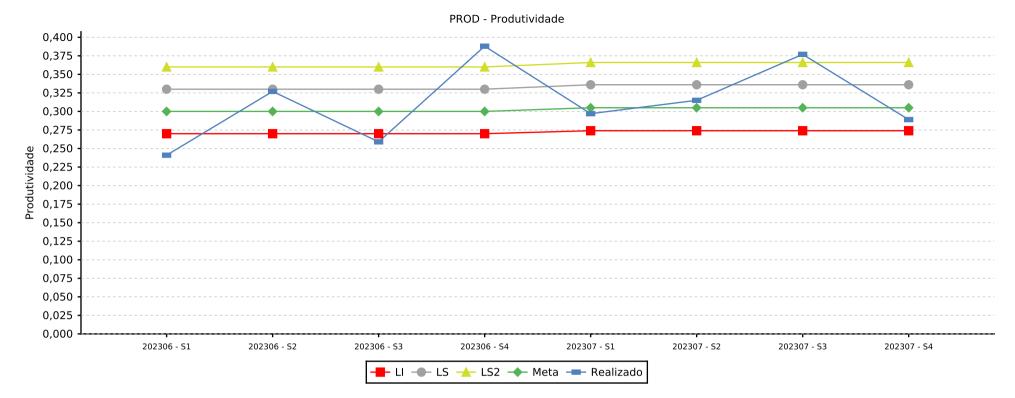


		202	306		202307				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
Realizado	0,241	0,327	0,259	0,388	0,297	0,315	0,377	0,289	
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,305	0,305	0,305	0,305	
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,366	0,366	0,366	0,366	
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,336	0,336	0,336	0,336	
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,274	0,274	0,274	0,274	

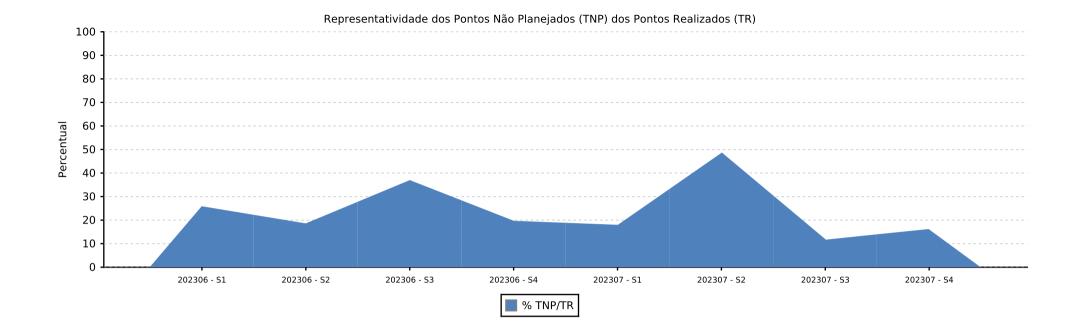


		202	306		202307				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
TR - Pontos Realizados	44.5	70	42	66	53	56.5	64.5	46.5	
TNP - Pontos Não Planejados	11.5	13	15.5	13	9.5	27.5	7.5	7.5	
% TNP/TR	25,9	18,6	37,0	19,7	18,0	48,7	11,7	16,2	

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

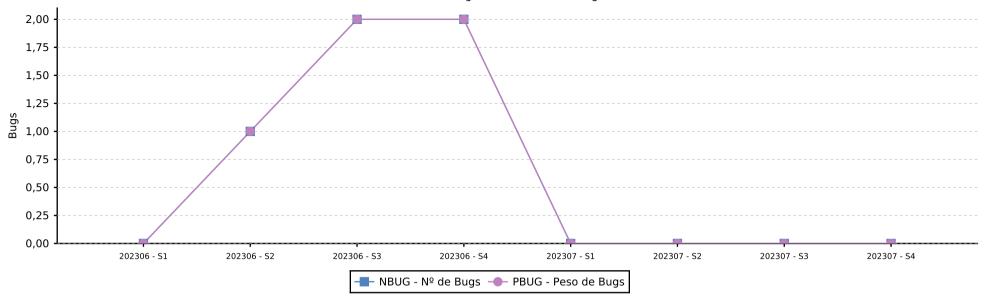

		202	306		202307				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
NBUG - Nº de Bugs	0	1	2	2	0	0	0	0	
PBUG - Peso de Bugs	0	1	2	2	0	0	0	0	
Pontos Entregues	44.5	70	42	66	53	56.5	64.5	46.5	
% PBUG / TR	0,00	1,43	4,77	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	

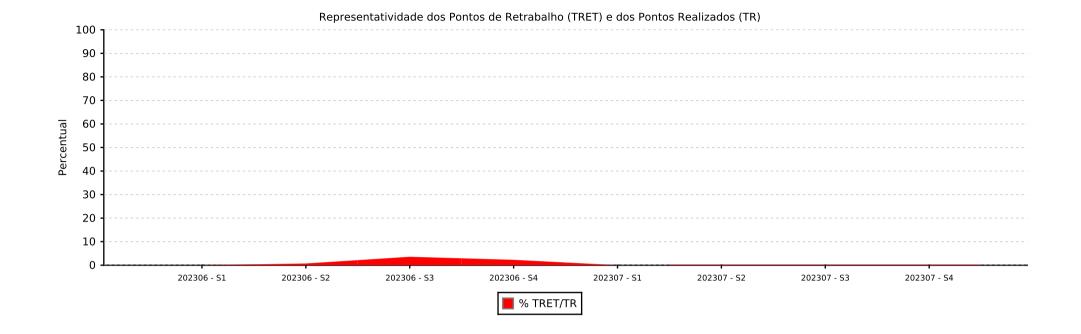


		202	306		202307				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
TR - Pontos Realizados	44.5	70	42	66	53	56.5	64.5	46.5	
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0.5	1.5	1.5	0	0	0	0	
% TRET/TR	0,0	0,7	3,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	

## **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spri	nt 1	Spri	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	132,42	143,78	132,42	139,05	132,67	134,1	128,67	126,67	526,18	543,6	103,3 %
Code Review	13	17,18	13	10,88	13	13,8	13	18,02	52	59,88	115,2 %
Daily Scrum	11	11,25	11	18,42	11	12,17	11	16,17	44	58,01	131,8 %
Analise de Sistema	8	7,72	8	9,55	8	10,65	8	9,88	32	37,8	118,1 %
Sizing	3	6,33	3	6,62	3	7,1	3	8,95	12	29	241,7 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0,0 %
Retrospectiva	5	7,5	5	6,58	5	6	5	7,5	20	27,58	137,9 %
Treinamento	0	3,08	0	9,65	0	10,9	0	5,93	0	29,56	0,0 %
Cafe	6,25	5,75	6,25	5	6	6,25	6,25	5,75	24,75	22,75	91,9 %
Atividades Gerenciais	1,33	0,15	1,33	1,35	1,33	0,5	1,33	5,15	5,32	7,15	134,4 %
Sprint Planning 1	8,5	7,58	8,5	6,5	8,5	7,08	8,5	3,75	34	24,91	73,3 %
Ginastica Laboral	4	3,05	4	2,85	4	3,08	4	3,45	16	12,43	77,7 %
Verificando apontamento	1,83	0,88	1,83	1,42	1,83	2,17	1,83	2,8	7,32	7,27	99,3 %
Auxilio ao Desenvolvimento	8,17	3,88	8,17	4,28	8,17	2,9	8,17	2,5	32,68	13,56	41,5 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	1,92	0,17	1,92	1,68	1,92	1,22	1,92	2,22	7,68	5,29	68,9 %
Atualizacao de Versao	2,17	2,42	2,17	1,12	2,17	2,42	2,17	1,55	8,68	7,51	86,5 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,25	1,33	1,25	1,33	106,4 %
Analise Retorno O.S.	0	0,08	0	0,12	0	0,37	0	1,33	0	1,9	0,0 %
Clean Code	1,75	1	1,75	1,42	1,75	1,08	1,75	1,27	7	4,77	68,1 %
Reuniao	2,67	9,35	2,67	2,07	2,67	0,33	4,67	1,25	12,68	13	102,5 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,67	0	0,67	0,23	0,67	0,28	0,67	0,88	2,68	1,39	51,9 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1,5	1,85	1,5	2,28	1,5	2	1,5	0,33	6	6,46	107,7 %
Sprint Planning 2	3,08	1,42	3,08	2,5	3,08	2,6	3,08	0,25	12,32	6,77	55,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	5	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	1,55	0	0	0	1,55	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Compilacao de sistemas	1	1,07	1	1,18	1	0,45	1	0	4	2,7	67,5 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	2,78	0	0	0	2,78	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0,33	0	0	0	0	0	0,33	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,25	0	1,25	0	1,25	0	1,25	0	5	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Outros	0	0,9	0	0,45	0	0	0	0	0	1,35	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Ausencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	220,01	236,39	220,01	235,53	220,01	231,78	220,01	234,93	880,04	938,63	106,7 %

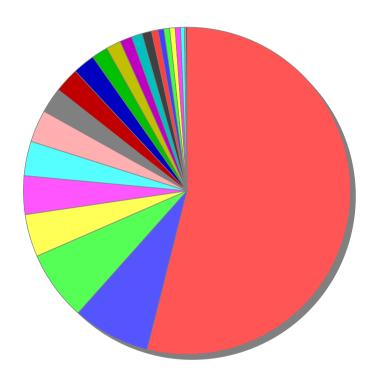

- Desenvolvimento [53.92%]
- Code Review [7.67%]
- Daily Scrum [6.88%]
- Analise de Sistema [4.21%]
- Sizing [3.81%]
- Atestado [3.41%]
- Retrospectiva [3.19%]
- Treinamento [2.52%]
- Cafe [2.45%]
- Atividades Gerenciais [2.19%]
- Sprint Planning 1 [1.6%]
- Ginastica Laboral [1.47%]
- Verificando apontamento [1.19%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.06%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.94%]
- Atualizacao de Versao [0.66%]
- Planejamento de Projeto [0.57%]
- Analise Retorno O.S. [0.57%]
- Clean Code [0.54%]
- Reuniao [0.53%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.37%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.14%]
- Sprint Planning 2 [0.11%]

## HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	To	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	147,42	148,83	147,42	146,67	147,67	139,58	143,67	133,53	586,18	568,61	97,0 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	29	35,93	29	35,88	29	31,97	29	41,68	116	145,46	125,4 %
REQM - Gestao de Requisitos		22,58	23,13	22,58	25,28	22,58	27,8	22,58	24,17	90,32	100,38	111,1 %
DIV - Diversos*		15,75	21,05	15,75	14	15,5	12,17	17,75	15,93	64,75	63,15	97,5 %
PI - Integracao de Produto		2,17	2,42	2,17	1,12	2,17	2,42	2,17	1,55	8,68	7,51	86,5 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	1,25	1,33	1,25	1,33	106,4 %
CM - Gerencia de Configuracao		1	1,07	1	1,18	1	0,45	1,5	0	4,5	2,7	60,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	217,92	232,43	217,92	224,13	217,92	214,39	217,92	218,19	871,68	889,14	102,0 %

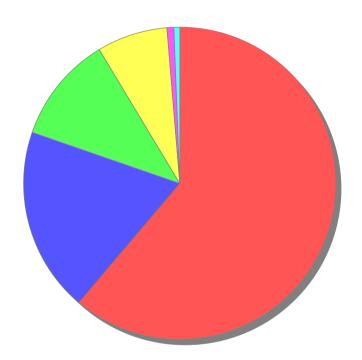


- Desenvolvimento de Requisitos [61.2%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [19.1%]
- Gestao de Requisitos [11.08%]
- Diversos\* [7.3%]
- Integracao de Produto [0.71%]
- Planejamento de Projeto [0.61%]

## **INDICADORES DO PROJETO**


	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307
01. Horas planejadas de todas atividades	1040h00m	740h49m	880h00m	798h24m	792h00m	1005h36m	880h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	872h11m	509h59m	905h31m	833h01m	795h51m	930h23m	938h39m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	894h40m	582h39m	710h05m	631h54m	588h30m	779h36m	696h35m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	667h34m	404h12m	709h15m	665h48m	628h26m	732h19m	690h49m
05. Pontos planejados para o projeto	0,0	149,5	241,5	214,0	200,0	234,0	208,0
06. Pontos planejados	187,5	103,5	201,5	201,0	230,5	230,5	209,0
07. Pontos entregues	205,5	133,5	216,5	204,5	192,5	222,5	220,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	160,00	104,50	163,50	158,00	137,50	169,50	168,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	45,50	29,00	53,00	46,50	55,00	53,00	52,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	5	5	2	2	3	5	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	61	39	54	57	35	50	74
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	56	41	34	34	50	43	45
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	4	5	2	2	3	5	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0,5	1	1	1,5	2	3,5	0
16. Produtividade planejada	0,210	0,178	0,284	0,319	0,392	0,296	0,301
17. Produtividade realizada	0,308	0,331	0,306	0,308	0,307	0,304	0,320
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	0	89,3	89,7	95,6	96,3	95,1	106,1
19. % Pontos NP / Pontos entregues	22,2	21,8	24,5	22,8	28,6	23,9	23,6

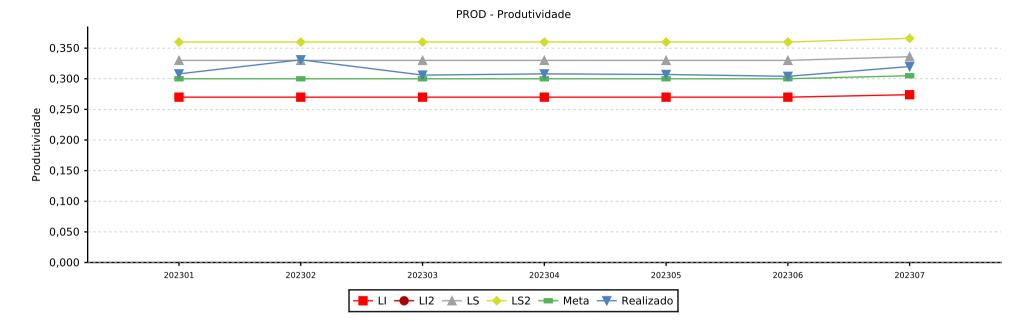


	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307
Realizado	0,308	0,331	0,306	0,308	0,307	0,304	0,320
Meta	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,305
LS2	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,366
LS	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,336
LI2							
LI	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,270	0,274

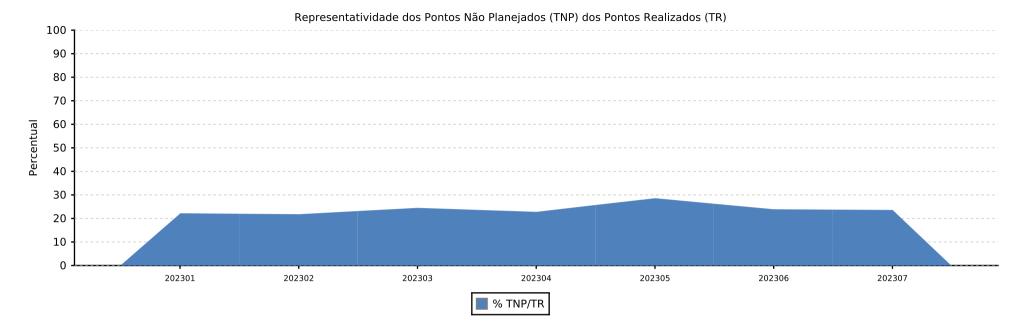


	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307
TR - Pontos Realizados	205.5	133.5	216.5	204.5	192.5	222.5	220.5
TNP - Pontos Não Planejados	45.5	29	53	46.5	55	53	52
% TNP/TR	22,2	21,8	24,5	22,8	28,6	23,9	23,6

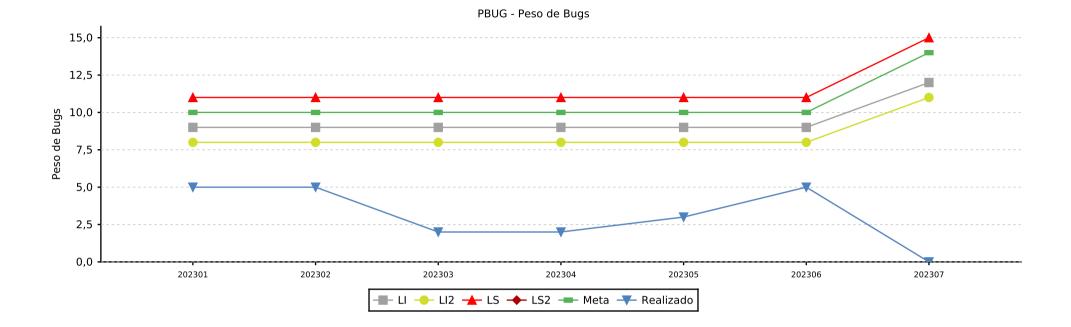


	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307
Realizado	5	5	2	2	3	5	0
Meta	10	10	10	10	10	10	14
LS2							
LS	11	11	11	11	11	11	15
LI2	8	8	8	8	8	8	11
LI	9	9	9	9	9	9	12
Pontos Entregues	205.5	133.5	216.5	204.5	192.5	222.5	220.5
% PBUG / TR	2,44	3,75	0,93	0,98	1,56	2,25	0,00

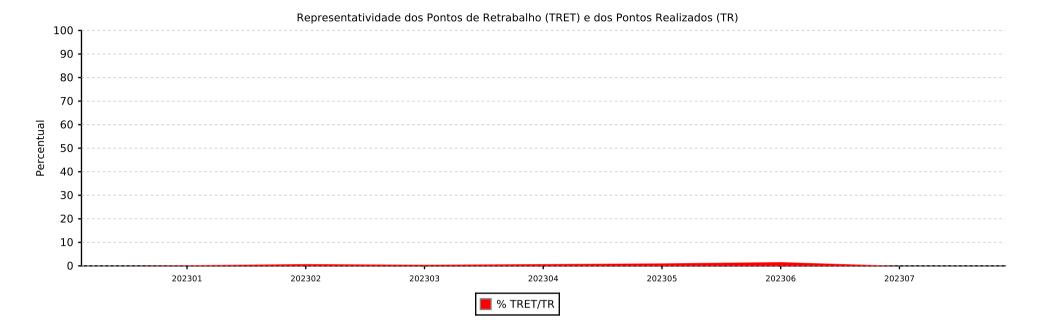


	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307
TR - Pontos Realizados	205.5	133.5	216.5	204.5	192.5	222.5	220.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	1	1	1.5	2	3.5	0
% TRET/TR	0,2	0,7	0,5	0,7	1,0	1,6	0,0

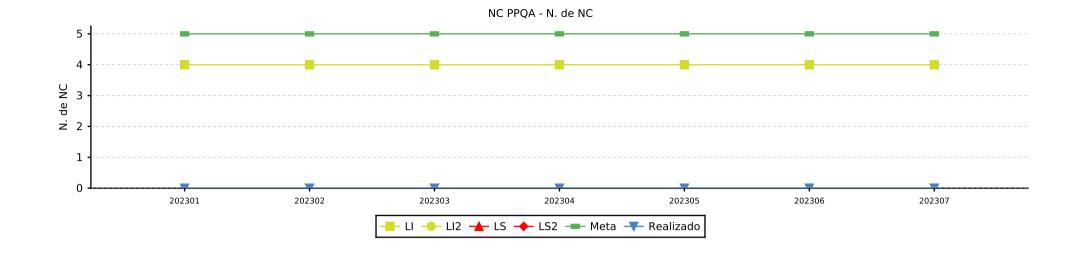


	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307
Realizado	0	0	0	0	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5
LS2							
LS							
LI2							
LI	4	4	4	4	4	4	4

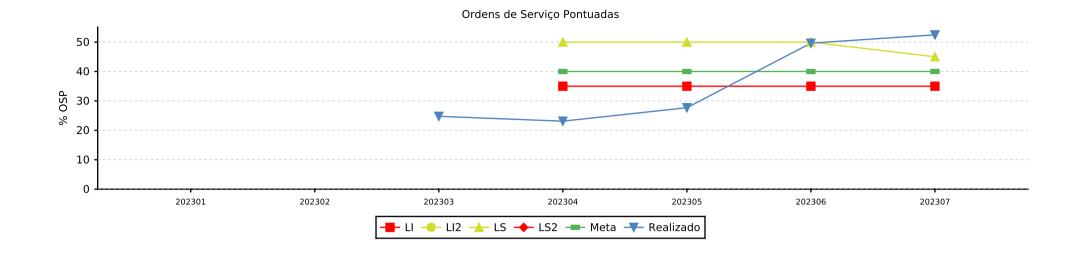

	202301	202302	202303	202304	202305	202306	202307
Realizado	0	0	24.76	23.11	27.69	49.64	52.46
Meta	0	0	0	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0
LS	0	0	0	50	50	50	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0
LI	0	0	0	35	35	35	35

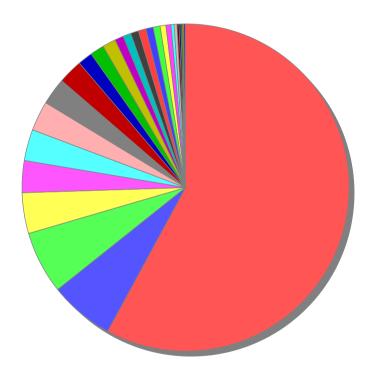

- Desenvolvimento [57.91%]
- Code Review [6.38%]
- Daily Scrum [6.18%]
- Analise de Sistema [4.03%]
- Treinamento [3.15%]
- Sizing [3.09%]
- Retrospectiva [2.94%]
- Sprint Planning 1 [2.65%]
- Cafe [2.42%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.45%]
- Reuniao [1.38%]
- Ginastica Laboral [1.32%]
- Atestado [0.85%]
- Atualizacao de Versao [0.8%]
- Verificando apontamento [0.77%]
- Atividades Gerenciais [0.76%]
- Sprint Planning 2 [0.72%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.69%]
- Oriacao de Ambiente de Desenv. [0.56%]
- Clean Code [0.51%]
- Manutenção de Servidores [0.3%]
- Compilacao de sistemas [0.29%]
- Analise Retorno O.S. [0.2%]
- Atraso / Saida antecipada [0.17%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.15%]
- Outros [0.14%]
- Planejamento de Projeto [0.14%]
- Instrutor Treinamento [0.04%]

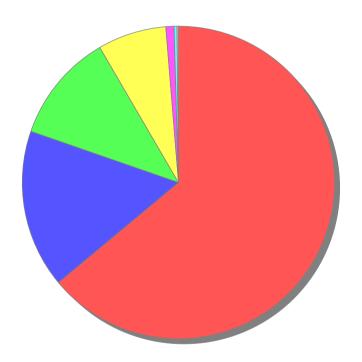

- Desenvolvimento de Requisitos [60.58%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [15.5%]
- Gestao de Requisitos [10.69%]
- Diversos\* [6.73%]
- Integracao de Produto [0.8%]
- Gerencia de Configuracao [0.29%]
- Planejamento de Projeto [0.14%]
