

INDICADORES DA SPRINT

		202	310			202	311	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m	180h00m	220h00m	220h00m	180h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	225h29m	243h53m	234h53m	236h01m	185h56m	214h17m	186h31m	160h22m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	146h15m	146h15m	146h15m	144h15m	119h05m	126h40m	112h55m	98h40m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	142h48m	143h38m	144h34m	148h39m	99h06m	157h41m	118h06m	93h44m
05. Pontos planejados	30,0	47,0	42,5	54,0	43,0	45,5	33,0	31,5
06. Pontos entregues	42	44	41,5	65	25	57,5	47	36
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	23,00	28,00	34,00	44,50	10,00	42,50	42,00	27,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	19,00	16,00	7,50	20,50	15,00	15,00	5,00	9,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	1	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	12	10	10	12	7	10	10	8
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	16	20	11	21	13	9	9	8
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	1	1	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	1	1	0,5	3,5	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,206	0,322	0,291	0,375	0,362	0,360	0,293	0,320
16. Produtividade realizada	0,295	0,307	0,288	0,438	0,253	0,365	0,398	0,385
17. % Pontos NP / Pontos entregues	45,3	36,4	18,1	31,6	60	26,1	10,7	25

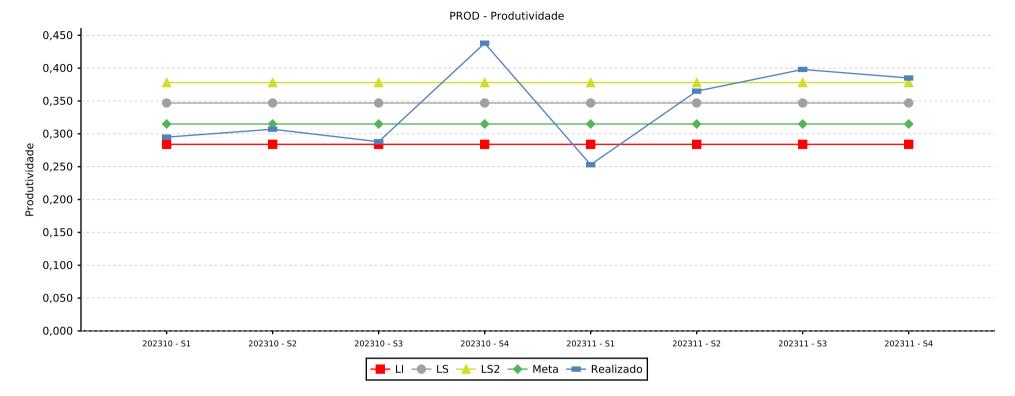


		202	310			202	311	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,295	0,307	0,288	0,438	0,253	0,365	0,398	0,385
Meta	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315	0,315
LS2	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378	0,378
LS	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347	0,347
LI	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284	0,284

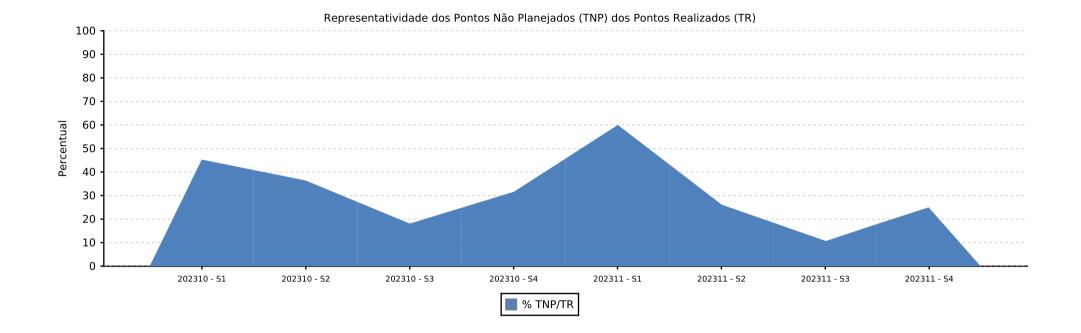


		202	310			202	311	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	42	44	41.5	65	25	57.5	47	36
TNP - Pontos Não Planejados	19	16	7.5	20.5	15	15	5	9
% TNP/TR	45,3	36,4	18,1	31,6	60,0	26,1	10,7	25,0

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

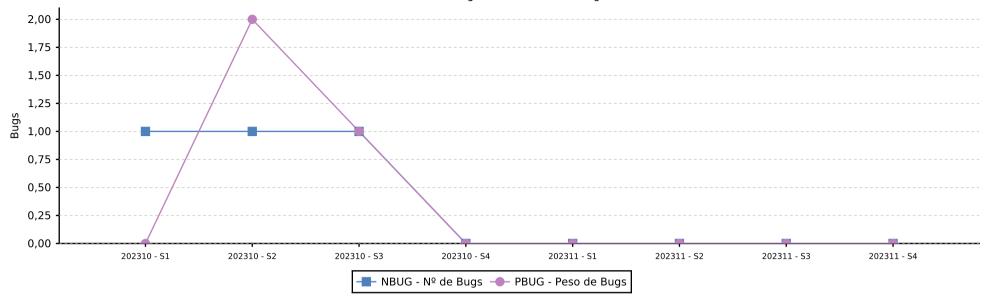

		202	310	-		202	311	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	1	1	1	0	0	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	2	1	0	0	0	0	0
Pontos Entregues	42	44	41.5	65	25	57.5	47	36
% PBUG / TR	0,00	4,55	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

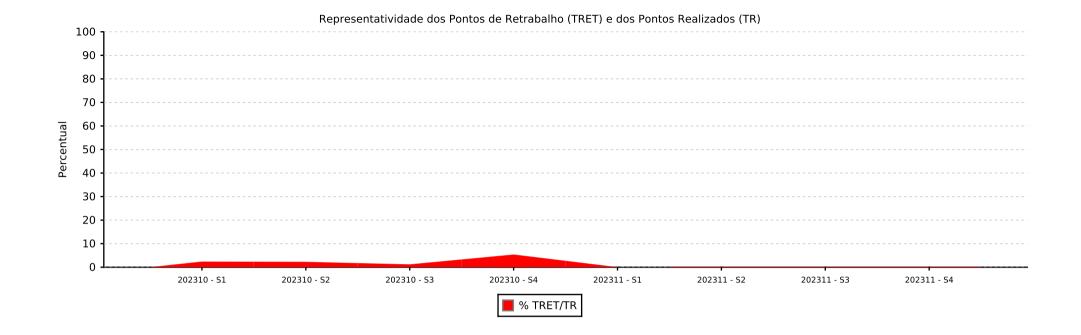


		202	310			202	311	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	42	44	41.5	65	25	57.5	47	36
TRET - Pontos de Retrabalho	1	1	0.5	3.5	0	0	0	0
% TRET/TR	2,4	2,3	1,2	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	% HP/HR	
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	86,75	85,75	91,92	131,93	83,67	106,47	69	82,6	331,34	406,75	122,8 %
Treinamento	17,5	19,92	20,5	9,5	20,17	20,48	17,33	18,9	75,5	68,8	91,1 %
Code Review	11	20,17	11,33	14,68	10,33	10,22	8,5	12,73	41,16	57,8	140,4 %
Analise de Sistema	10,5	10,85	9,92	11,47	9,25	11,73	9,33	10,57	39	44,62	114,4 %
Reuniao	2	1,33	2,67	1,5	2,67	4,98	3,83	6,33	11,17	14,14	126,6 %
Daily Scrum	10	3,08	11,83	8,75	10,5	5,33	8,67	5,75	41	22,91	55,9 %
Cafe	5,25	4,75	5,5	5,5	5	5,25	4,5	4,5	20,25	20	98,8 %
Sizing	3	6,47	6	3	6	6,93	3	4,5	18	20,9	116,1 %
Atualizacao de Versao	2	1,6	2,5	6,75	2,5	3,63	2	2,37	9	14,35	159,4 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,5	0	0,5	0	0,33	0	0,5	2,3	1,83	2,3	125,7 %
Atividades Gerenciais	1,33	2,95	1,33	0,25	1,33	0	1,83	1,92	5,82	5,12	88,0 %
Ginastica Laboral	3,17	2,67	3,5	2,83	3,33	2,67	2,83	1,67	12,83	9,84	76,7 %
Verificando apontamento	1,92	2,17	1,75	1	1,5	1,28	1,58	0,95	6,75	5,4	80,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	2	2,38	2	2,68	2	3,42	2	0,85	8	9,33	116,6 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,33	0,83	1,33	0,83	62,4 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	1,5	2,45	1,58	0,17	0,92	1,02	1,5	0,75	5,5	4,39	79,8 %
Retrospectiva	5,83	5	5,83	4,58	4,67	1,83	4,67	0,75	21	12,16	57,9 %
Outros	0	2,87	0	3,35	0	0,43	0	0,5	0	7,15	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0,0 %
Sprint Planning 1	7	2,08	7	4,17	5,5	0,67	5,5	0,42	25	7,34	29,4 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1	0,58	1	0	1	0	1	0,35	4	0,93	23,2 %
Sprint Planning 2	2,25	0,83	2,25	0,83	1,75	0,17	1,75	0,17	8	2	25,0 %
Geração de Atas	0,25	0,08	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0,17	1	0,5	50,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	5,23	0	0	0	0	0	0	0	5,23	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Abrir o.s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo		1,25	0	1,25	0	1	0	1,25	0	4,75	0	0,0 %
Particular		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome		0	0	0	0,17	0	0	0	0	0	0,17	0,0 %
Documentação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Ausencia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno		1,25	0	1,25	0	1	0	1,25	0	4,75	0	0,0 %
Clean Code		1,75	0,17	1,83	0,5	1,33	0	1,75	0	6,66	0,67	10,1 %
Teste Automatizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias		0	0	26	0	44	0	24	0	94	0	0,0 %
Manutenção Preventiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada		0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,0 %
Levantamento de Requisito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas		1	0	0,5	0,42	0	0	0,33	0	1,83	0,42	23,0 %
Feriado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.		0	2,35	0	0	0	0	0	0	0	2,35	0,0 %
Analise de O.S		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	180	185,93	219,99	214,28	220	186,51	179,98	160,38	799,97	747,1	93,4 %

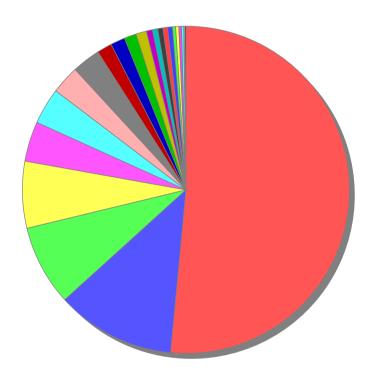

- Desenvolvimento [51.51%]
- Treinamento [11.79%]
- Code Review [7.94%]
- Analise de Sistema [6.59%]
- Reuniao [3.95%]
- Daily Scrum [3.59%]
- Cafe [2.81%]
- Sizing [2.81%]
- Atualizacao de Versao [1.48%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [1.43%]
- Atividades Gerenciais [1.2%]
- Ginastica Laboral [1.04%]
- Verificando apontamento [0.59%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.53%]
- Planejamento de Projeto [0.52%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.47%]
- Retrospectiva [0.47%]
- Outros [0.31%]
- Manutenção de Servidores [0.31%]
- Sprint Planning 1 [0.26%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.22%]
- Sprint Planning 2 [0.11%]
- Geração de Atas [0.11%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	To	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	S	94	88,95	99,33	132,6	89,25	107,48	76,25	86	358,83	415,03	115,7 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	26,83	28,25	29	28,02	25,5	17,38	21,83	19,23	103,16	92,88	90,0 %
DIV - Diversos*		13,75	16,95	15	16,12	14,33	16,75	15	15,77	58,08	65,59	112,9 %
REQM - Gestao de Requisitos		22,75	22,58	25,17	19,47	22,5	19,5	19,58	15,65	90	77,2	85,8 %
PI - Integracao de Produto		2	1,6	2,5	6,75	2,5	3,63	2	2,37	9	14,35	159,4 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	1,33	0,83	1,33	0,83	62,4 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	5,23	0	0	0	0	0	0	0	5,23	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		1	0	0,5	0,42	0	0	0,83	0	2,33	0,42	18,0 %
	Total Geral	160,33	163,56	171,5	203,38	154,08	164,74	136,82	139,85	622,73	671,53	107,8 %

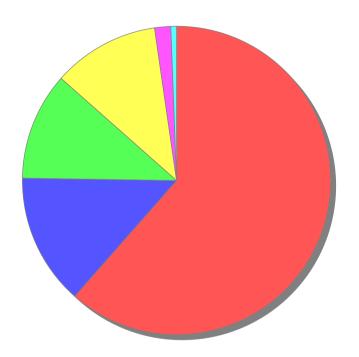


- Desenvolvimento de Requisitos [61.49%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [13.75%]
- Diversos* [11.28%]
- Gestao de Requisitos [11.19%]
- Integracao de Produto [1.69%]
- O Planejamento de Projeto [0.59%]

INDICADORES DO PROJETO


	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311
01. Horas planejadas de todas atividades	798h24m	792h00m	1005h36m	880h00m	880h00m	792h00m	880h00m	800h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	833h01m	795h51m	930h23m	938h39m	950h28m	824h44m	940h16m	747h06m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	631h54m	588h30m	779h36m	696h35m	653h50m	580h10m	583h00m	457h20m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	665h48m	628h26m	732h19m	690h49m	708h03m	518h09m	579h39m	468h37m
05. Pontos planejados para o projeto	214,0	200,0	234,0	208,0	200,0	176,0	180,0	144,0
06. Pontos planejados	201,0	230,5	230,5	209,0	244,0	187,0	173,5	153,0
07. Pontos entregues	204,5	192,5	222,5	220	220	166,5	192,5	165,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	158,00	137,50	169,50	168,00	167,50	142,50	129,50	121,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	46,50	55,00	53,00	52,00	52,50	24,00	63,00	44,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	2	3	5	1	4	0	3	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	57	35	50	73	60	50	44	35
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	34	50	43	45	57	36	68	39
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	2	3	5	1	4	0	3	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	1,5	2	3,5	0,5	1,5	0	6	0
16. Produtividade planejada	0,319	0,392	0,296	0,301	0,374	0,323	0,298	0,335
17. Produtividade realizada	0,308	0,307	0,304	0,319	0,311	0,322	0,333	0,354
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	95,6	96,3	95,1	105,8	110	94,7	107	115
19. % Pontos NP / Pontos entregues	22,8	28,6	23,9	23,7	23,9	14,5	32,8	26,6

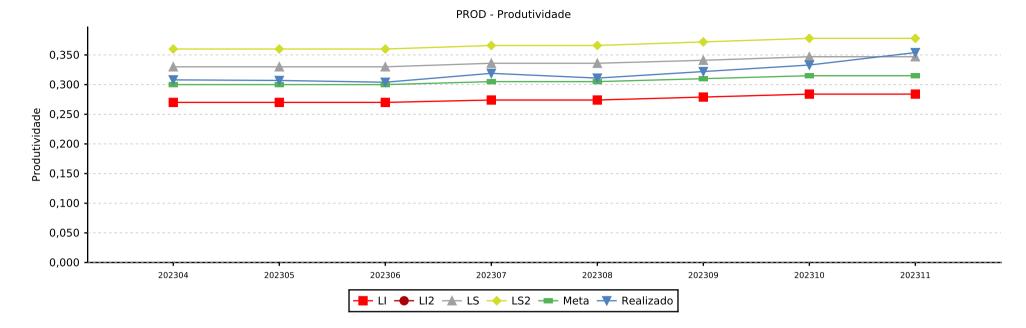


	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311
Realizado	0,308	0,307	0,304	0,319	0,311	0,322	0,333	0,354
Meta	0,300	0,300	0,300	0,305	0,305	0,310	0,315	0,315
LS2	0,360	0,360	0,360	0,366	0,366	0,372	0,378	0,378
LS	0,330	0,330	0,330	0,336	0,336	0,341	0,347	0,347
LI2								
LI	0,270	0,270	0,270	0,274	0,274	0,279	0,284	0,284

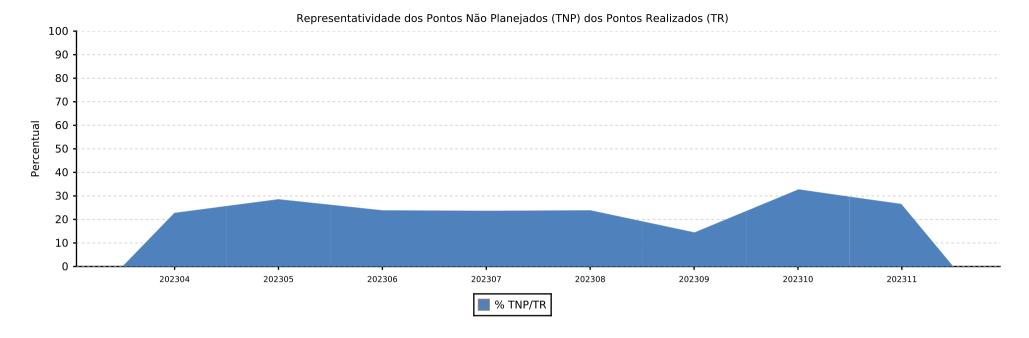


	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311
TR - Pontos Realizados	204.5	192.5	222.5	220	220	166.5	192.5	165.5
TNP - Pontos Não Planejados	46.5	55	53	52	52.5	24	63	44
% TNP/TR	22,8	28,6	23,9	23,7	23,9	14,5	32,8	26,6

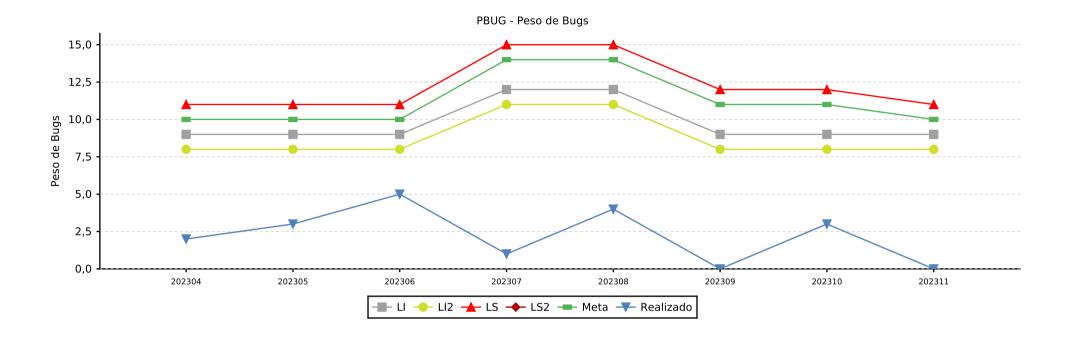


	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311
Realizado	2	3	5	1	4	0	3	0
Meta	10	10	10	14	14	11	11	10
LS2								
LS	11	11	11	15	15	12	12	11
LI2	8	8	8	11	11	8	8	8
LI	9	9	9	12	12	9	9	9
Pontos Entregues	204.5	192.5	222.5	220	220	166.5	192.5	165.5
% PBUG / TR	0,98	1,56	2,25	0,46	1,82	0,00	1,56	0,00

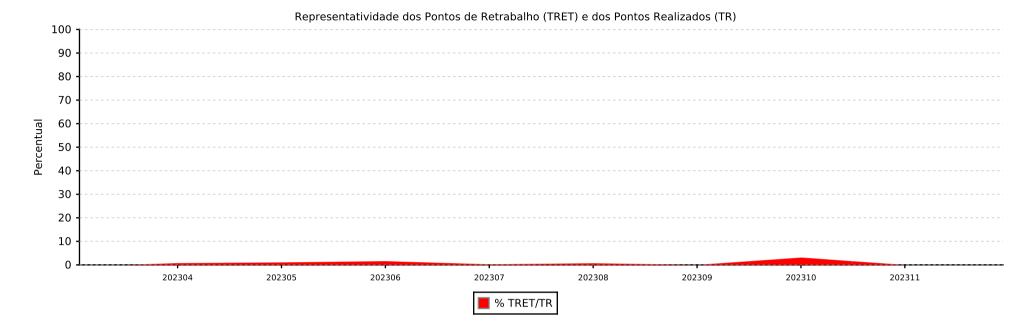

	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311
TR - Pontos Realizados	204.5	192.5	222.5	220	220	166.5	192.5	165.5
TRET - Pontos de Retrabalho	1.5	2	3.5	0.5	1.5	0	6	0
% TRET/TR	0,7	1,0	1,6	0,2	0,7	0,0	3,1	0,0

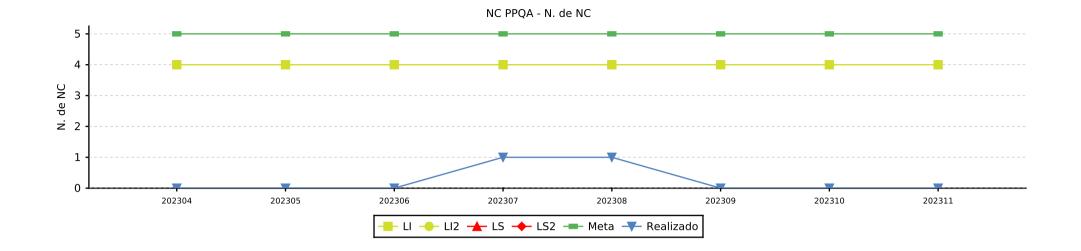

	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311
Realizado	0	0	0	1	1	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

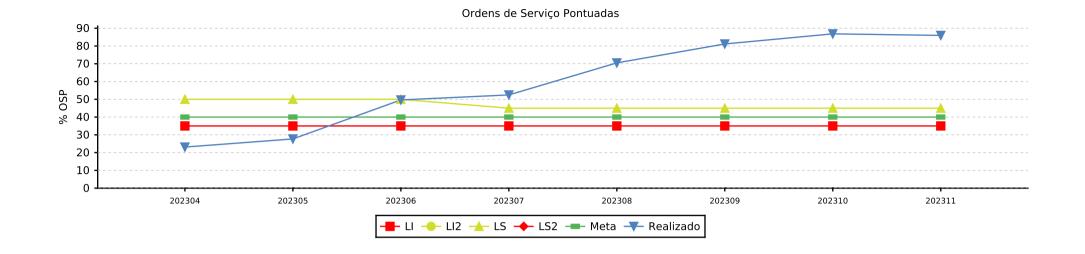


	202304	202305	202306	202307	202308	202309	202310	202311
Realizado	23.11	27.69	49.64	52.46	70.5	81.15	86.83	85.96
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	50	50	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

Desenvolvimento [54.44%]

Verificar o.s no nome [0.02%]

- Treinamento [9.21%]
- Code Review [7.74%]
- Analise de Sistema [5.97%]
- Daily Scrum [3.07%]
- Sizing [2.8%]
- Cafe [2.68%]
- Atualizacao de Versao [1.92%]
- Reuniao [1.89%]
- Retrospectiva [1.63%]
- Ginastica Laboral [1.32%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [1.25%]
- Sprint Planning 1 [0.98%]
- Outros [0.96%]
- Verificando apontamento [0.72%]
- Curso/Palestra [0.7%]
- Atividades Gerenciais [0.69%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.59%]
- Analise Retorno O.S. [0.31%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.31%]
- Sprint Planning 2 [0.27%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.12%]
- Planejamento de Projeto [0.11%]
- Clean Code [0.09%]
- Geração de Atas [0.07%]
- Manutenção de Servidores [0.07%]
- Compilacao de sistemas [0.06%]
- Atraso / Saida antecipada [0.03%]

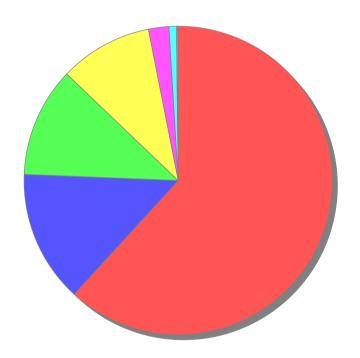

- Desenvolvimento de Requisitos [55.55%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [12.43%]
- Gestao de Requisitos [10.33%]
- Diversos* [8.78%]
- Integracao de Produto [1.92%]
- Treinamento na Organizacao [0.7%]
- Planejamento de Projeto [0.11%]
- Gerencia de Configuração [0.06%]
