

INDICADORES DA SPRINT

		202	506			202	507	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	264h00m	264h00m	264h00m	264h00m	216h00m	264h00m	264h00m	264h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	298h02m	284h25m	280h08m	282h48m	229h19m	277h43m	278h11m	280h45m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	197h15m	197h15m	197h15m	197h05m	156h55m	195h20m	195h20m	195h10m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	209h55m	197h23m	167h54m	148h04m	163h43m	164h15m	154h49m	148h31m
05. Pontos planejados	53,0	74,5	58,0	63,0	62,0	70,0	66,0	71,5
06. Pontos entregues	57	42,5	57	60	33	51,5	44	62
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	47,50	39,50	47,50	54,00	29,50	48,00	38,00	46,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	9,50	3,00	9,50	6,00	3,50	3,50	6,00	15,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	6	0	2	1	3
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	10	9	13	10	9	13	6	8
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	3	3	5	8	3	4	7	8
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	2	0	2	1	1
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	4h10m	1h40m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	2	0	3	1	0,5
15. Produtividade planejada	0,269	0,378	0,295	0,320	0,396	0,359	0,338	0,367
16. Produtividade realizada	0,272	0,216	0,340	0,406	0,202	0,314	0,285	0,418
17. % Pontos NP / Pontos entregues	16,7	7,1	16,7	10	10,7	6,8	13,7	25

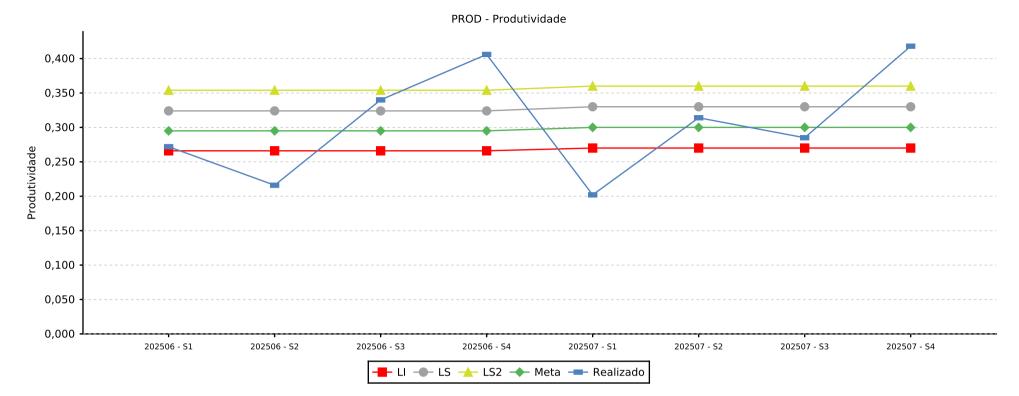


		202	506		202507					
	1	1 2 3 4				2	3	4		
Realizado	0,272	0,216	0,340	0,406	0,202	0,314	0,285	0,418		
Meta	0,295	0,295	0,295	0,295	0,300	0,300	0,300	0,300		
LS2	0,354	0,354	0,354	0,354	0,360	0,360	0,360	0,360		
LS	0,324	0,324	0,324	0,324	0,330	0,330	0,330	0,330		
LI	0,266	0,266	0,266	0,266	0,270	0,270	0,270	0,270		

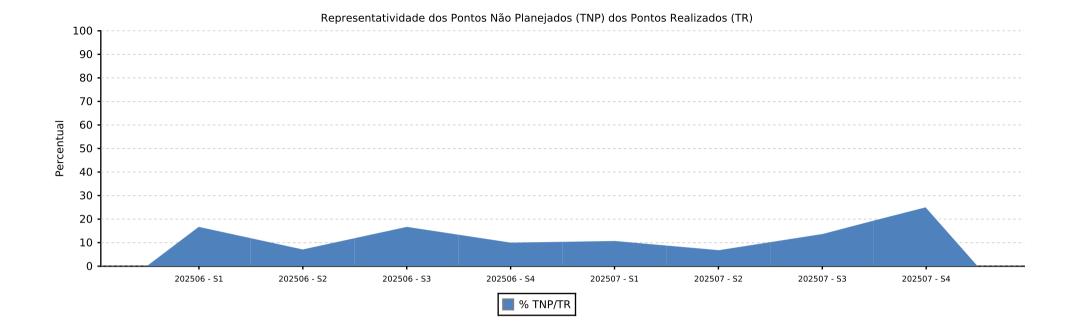


		202	506			202	507	
	1	1 2 3 4 1 2					3	4
TR - Pontos Realizados	57	42.5	57	60	33	51.5	44	62
TNP - Pontos Não Planejados	9.5	3	9.5	6	3.5	3.5	6	15.5
% TNP/TR	16,7	16,7 7,1 16,7 10,0 10,7 6,8 13,7 2						

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

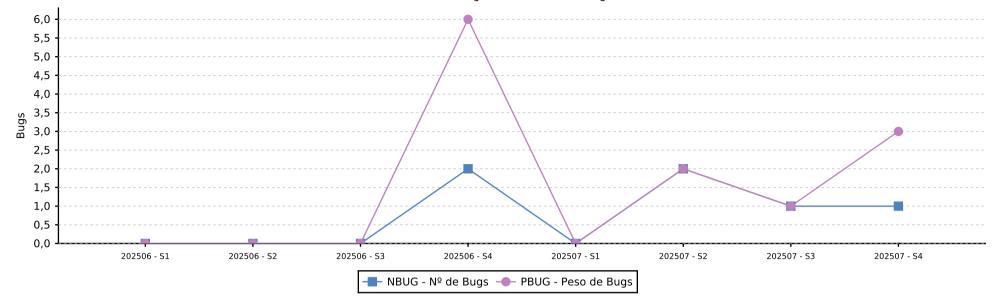

		202	506		202507				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	2	0	2	1	1	
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	6	0	2	1	3	
Pontos Entregues	57	42.5	57	60	33	51.5	44	62	
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	3,89	2,28	4,84	

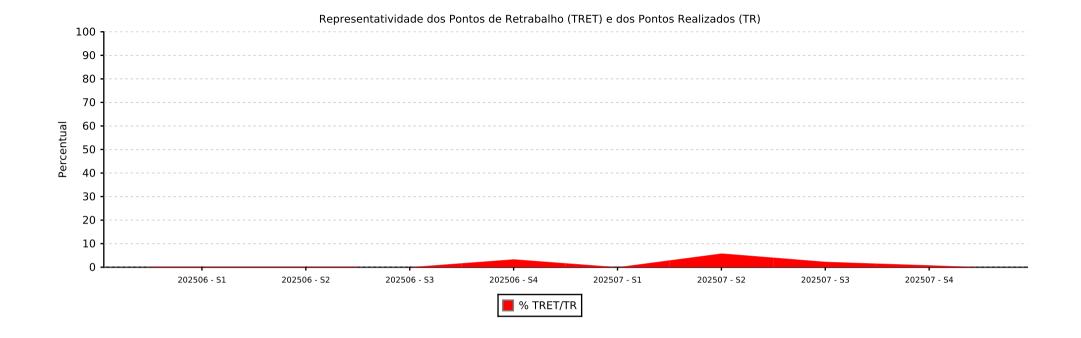


		202	506			202	507	
	1	1 2 3 4 1 2						4
TR - Pontos Realizados	57	42.5	57	60	33	51.5	44	62
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	2	0	3	1	0.5
% TRET/TR	0,0	0,0 0,0 0,0 3,3 0,0 5,8 2,3						0,8

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	nt 1	Spr	int 2	Spr	int 3	Spri	int 4	То	Total	
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	126	146,8	161,5	136,35	159,12	131,08	159,83	123,73	606,45	537,96	88,7 %
Code Review	14	13,3	17	32,75	17	14,2	17	34,62	65	94,87	146,0 %
Analise de Sistema	16,08	21,93	19,08	31,68	19,08	45,27	19,08	33,72	73,32	132,6	180,9 %
Outros	0,17	0	0,17	0,58	0,17	1,22	0,17	24	0,68	25,8	3.794,1
Cafe	6,75	5,87	7,5	7,55	7,5	7,08	7,5	7,03	29,25	27,53	94,1 %
Retrospectiva	6	4,5	6	2,33	6	2	6	7	24	15,83	66,0 %
Reuniao	2,17	3,87	3,67	2,67	3,67	7,45	3,83	6,75	13,34	20,74	155,5 %
Sizing	5	0	6	0	6	12,17	6	5,75	23	17,92	77,9 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	3,42	3,97	3,42	3,5	3,42	2,65	3,42	4,8	13,68	14,92	109,1 %
Ginastica Laboral	4,83	3,83	5	4,2	5	4,73	5	4,53	19,83	17,29	87,2 %
Atualizacao de Versao	3	0	4	3,72	4	5,2	4	4,3	15	13,22	88,1 %
Daily Scrum	6,92	4,83	8,83	8,45	8,83	9,95	8,83	3,92	33,41	27,15	81,3 %
Ausencia	0	3,57	0	4,65	0	15,88	0	3,17	0	27,27	0,0 %
Sprint Planning 1	6	2	6	5,83	6	1,67	6	3	24	12,5	52,1 %
Analise de O.S	0,83	0,73	0,83	1,42	0,83	4,67	0,83	2,8	3,32	9,62	289,8 %
Sprint Planning 2	3	1,58	3	2,4	3	1,25	3	2,5	12	7,73	64,4 %
Verificando apontamento	2,17	1,25	2,33	0,87	2,33	3,68	2,33	2,38	9,16	8,18	89,3 %
Clean Code	2,5	2	2,5	0	2,5	0,5	2,5	2,17	10	4,67	46,7 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,5	1,03	1,5	1,03	68,7 %
Atividades Gerenciais	1	0,63	1	0,42	1	2,2	1	0,92	4	4,17	104,2 %
Auxilio ao Desenvolvimento	2	1,58	2	1	2	1,5	2	0,87	8	4,95	61,9 %
Compilacao de sistemas	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0,77	2	0,77	38,5 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0,67	0	0,67	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	3,65	1	1,17	1	0,97	1	0,17	4	5,96	149,0 %
Banheiro	0	0	0	0,48	0	0,12	0	0,17	0	0,77	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	1,5	0	15,75	0	0	0	0	0	17,25	0,0 %
Correção de Erros Interno	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0,17	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0,17	17,0 %


Release Notes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento		0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Manutenção de Servidores		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline		0	0,33	0	0	0	0	0	0	0	0,33	0,0 %
Atividade Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review		0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes		0,33	0,75	0,33	2,95	0,33	0,58	0,33	0	1,32	4,28	324,2 %
Abrir o.s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo		0,5	0	0,5	4,17	2,88	1,67	0,5	0	4,38	5,84	133,3 %
Particular		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.		0,33	0,58	0,33	1,42	0,33	0	0,33	0	1,32	2	151,5 %
Auditoria de DD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome		0	0,08	0	0	0	0	0	0	0	0,08	0,0 %
Documentação		0	0	0	1,42	0	0	0	0	0	1,42	0,0 %
Gerenciamento de Rede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	216	229,3	263,99	277,73	263,99	278,19	263,98	280,77	1.007,96	1.065,99	105,8 %

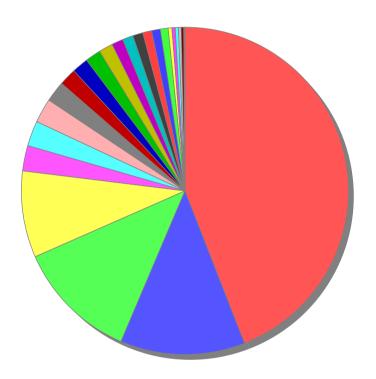

- Desenvolvimento [44.07%]
- Code Review [12.33%]
- Analise de Sistema [12.01%]
- Outros [8.55%]
- Cafe [2.5%]
- Retrospectiva [2.49%]
- Reuniao [2.4%]
- Sizing [2.05%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.71%]
- Ginastica Laboral [1.61%]
- Atualizacao de Versao [1.53%]
- Daily Scrum [1.4%]
- Ausencia [1.13%]
- Sprint Planning 1 [1.07%]
- Analise de O.S [1%]
- Sprint Planning 2 [0.89%]
- Verificando apontamento [0.85%]
- Clean Code [0.77%]
- Planejamento de Projeto [0.37%]
- Atividades Gerenciais [0.33%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.31%]
- Compilacao de sistemas [0.27%]
- Analise Retorno O.S. [0.24%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.06%]
- Banheiro [0.06%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	135,75	155,1	171,25	147,97	171,25	137,98	169,58	131,57	647,83	572,62	88,4 %
DIV - Diversos*		16,25	22	18,67	22,65	18,67	39,53	18,83	46,57	72,42	130,75	180,5 %
REQM - Gestao de Requisitos		30,08	25,52	34,08	39,92	34,08	60,35	34,08	45,63	132,32	171,42	129,5 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	26,92	22,63	31,83	43,53	31,83	26,15	31,83	45,53	122,41	137,84	112,6 %
PI - Integracao de Produto		3	0	4	3,72	4	5,2	4	4,3	15	13,22	88,1 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	1,5	1,03	1,5	1,03	68,7 %
CM - Gerencia de Configuracao		0,5	0,33	0,5	0	0,5	0	0,5	0,77	2	1,1	55,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	212,5	225,58	260,33	257,79	260,33	269,21	260,32	275,4	993,48	1.027,98	103,5 %

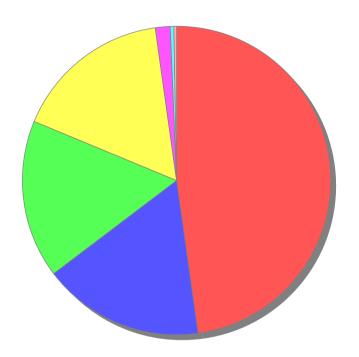


- Desenvolvimento de Requisitos [47.77%]
- Diversos* [16.91%]
- Gestao de Requisitos [16.57%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [16.53%]
- Integracao de Produto [1.56%]
- Planejamento de Projeto [0.37%]
- Gerencia de Configuracao [0.28%]

INDICADORES DO PROJETO


	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
01. Horas planejadas de todas atividades	922h00m	854h00m	1176h00m	968h00m	734h00m	700h00m	1056h00m	1008h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	968h44m	924h35m	1227h32m	990h22m	749h59m	737h25m	1145h23m	1065h58m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	669h35m	627h10m	887h30m	740h15m	560h25m	505h40m	788h50m	742h45m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	630h15m	596h30m	757h47m	605h07m	458h21m	450h32m	723h16m	631h18m
05. Pontos planejados para o projeto	194,0	180,0	256,0	218,0	165,0	148,0	232,0	218,0
06. Pontos planejados	199,0	242,0	314,0	276,5	179,5	153,5	248,5	269,5
07. Pontos entregues	183	173,5	228	178,5	140,5	134	216,5	190,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	150,00	134,00	200,00	147,00	134,00	120,50	188,50	162,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	33,00	39,50	28,00	31,50	6,50	13,50	28,00	28,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	6	6	3	3	3	0	6	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	52	49	53	47	30	30	42	36
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	23	23	22	21	6	13	19	22
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	2	2	1	1	1	0	2	4
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	1h55m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	5h50m
15. Pontos de retrabalho	2,5	4,5	1,5	2,5	1	0	2	4,5
16. Produtividade planejada	0,298	0,386	0,354	0,374	0,321	0,304	0,316	0,363
17. Produtividade realizada	0,291	0,291	0,301	0,295	0,307	0,298	0,300	0,302
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	94,4	96,4	89,1	81,9	85,2	90,6	93,4	87,4
19. % Pontos NP / Pontos entregues	18,1	22,8	12,3	17,7	4,7	10,1	13	15

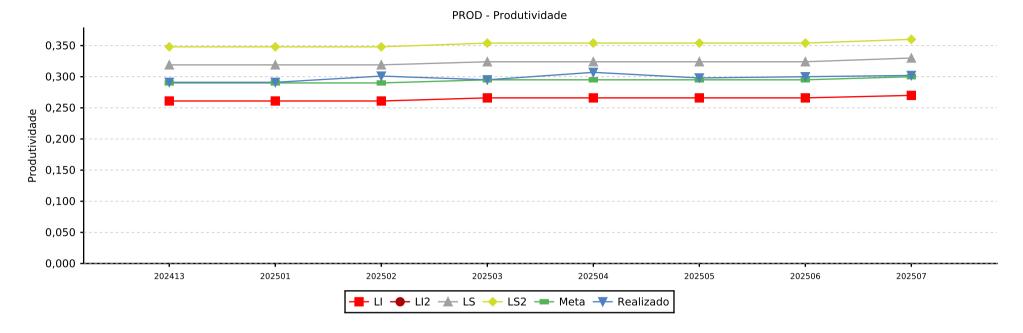


	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
Realizado	0,291	0,291	0,301	0,295	0,307	0,298	0,300	0,302
Meta	0,290	0,290	0,290	0,295	0,295	0,295	0,295	0,300
LS2	0,348	0,348	0,348	0,354	0,354	0,354	0,354	0,360
LS	0,319	0,319	0,319	0,324	0,324	0,324	0,324	0,330
LI2								
LI	0,261	0,261	0,261	0,266	0,266	0,266	0,266	0,270

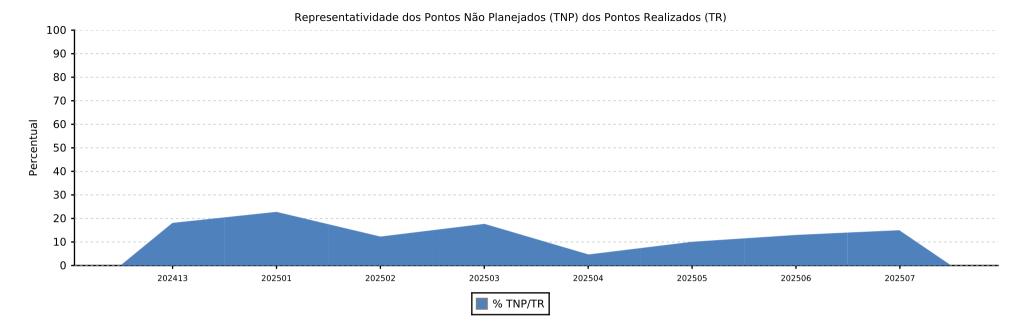


	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
TR - Pontos Realizados	183	173.5	228	178.5	140.5	134	216.5	190.5
TNP - Pontos Não Planejados	33	39.5	28	31.5	6.5	13.5	28	28.5
% TNP/TR	18,1	22,8	12,3	17,7	4,7	10,1	13,0	15,0

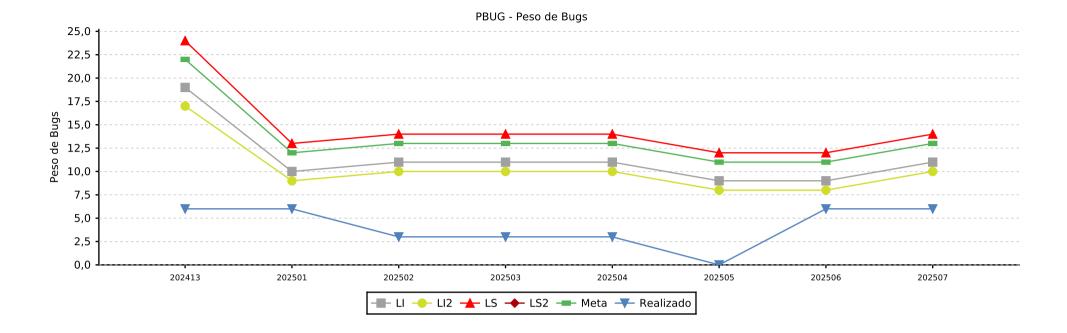


	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
Realizado	6	6	3	3	3	0	6	6
Meta	22	12	13	13	13	11	11	13
LS2								
LS	24	13	14	14	14	12	12	14
LI2	17	9	10	10	10	8	8	10
LI	19	10	11	11	11	9	9	11
Pontos Entregues	183	173.5	228	178.5	140.5	134	216.5	190.5
% PBUG / TR	3,28	3,46	1,32	1,69	2,14	0,00	2,78	3,15

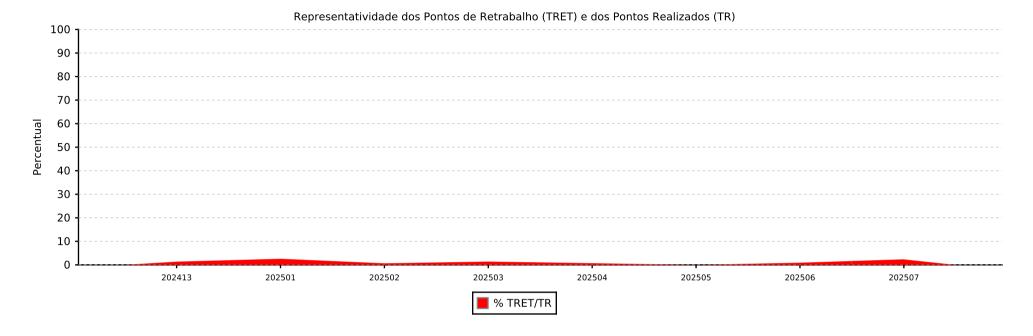

	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
TR - Pontos Realizados	183	173.5	228	178.5	140.5	134	216.5	190.5
TRET - Pontos de Retrabalho	2.5	4.5	1.5	2.5	1	0	2	4.5
% TRET/TR	1,4	2,6	0,7	1,4	0,7	0,0	0,9	2,4

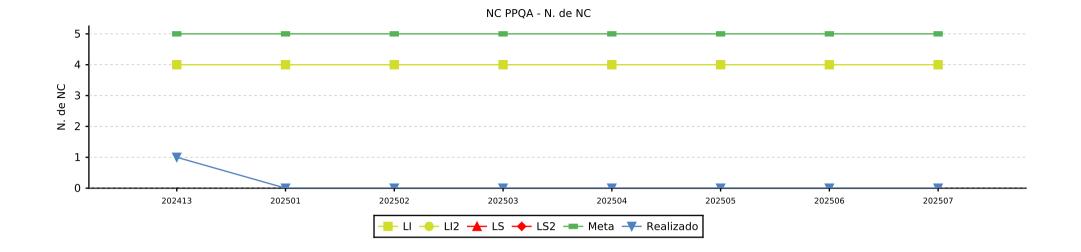

	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
Realizado	1	0	0	0	0	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

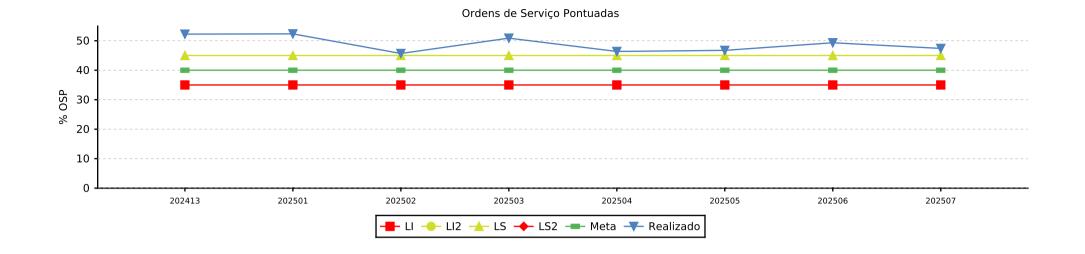


	202413	202501	202502	202503	202504	202505	202506	202507
Realizado	52.25	52.34	45.68	50.89	46.37	46.74	49.32	47.4
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [50.47%]
- Analise de Sistema [12.44%]
- Code Review [8.9%]
- Ocafe [2.58%]
- Ausencia [2.56%]
- Daily Scrum [2.55%]
- Outros [2.42%]
- Reuniao [1.94%]
- Sizing [1.68%]
- Ginastica Laboral [1.62%]
- Atestado [1.62%]
- Retrospectiva [1.49%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.4%]
- Atualizacao de Versao [1.24%]
- Sprint Planning 1 [1.17%]
- Analise de O.S [0.9%]
- Verificando apontamento [0.77%]
- Sprint Planning 2 [0.73%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.56%]
- Correcao de Erros Externo [0.55%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.46%]
- Clean Code [0.44%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.4%]
- Atividades Gerenciais [0.39%]
- Merge O.S. [0.19%]
- Documentação [0.13%]
- Planejamento de Projeto [0.1%]
- Banheiro [0.07%]

- Compilação de sistemas [0.07%]
- Analise Retorno O.S. [0.06%]
- Auxilio Review [0.05%]
- Geracao de Baseline [0.03%]
- O Geração de Atas [0.02%]
- Verificar o.s no nome [0.01%]

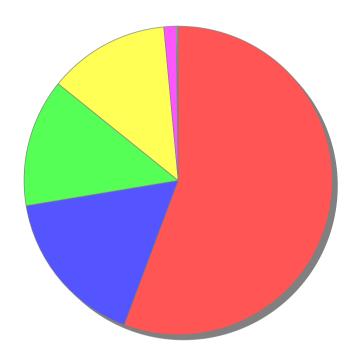

- Desenvolvimento de Requisitos [53.72%]
- Gestao de Requisitos [16.08%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [12.93%]
- Diversos* [12.27%]
- Integracao de Produto [1.24%]
- Gerencia de Configuracao [0.1%]
- Planejamento de Projeto [0.1%]
