

INDICADORES DA SPRINT

		202	401			202	402	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	287h12m	388h00m	388h00m	388h00m	380h00m	388h00m	260h00m	388h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	319h24m	419h37m	408h07m	416h13m	407h10m	402h43m	269h07m	404h22m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	227h42m	315h30m	315h30m	314h00m	298h00m	309h25m	201h30m	307h55m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	214h56m	276h53m	281h49m	290h17m	305h35m	304h33m	194h43m	296h42m
05. Pontos planejados	68,0	65,0	68,0	81,0	85,0	67,5	36,0	109,0
06. Pontos entregues	67,5	101	51,5	118	107,5	76	48	112,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	54,50	78,00	36,50	92,00	74,50	61,50	21,00	100,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	13,00	23,00	15,00	26,00	33,00	14,50	27,00	12,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	5	0	2	0	0	2
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	19	22	10	23	21	20	6	20
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	12	18	12	22	27	16	8	20
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	2	0	1	0	0	1
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0	2,5	0	0,5	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,299	0,207	0,216	0,258	0,286	0,219	0,179	0,354
16. Produtividade realizada	0,315	0,365	0,183	0,407	0,352	0,250	0,247	0,380
17. % Pontos NP / Pontos entregues	19,3	22,8	29,2	22,1	30,7	19,1	56,3	10,7

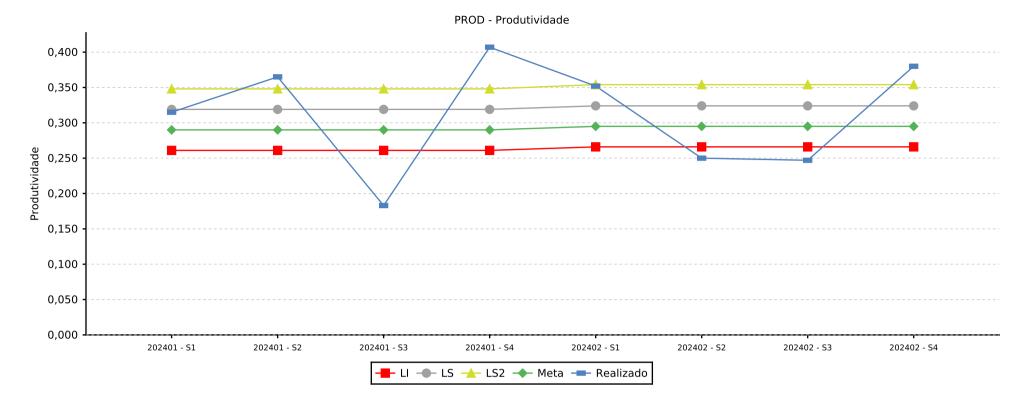


		202	401			202	402	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,315	0,365	0,183	0,407	0,352	0,250	0,247	0,380
Meta	0,290	0,290	0,290	0,290	0,295	0,295	0,295	0,295
LS2	0,348	0,348	0,348	0,348	0,354	0,354	0,354	0,354
LS	0,319	0,319	0,319	0,319	0,324	0,324	0,324	0,324
LI	0,261	0,261	0,261	0,261	0,266	0,266	0,266	0,266

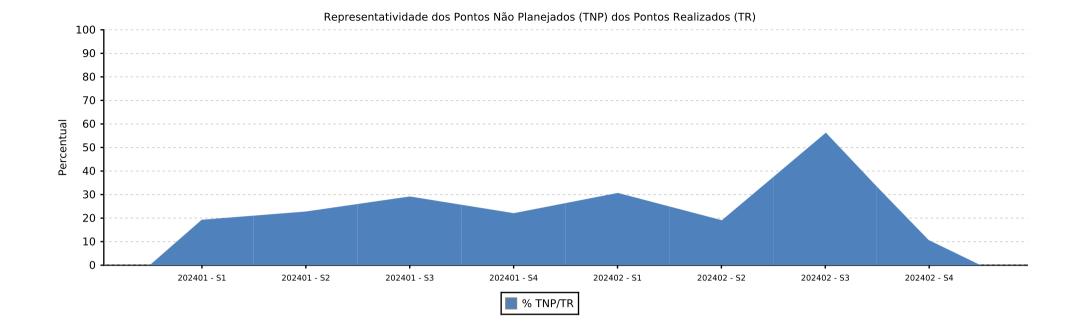


		202	401			202	402	
	1 2 3 4 1 2					2	3	4
TR - Pontos Realizados	67.5	101	51.5	118	107.5	76	48	112.5
TNP - Pontos Não Planejados	13	23	15	26	33	14.5	27	12
% TNP/TR	19,3	22,8	29,2	22,1	30,7	19,1	56,3	10,7

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

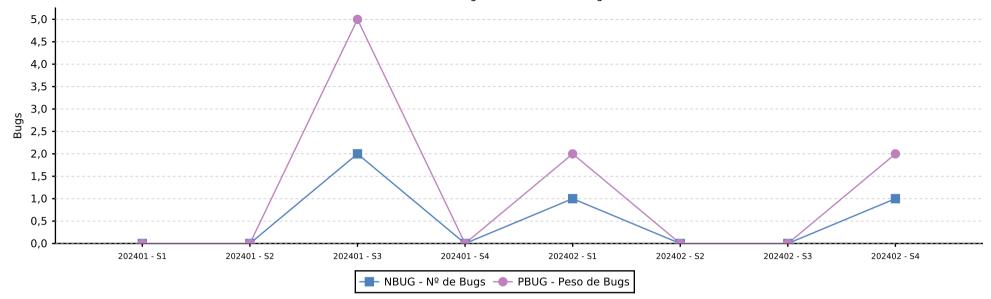

		202	401			202	402	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	2	0	1	0	0	1
PBUG - Peso de Bugs	0	0	5	0	2	0	0	2
Pontos Entregues	67.5	101	51.5	118	107.5	76	48	112.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	9,71	0,00	1,87	0,00	0,00	1,78

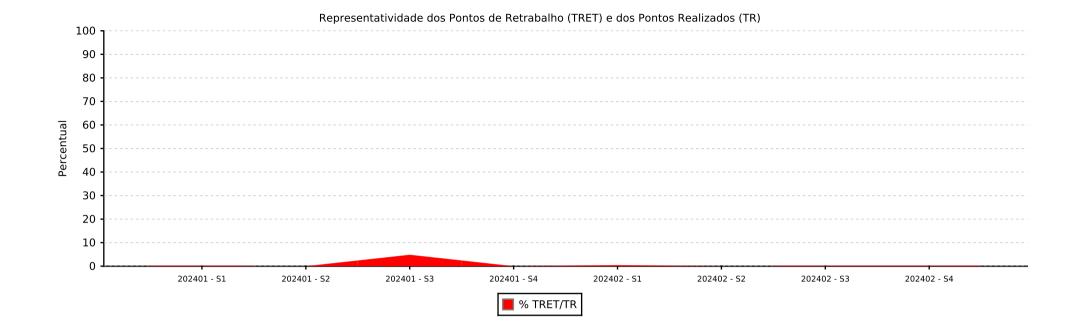


		202	401			202	402	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	67.5	101	51.5	118	107.5	76	48	112.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	2.5	0	0.5	0	0	0
% TRET/TR	0,0	0,0	4,9	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	240,75	253,43	251,5	264,88	150,67	171,62	247,17	252,03	890,09	941,96	105,8 %
Atestado	0	0	0	4	0	0	0	34	0	38	0,0 %
Analise de Sistema	19,25	21,28	19,25	26,88	11,67	24,52	19,25	15,63	69,42	88,31	127,2 %
Daily Scrum	14	12,3	14,67	12,23	9	5,42	14,67	15,28	52,34	45,23	86,4 %
Code Review	20	24,7	20,5	19,7	14	9,75	20,5	14,4	75	68,55	91,4 %
Retrospectiva	11,67	12,42	11,67	10,08	11,67	10,5	11,67	10,83	46,68	43,83	93,9 %
Sprint Planning 1	15	10,67	15	6	15	3	15	9,17	60	28,84	48,1 %
Cafe	9,75	10	10	9,75	7	6,25	10	8,25	36,75	34,25	93,2 %
Sizing	6	0,92	6	3,52	5	5,63	6	7,83	23	17,9	77,8 %
Ginastica Laboral	8,17	5,83	8,33	6,5	5,33	3,52	8,33	6,55	30,16	22,4	74,3 %
Treinamento	5,5	4,5	1	1	1	0,58	1	5,67	8,5	11,75	138,2 %
Atualizacao de Versao	2,5	1,25	2,5	1,67	1,5	2,13	2,5	4,4	9	9,45	105,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	1,05	0	4,13	0	5,18	0,0 %
Atividades Gerenciais	0,5	12,47	0,5	3,75	0,5	2,42	0,5	3,2	2	21,84	1.092,0
Verificando apontamento	5,58	4,88	5,75	2,93	6,83	1,63	5,75	2,67	23,91	12,11	50,6 %
Sprint Planning 2	5	4,87	5	3	5	1,5	5	2,25	20	11,62	58,1 %
Atraso / Saida antecipada	0	0,8	0	0	0	0	0	1,37	0	2,17	0,0 %
Reuniao	2	4	2	10,83	2	1,1	3,5	1,33	9,5	17,26	181,7 %
Preparando ambiente	0	1,85	0	1,27	0	0,33	0	1,3	0	4,75	0,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1,17	7,13	1,17	5,05	1,17	0,55	1,17	0,95	4,68	13,68	292,3 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	1,63	0	0	0	0,83	0	2,46	0,0 %
Outros	0	0,75	0	0	0	0,95	0	0,67	0	2,37	0,0 %
Planejamento de Projeto	0	1,85	0	0	0	0	2,33	0,63	2,33	2,48	106,4 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	5,12	1	3,75	1	0	1	0,42	4	9,29	232,3 %
Clean Code	3,5	1,17	3,5	0	3,25	0	3,5	0,32	13,75	1,49	10,8 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	3,17	1,45	3,17	1,67	3,08	1,17	3,17	0,25	12,59	4,54	36,1 %
Ausencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	2,08	0	2,08	0	2	0	2,08	0	8,24	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0,27	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0,27	27,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	1,3	0	0	0	0	0	1,3	0,0 %
Compilacao de sistemas	0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,32	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	15,5	0	0	0	15,5	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	2,52	0	0,98	0	0	0	0	0	3,5	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,5	0,25	0,5	0,22	0,5	0	0,5	0	2	0,47	23,5 %
Abrir o.s	0	0	0	0,12	0	0	0	0	0	0,12	0,0 %
Correcao de Erros Externo	2,33	0	2,33	0	2,25	0	2,33	0	9,24	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	380	407,18	388	402,71	260	269,12	388	404,36	1.416	1.483,37	104,8 %

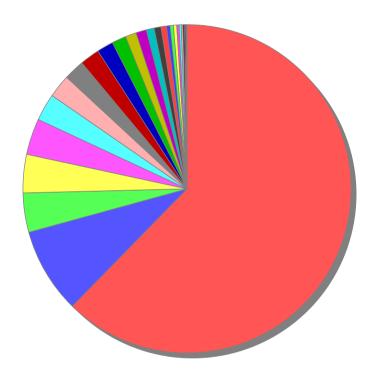

- Desenvolvimento [62.33%]
- Atestado [8.41%]
- Analise de Sistema [3.87%]
- Daily Scrum [3.78%]
- Code Review [3.56%]
- Retrospectiva [2.68%]
- Sprint Planning 1 [2.27%]
- Cafe [2.04%]
- Sizing [1.94%]
- Ginastica Laboral [1.62%]
- Treinamento [1.4%]
- Atualizacao de Versao [1.09%]
- Organização sala / equipamento [1.02%]
- Atividades Gerenciais [0.79%]
- Verificando apontamento [0.66%]
- Sprint Planning 2 [0.56%]
- Atraso / Saida antecipada [0.34%]
- Reuniao [0.33%]
- Preparando ambiente [0.32%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.23%]
- Manutenção de Servidores [0.21%]
- Outros [0.17%]
- Planejamento de Projeto [0.16%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.1%]
- Clean Code [0.08%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.06%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	int 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	To	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	253,5	263,43	264,25	271,82	162,92	173,33	259,92	253,55	940,59	962,13	102,3 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	45,67	49,42	46,83	42,02	34,67	25,67	46,83	40,52	174	157,63	90,6 %
REQM - Gestao de Requisitos		45,25	42,1	45,25	42,95	36,67	34,98	45,25	36,18	172,42	156,21	90,6 %
DIV - Diversos*		21,42	38,17	21,83	34,58	15,83	14,23	23,33	20,42	82,41	107,4	130,3 %
PI - Integracao de Produto		2,5	1,25	2,5	1,67	1,5	2,13	2,5	4,4	9	9,45	105,0 %
PP - Planejamento de Projeto		0	1,85	0	0	0	0	2,33	0,63	2,33	2,48	106,4 %
CM - Gerencia de Configuração		0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,83	0	1,82	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	368,67	396,22	380,99	393,04	251,92	250,34	380,99	355,7	1.382,57	1.395,3	100,9 %

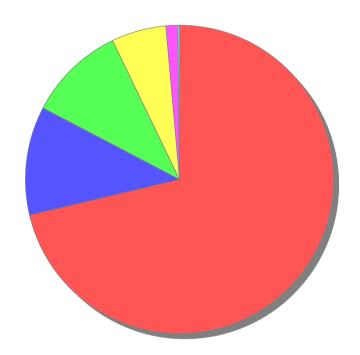


- Desenvolvimento de Requisitos [71.28%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [11.39%]
- Gestao de Requisitos [10.17%]
- Oiversos* [5.74%]
- Integracao de Produto [1.24%]
- O Planejamento de Projeto [0.18%]

INDICADORES DO PROJETO

	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402
01. Horas planejadas de todas atividades	880h00m	792h00m	880h00m	800h00m	840h00m	612h20m	1451h12m	1416h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	950h28m	824h44m	940h16m	845h36m	909h31m	655h11m	1563h21m	1483h22m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	653h50m	580h10m	583h00m	457h20m	470h44m	389h00m	1172h42m	1116h50m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	708h03m	518h09m	579h39m	468h37m	493h13m	416h24m	1063h55m	1101h33m
05. Pontos planejados para o projeto	200,0	176,0	180,0	144,0	148,0	142,0	339,5	327,0
06. Pontos planejados	244,0	187,0	173,5	153,0	168,5	146,5	282,0	297,5
07. Pontos entregues	220	166,5	192,5	165,5	164,5	134	338	344
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	167,50	142,50	129,50	121,50	134,50	107,00	261,00	257,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	52,50	24,00	63,00	44,00	30,00	27,00	77,00	86,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	4	0	3	0	2	0	5	4
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	60	50	44	35	32	28	74	67
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	57	36	68	39	31	15	64	71
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	4	0	3	0	1	0	2	2
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m						
15. Pontos de retrabalho	1,5	0	6	0	0,5	0	2,5	0,5
16. Produtividade planejada	0,374	0,323	0,298	0,335	0,358	0,377	0,241	0,267
17. Produtividade realizada	0,311	0,322	0,333	0,354	0,334	0,322	0,318	0,313
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	110	94,7	107	115	111,2	94,4	99,6	105,2
19. % Pontos NP / Pontos entregues	23,9	14,5	32,8	26,6	18,3	20,2	22,8	25,2

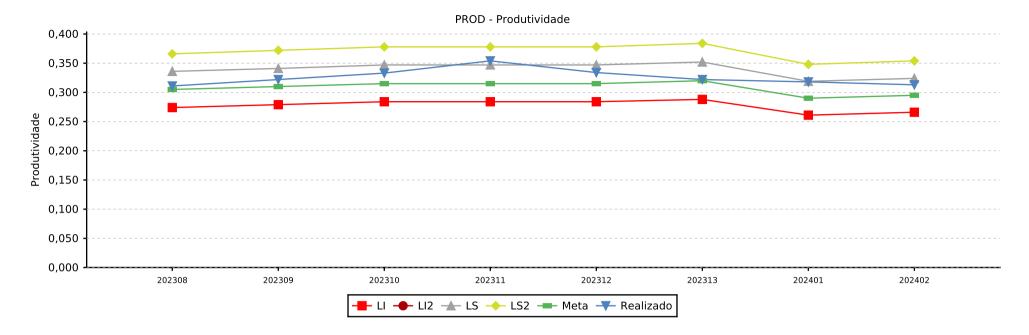


	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402
Realizado	0,311	0,322	0,333	0,354	0,334	0,322	0,318	0,313
Meta	0,305	0,310	0,315	0,315	0,315	0,320	0,290	0,295
LS2	0,366	0,372	0,378	0,378	0,378	0,384	0,348	0,354
LS	0,336	0,341	0,347	0,347	0,347	0,352	0,319	0,324
LI2								
LI	0,274	0,279	0,284	0,284	0,284	0,288	0,261	0,266

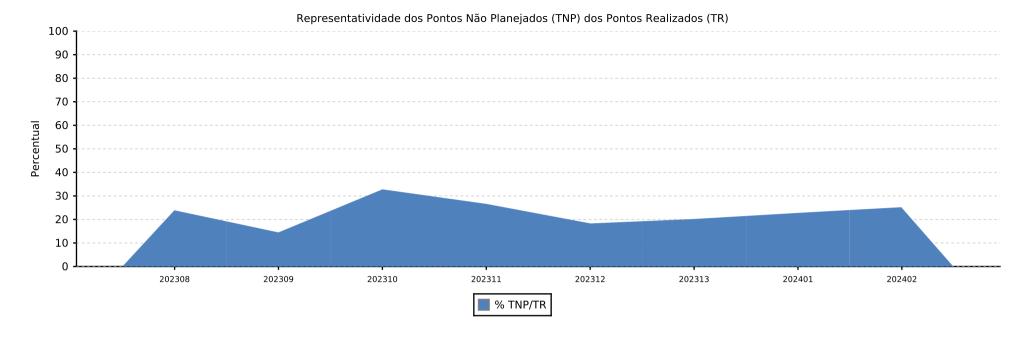


	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402
TR - Pontos Realizados	220	166.5	192.5	165.5	164.5	134	338	344
TNP - Pontos Não Planejados	52.5	24	63	44	30	27	77	86.5
% TNP/TR	23,9	14,5	32,8	26,6	18,3	20,2	22,8	25,2


PBUG - Peso de Bugs

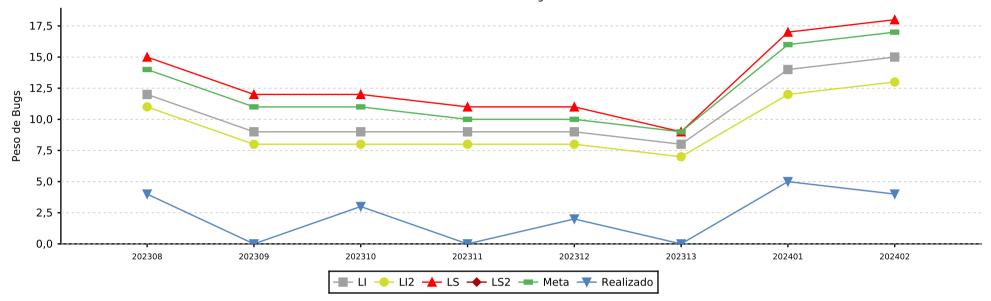


	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402
Realizado	4	0	3	0	2	0	5	4
Meta	14	11	11	10	10	9	16	17
LS2								
LS	15	12	12	11	11	9	17	18
LI2	11	8	8	8	8	7	12	13
LI	12	9	9	9	9	8	14	15
Pontos Entregues	220	166.5	192.5	165.5	164.5	134	338	344
% PBUG / TR	1,82	0,00	1,56	0,00	1,22	0,00	1,48	1,17

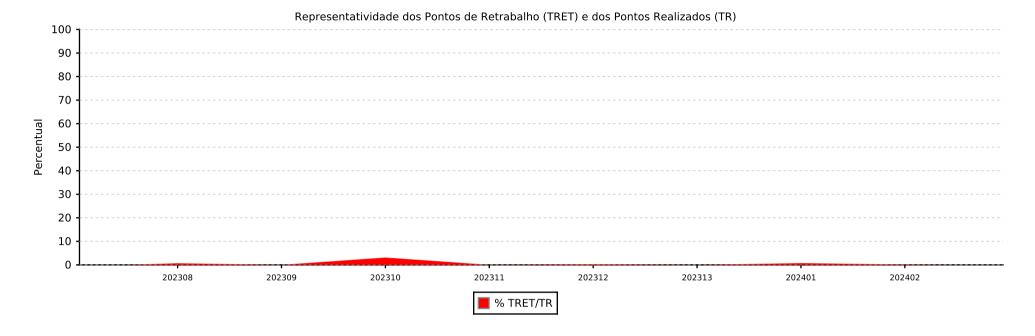

	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402
TR - Pontos Realizados	220	166.5	192.5	165.5	164.5	134	338	344
TRET - Pontos de Retrabalho	1.5	0	6	0	0.5	0	2.5	0.5
% TRET/TR	0,7	0,0	3,1	0,0	0,3	0,0	0,7	0,1

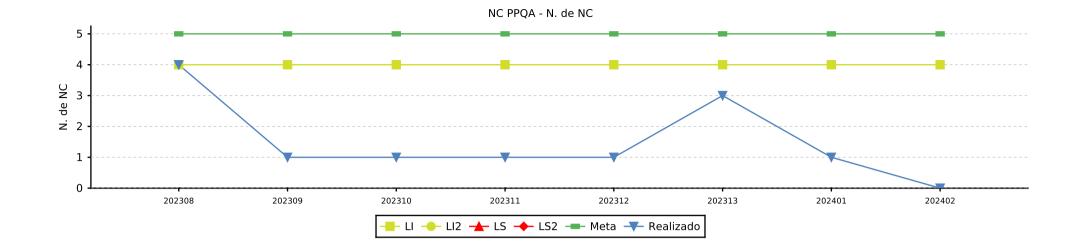

	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402
Realizado	4	1	1	1	1	3	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

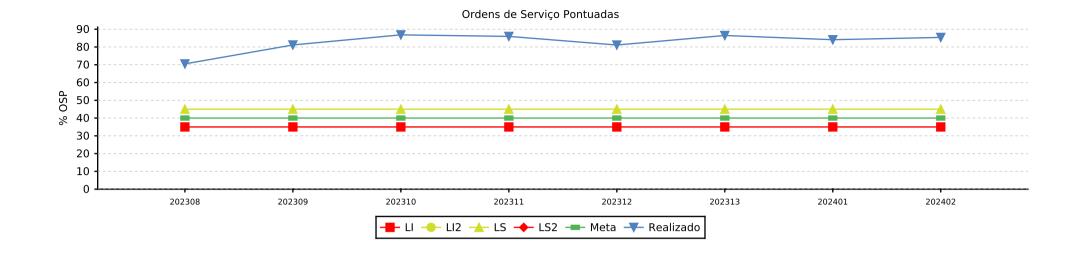


	202308	202309	202310	202311	202312	202313	202401	202402
Realizado	70.5	81.15	86.83	85.96	81.11	86.49	84.09	85.4
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [63.5%]
- Analise de Sistema [5.95%]
- Code Review [4.62%]
- Daily Scrum [3.05%]
- Retrospectiva [2.95%]
- Atestado [2.56%]
- Cafe [2.31%]
- Sprint Planning 1 [1.94%]
- Ginastica Laboral [1.51%]
- Atividades Gerenciais [1.47%]
- Sizing [1.21%]
- Reuniao [1.16%]
- Feriado [1.04%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.92%]
- Verificando apontamento [0.82%]
- Treinamento [0.79%]
- Sprint Planning 2 [0.78%]
- Atualizacao de Versao [0.64%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.63%]
- Organização sala / equipamento [0.35%]
- Preparando ambiente [0.32%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.31%]
- Analise Retorno O.S. [0.24%]
- Planejamento de Projeto [0.17%]
- Manutenção de Servidores [0.17%]
- Outros [0.16%]
- Atraso / Saida antecipada [0.15%]
- Clean Code [0.1%]

- Levantamento de Requisito [0.09%]
- Verificar o.s no nome [0.03%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.03%]
- O Geração de Atas [0.02%]
- Abrir o.s [0.01%]

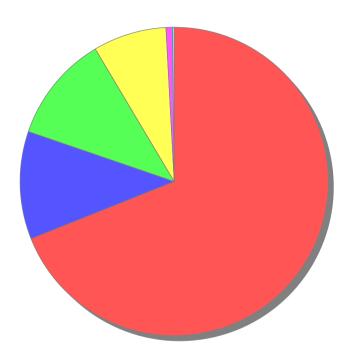

- Desenvolvimento de Requisitos [64.86%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [10.63%]
- Gestao de Requisitos [10.53%]
- Diversos* [7.24%]
- Integracao de Produto [0.64%]
- Planejamento de Projeto [0.17%]
