

INDICADORES DA SPRINT

		202	312			202	313	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	220h00m	180h00m	220h00m	220h00m	133h00m	160h00m	176h00m	143h20m
02. Horas realizadas de todas atividades	225h31m	193h50m	256h17m	233h53m	126h52m	167h43m	163h42m	160h09m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	150h54m	122h45m	109h30m	87h35m	109h50m	124h55m	102h10m	52h05m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	150h26m	125h25m	136h52m	80h30m	88h55m	116h42m	114h30m	96h17m
05. Pontos planejados	40,5	57,5	40,0	30,5	25,0	48,0	43,0	30,5
06. Pontos entregues	33,5	57,5	40	33,5	16	52	33,5	32,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	25,50	52,50	33,00	23,50	9,00	45,50	30,00	22,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	8,00	5,00	7,00	10,00	7,00	6,50	3,50	10,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	2	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	8	8	10	6	4	9	9	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	9	9	4	9	6	4	2	3
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	1	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	0	0	0,5	0	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,269	0,469	0,366	0,349	0,228	0,385	0,421	0,586
16. Produtividade realizada	0,223	0,459	0,293	0,417	0,180	0,446	0,293	0,338
17. % Pontos NP / Pontos entregues	23,9	8,7	17,5	29,9	43,8	12,5	10,5	30,8

PROD - Produtividade

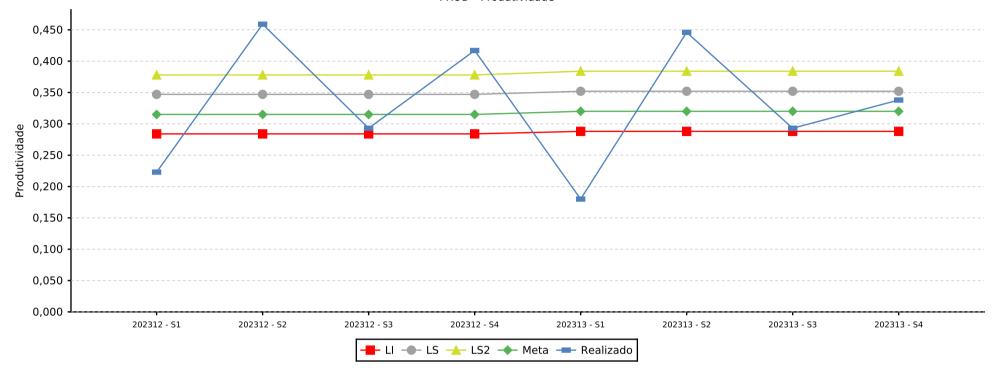


		202	312		202313					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,223	0,459	0,293	0,417	0,180	0,446	0,293	0,338		
Meta	0,315	0,315	0,315	0,315	0,320	0,320	0,320	0,320		
LS2	0,378	0,378	0,378	0,378	0,384	0,384	0,384	0,384		
LS	0,347	0,347	0,347	0,347	0,352	0,352	0,352	0,352		
LI	0,284	0,284	0,284	0,284	0,288	0,288	0,288	0,288		

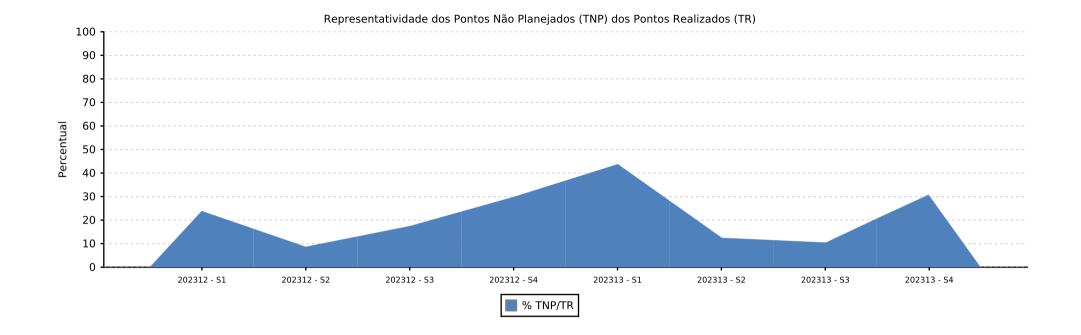


		202	312			202	313	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	33.5	57.5	40	33.5	16	52	33.5	32.5
TNP - Pontos Não Planejados	8	5	7	10	7	6.5	3.5	10
% TNP/TR	23,9	8,7	17,5	29,9	43,8	12,5	10,5	30,8

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

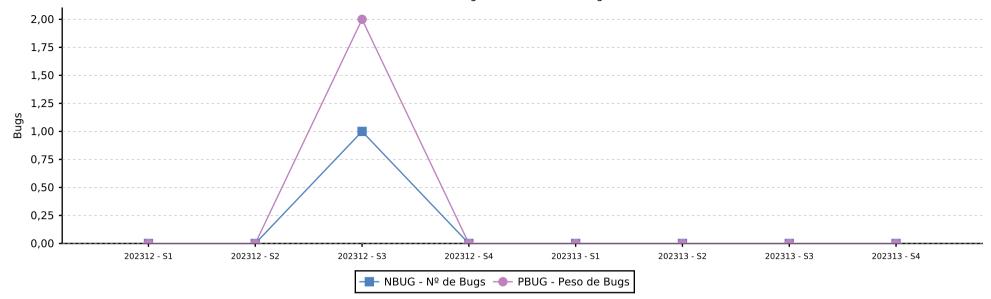

		202	312		202313				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
NBUG - Nº de Bugs	0	0	1	0	0	0	0	0	
PBUG - Peso de Bugs	0	0	2	0	0	0	0	0	
Pontos Entregues	33.5	57.5	40	33.5	16	52	33.5	32.5	
% PBUG / TR	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

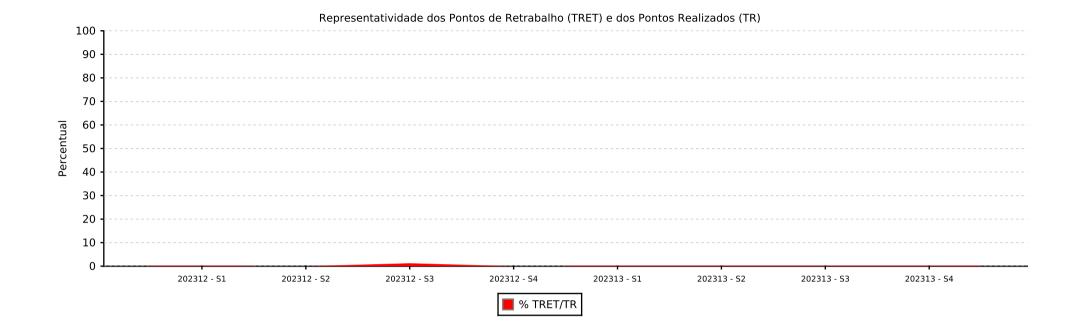


		202	312			202	313	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	33.5	57.5	40	33.5	16	52	33.5	32.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0.5	0	0	0	0	0
% TRET/TR	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spr	int 1	Spr	int 2	Spr	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	89	79,42	102,42	100,88	83	97,03	34,5	74,22	308,92	351,55	113,8 %
Treinamento	2	8,37	11,67	15,07	10,5	21,22	10,83	15,98	35	60,64	173,3 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0,0 %
Code Review	6,5	9,15	6,17	17	5,5	8,88	8	7,83	26,17	42,86	163,8 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	6,67	0	6,67	0,0 %
Retrospectiva	3,5	2,25	3,5	3,25	3,5	5,83	2,33	6,25	12,83	17,58	137,0 %
Daily Scrum	7,83	2,92	9,83	8,83	7,83	7,5	6,83	5,92	32,32	25,17	77,9 %
Analise de Sistema	5,25	6,42	6	4,73	4,75	4,97	9,75	5,1	25,75	21,22	82,4 %
Sprint Planning 1	5	2	4	0,5	4	2	2,17	4,58	15,17	9,08	59,9 %
Atividades Gerenciais	0	0	0	0	0	0	0,5	3,95	0,5	3,95	790,0 %
Cafe	3,75	3,5	4,5	4,25	3,75	4,25	3,25	3,92	15,25	15,92	104,4 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	3,8	0	3,8	0,0 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	0,75	2,38	0,75	2,38	317,3 %
Ginastica Laboral	2,33	2,83	2,83	3	2,33	3	2,17	2	9,66	10,83	112,1 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	1,25	0,3	1,5	0,6	1,25	1,98	1,25	1,83	5,25	4,71	89,7 %
Verificando apontamento	1,58	2,08	1,92	1,77	1,25	1,7	1,42	1,8	6,17	7,35	119,1 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	1	1,55	1	1,55	155,0 %
Outros	0	0	0	0,08	0	0	0	1,42	0	1,5	0,0 %
Sprint Planning 2	1,25	0,33	1,25	0,25	1,25	1	0,58	1,25	4,33	2,83	65,4 %
Reuniao	0	0	0	0	0	0	2	1,08	2	1,08	54,0 %
Geração de Atas	0	0	0	0	0	0	0,25	0,17	0,25	0,17	68,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0	0	2,17	1	0,15	1	2,32	232,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,5	0,28	0,5	2,48	0	0,83	0,33	0,13	1,33	3,72	279,7 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0,08	0	0,08	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,17	0,13	0,17	0	0,17	0,32	0,5	0,08	1,01	0,53	52,5 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	2,37	0	0,52	0	0,13	0	0	0	3,02	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Atendimento GBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo		0,75	0	1	0	0,75	0	1	0	3,5	0	0,0 %
Particular		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente		0	0,17	0	0	0	0,42	0	0	0	0,59	0,0 %
Ausencia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado		0	2,2	0	4	0	0	0	0	0	6,2	0,0 %
Correção de Erros Interno		0,75	0	0,92	0	0,67	0	0,92	0	3,26	0	0,0 %
Clean Code		1,25	1,72	1,5	0,5	1,17	0,3	1,17	0	5,09	2,52	49,5 %
Teste Automatizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing		0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias		0	0	0	0	44	0	44	0	88	0	0,0 %
Manutenção Preventiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada		0	0,43	0	0	0	0,17	0	0	0	0,6	0,0 %
Levantamento de Requisito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas		0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,32	0	0,0 %
Feriado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	132,99	126,87	160,01	167,71	176	163,7	143,33	160,14	612,33	618,42	101,0 %

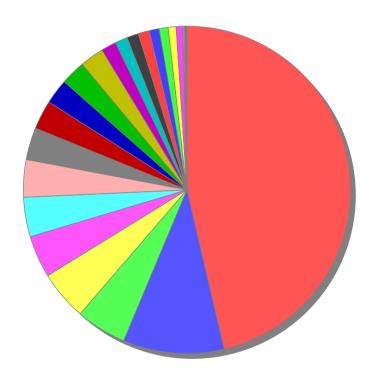

- Desenvolvimento [46.34%]
- Treinamento [9.98%]
- Folga [5%]
- Code Review [4.89%]
- Analise de O.S [4.16%]
- Retrospectiva [3.9%]
- Daily Scrum [3.7%]
- Analise de Sistema [3.18%]
- Sprint Planning 1 [2.86%]
- Atividades Gerenciais [2.47%]
- Cafe [2.45%]
- Organização sala / equipamento [2.37%]
- Planejamento de Projeto [1.49%]
- Ginastica Laboral [1.25%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.14%]
- Verificando apontamento [1.12%]
- Atualizacao de Versao [0.97%]
- Outros [0.89%]
- Sprint Planning 2 [0.78%]
- Reuniao [0.67%]
- O Geração de Atas [0.11%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.09%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.08%]
- Auxilio suporte [0.05%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.05%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	93,67	81,85	108	104,47	87	100,47	39,67	76,27	328,34	363,06	110,6 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	17,83	14,32	19,5	29,08	16,83	22,22	17,17	20	71,33	85,62	120,0 %
DIV - Diversos*		6,08	6,33	7,33	7,33	6,08	9,42	8,92	12,52	28,41	35,6	125,3 %
REQM - Gestao de Requisitos		11,5	11,28	11,25	6	10	8,52	18,5	10,93	51,25	36,73	71,7 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	0,75	2,38	0,75	2,38	317,3 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	1	1,55	1	1,55	155,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,83	0	1,82	0	0,0 %
	Total Geral	129,41	113,78	146,41	146,88	120,24	140,63	86,84	123,65	482,9	524,94	108,7 %

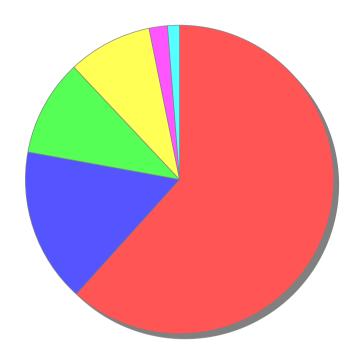


- Desenvolvimento de Requisitos [61.68%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [16.17%]
- Diversos* [10.13%]
- Gestao de Requisitos [8.84%]
- Planejamento de Projeto [1.92%]
- Integracao de Produto [1.25%]

INDICADORES DO PROJETO


	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313
01. Horas planejadas de todas atividades	1005h36m	880h00m	880h00m	792h00m	880h00m	800h00m	840h00m	612h20m
02. Horas realizadas de todas atividades	930h23m	938h39m	950h28m	824h44m	940h16m	845h36m	909h31m	618h26m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	779h36m	696h35m	653h50m	580h10m	583h00m	457h20m	470h44m	389h00m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	732h19m	690h49m	708h03m	518h09m	579h39m	468h37m	493h13m	416h24m
05. Pontos planejados para o projeto	234,0	208,0	200,0	176,0	180,0	144,0	148,0	142,0
06. Pontos planejados	230,5	209,0	244,0	187,0	173,5	153,0	168,5	146,5
07. Pontos entregues	222,5	220	220	166,5	192,5	165,5	164,5	134
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	169,50	168,00	167,50	142,50	129,50	121,50	134,50	107,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	53,00	52,00	52,50	24,00	63,00	44,00	30,00	27,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	5	1	4	0	3	0	2	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	50	73	60	50	44	35	32	28
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	43	45	57	36	68	39	31	15
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	5	1	4	0	3	0	1	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	3,5	0,5	1,5	0	6	0	0,5	0
16. Produtividade planejada	0,296	0,301	0,374	0,323	0,298	0,335	0,358	0,377
17. Produtividade realizada	0,304	0,319	0,311	0,322	0,333	0,354	0,334	0,322
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	95,1	105,8	110	94,7	107	115	111,2	94,4
19. % Pontos NP / Pontos entregues	23,9	23,7	23,9	14,5	32,8	26,6	18,3	20,2

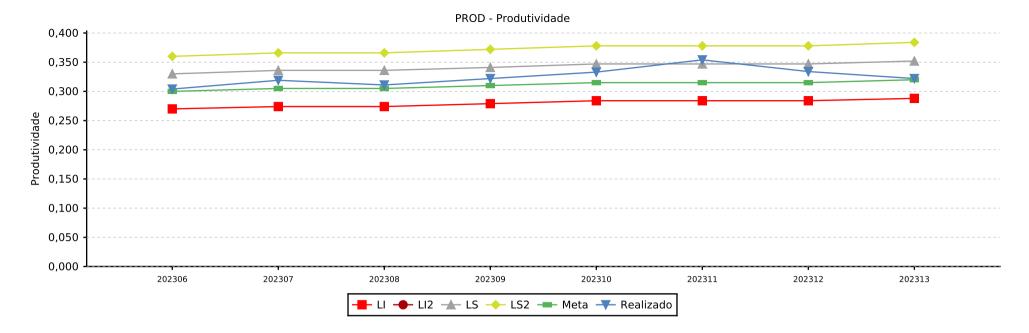


	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313
Realizado	0,304	0,319	0,311	0,322	0,333	0,354	0,334	0,322
Meta	0,300	0,305	0,305	0,310	0,315	0,315	0,315	0,320
LS2	0,360	0,366	0,366	0,372	0,378	0,378	0,378	0,384
LS	0,330	0,336	0,336	0,341	0,347	0,347	0,347	0,352
LI2								
LI	0,270	0,274	0,274	0,279	0,284	0,284	0,284	0,288

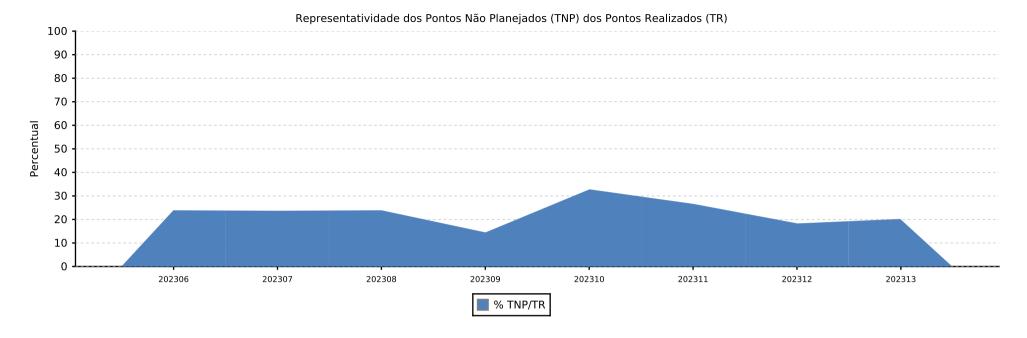


	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313
TR - Pontos Realizados	222.5	220	220	166.5	192.5	165.5	164.5	134
TNP - Pontos Não Planejados	53	52	52.5	24	63	44	30	27
% TNP/TR	23,9	23,7	23,9	14,5	32,8	26,6	18,3	20,2

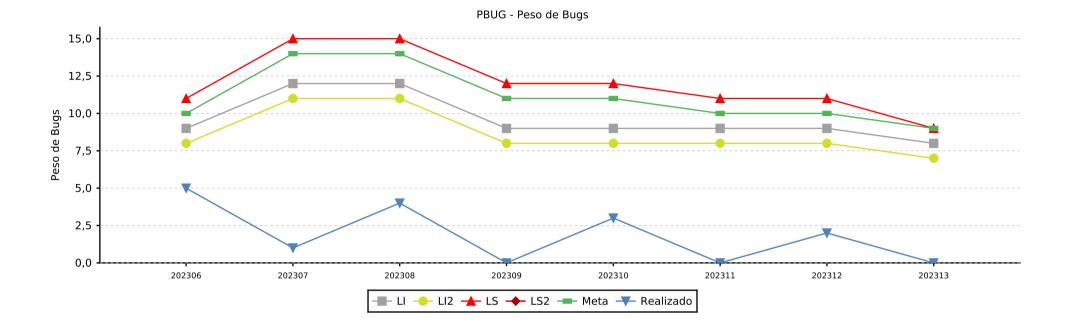


	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313
Realizado	5	1	4	0	3	0	2	0
Meta	10	14	14	11	11	10	10	9
LS2								
LS	11	15	15	12	12	11	11	9
LI2	8	11	11	8	8	8	8	7
LI	9	12	12	9	9	9	9	8
Pontos Entregues	222.5	220	220	166.5	192.5	165.5	164.5	134
% PBUG / TR	2,25	0,46	1,82	0,00	1,56	0,00	1,22	0,00

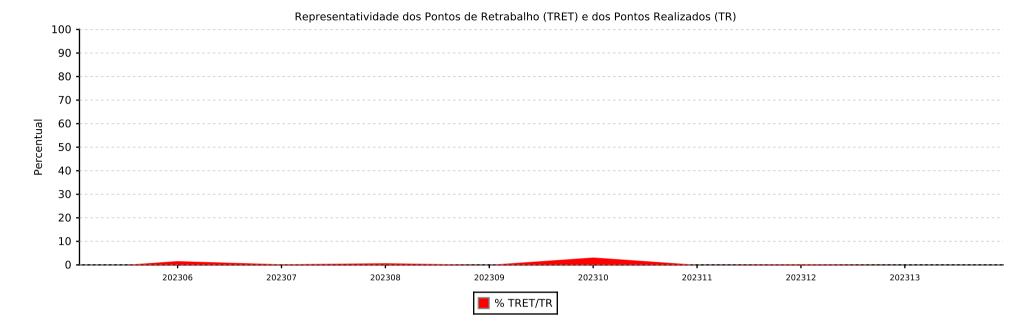

	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313
TR - Pontos Realizados	222.5	220	220	166.5	192.5	165.5	164.5	134
TRET - Pontos de Retrabalho	3.5	0.5	1.5	0	6	0	0.5	0
% TRET/TR	1,6	0,2	0,7	0,0	3,1	0,0	0,3	0,0

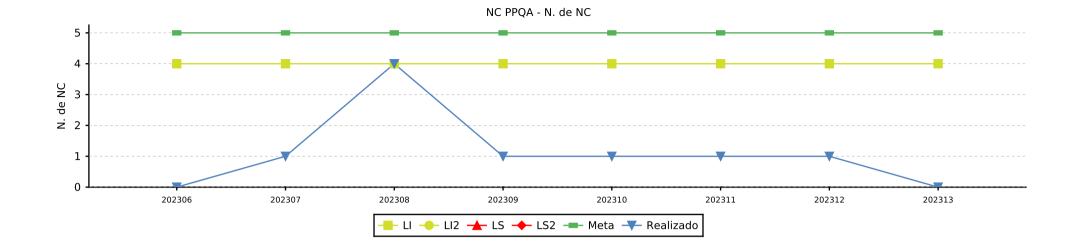


	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313
Realizado	0	1	4	1	1	1	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

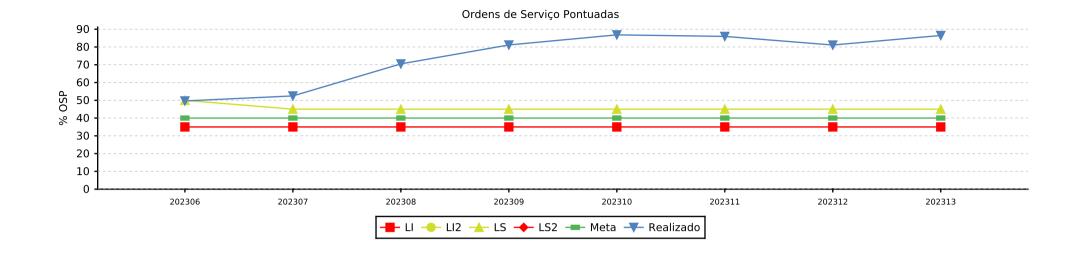

	202306	202307	202308	202309	202310	202311	202312	202313
Realizado	49.64	52.46	70.5	81.15	86.83	85.96	81.11	86.49
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	50	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

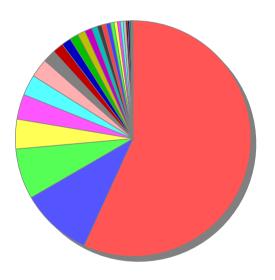


Desenvolvimento [56.85%]

Geração de Atas [0.03%]

Auxilio suporte [0.01%]

- Treinamento [9.8%]
- Code Review [6.93%]
- Daily Scrum [4.07%]
- Analise de Sistema [3.43%]
- Retrospectiva [2.84%]
- Cafe [2.57%]
- Ginastica Laboral [1.75%]
- Sprint Planning 1 [1.47%]
- Folga [1.29%]
- Verificando apontamento [1.19%]
- Analise de O.S [1.08%]
- Atestado [1%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.76%]
- Atividades Gerenciais [0.64%]
- Organização sala / equipamento [0.61%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.6%]
- Analise Retorno O.S. [0.49%]
- Sprint Planning 2 [0.46%]
- Clean Code [0.41%]
- Planejamento de Projeto [0.38%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.38%]
- Atualizacao de Versao [0.25%]
- Outros [0.24%]
- Reuniao [0.17%]
- Atraso / Saida antecipada [0.1%]
- Preparando ambiente [0.09%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.09%]

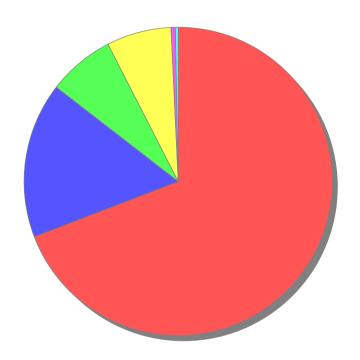

- Desenvolvimento de Requisitos [58.71%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [13.84%]
- Gestao de Requisitos [5.94%]
- Diversos* [5.76%]
- Planejamento de Projeto [0.38%]
- Integracao de Produto [0.25%]
