

INDICADORES DA SPRINT

| | | 202 | 309 | | | 202 | 310 | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 01. Horas planejadas de todas atividades | 176h00m | 220h00m | 220h00m | 176h00m | 220h00m | 220h00m | 220h00m | 220h00m |
| 02. Horas realizadas de todas atividades | 187h22m | 214h51m | 234h08m | 188h23m | 225h29m | 243h53m | 234h53m | 236h01m |
| 03. Horas planejadas de desenvolvimento | 128h05m | 163h00m | 163h00m | 126h05m | 146h15m | 146h15m | 146h15m | 144h15m |
| 04. Horas realizadas de desenvolvimento | 137h31m | 134h00m | 135h47m | 110h51m | 142h48m | 143h38m | 144h34m | 148h39m |
| 05. Pontos planejados | 42,5 | 53,0 | 49,5 | 42,0 | 30,0 | 47,0 | 42,5 | 54,0 |
| 06. Pontos entregues | 58,5 | 19,5 | 48,5 | 40 | 42 | 44 | 41,5 | 65 |
| 07. Pontos entregues (apenas Tarefa) | 50,00 | 16,50 | 38,50 | 37,50 | 23,00 | 28,00 | 34,00 | 44,50 |
| 08. Pontos entregues (apenas NP) | 8,50 | 3,00 | 10,00 | 2,50 | 19,00 | 16,00 | 7,50 | 20,50 |
| 09. Pontos entregues (apenas Erro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa) | 14 | 7 | 12 | 17 | 12 | 10 | 10 | 12 |
| 11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP) | 11 | 5 | 16 | 4 | 16 | 20 | 11 | 21 |
| 12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13. Horas de correção de bug | 0h00m |
| 14. Pontos de retrabalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 3,5 |
| 15. Produtividade planejada | 0,332 | 0,326 | 0,304 | 0,334 | 0,206 | 0,322 | 0,291 | 0,375 |
| 16. Produtividade realizada | 0,426 | 0,146 | 0,358 | 0,361 | 0,295 | 0,307 | 0,288 | 0,438 |
| 17. % Pontos NP / Pontos entregues | 14,6 | 15,4 | 20,7 | 6,3 | 45,3 | 36,4 | 18,1 | 31,6 |

PROD - Produtividade

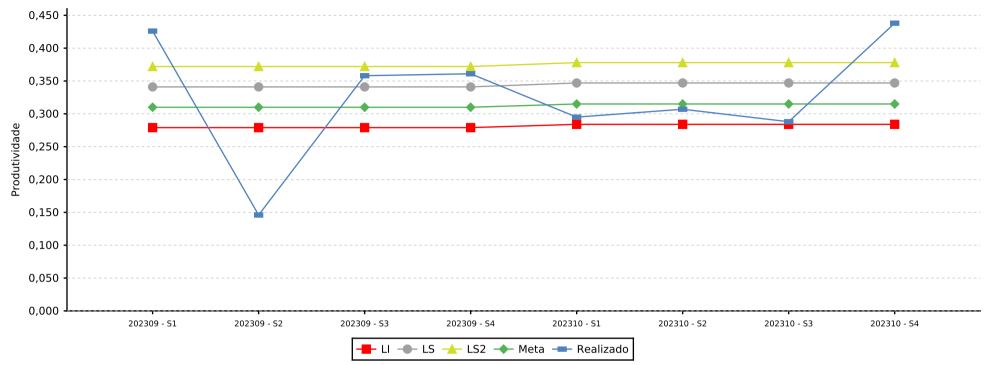


| | | 202 | 309 | | 202310 | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Realizado | 0,426 | 0,146 | 0,358 | 0,361 | 0,295 | 0,307 | 0,288 | 0,438 | | |
| Meta | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,310 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | | |
| LS2 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,372 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | | |
| LS | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | 0,347 | | |
| LI | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,279 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | 0,284 | | |

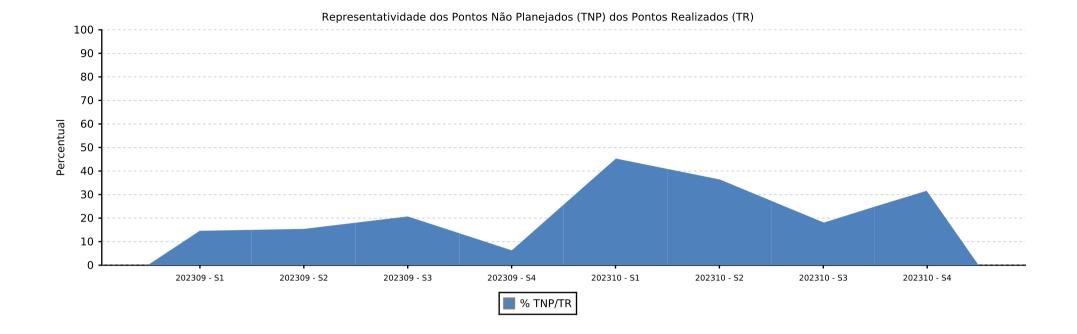


| | | 202 | 309 | | | 202 | 310 | |
|-----------------------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TR - Pontos Realizados | 58.5 | 19.5 | 48.5 | 40 | 42 | 44 | 41.5 | 65 |
| TNP - Pontos Não Planejados | 8.5 | 3 | 10 | 2.5 | 19 | 16 | 7.5 | 20.5 |
| % TNP/TR | 14,6 | 15,4 | 20,7 | 6,3 | 45,3 | 36,4 | 18,1 | 31,6 |

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

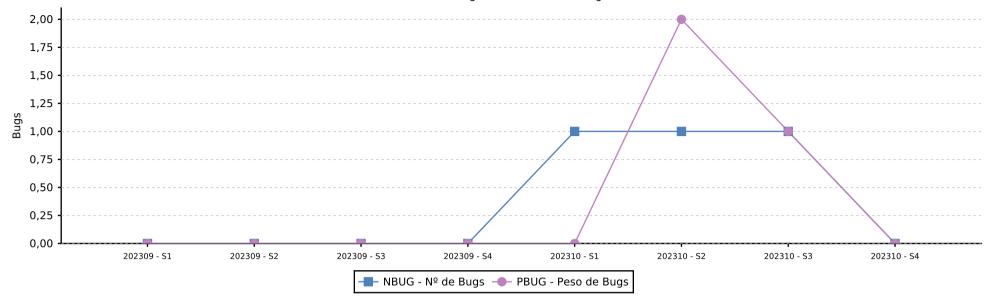

| | | 202 | 309 | | 202310 | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|--|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| NBUG - Nº de Bugs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | |
| PBUG - Peso de Bugs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | | |
| Pontos Entregues | 58.5 | 19.5 | 48.5 | 40 | 42 | 44 | 41.5 | 65 | | |
| % PBUG / TR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,55 | 2,41 | 0,00 | | |

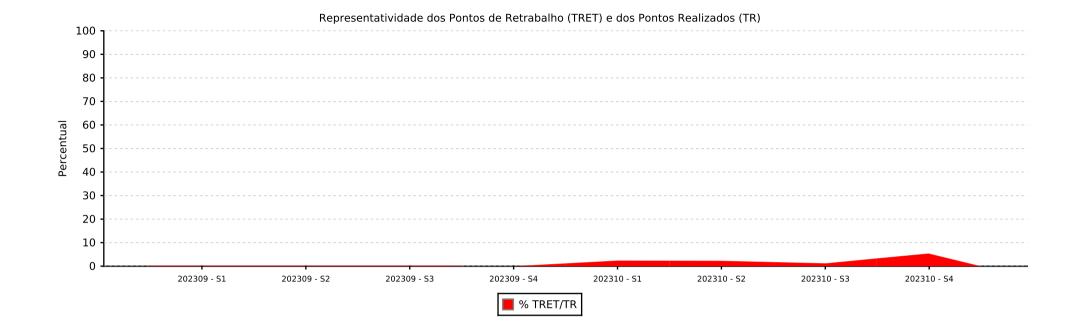


| | | 202 | 309 | | | 202 | 310 | |
|-----------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TR - Pontos Realizados | 58.5 | 19.5 | 48.5 | 40 | 42 | 44 | 41.5 | 65 |
| TRET - Pontos de Retrabalho | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 |
| % TRET/TR | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,3 | 1,2 | 5,4 |

HORAS POR ATIVIDADE

| | Spri | int 1 | Spr | int 2 | Spri | int 3 | Spri | nt 4 | То | tal | % HP/HR |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Atividade | Planejado | Realizado | Total |
| Desenvolvimento | 109,25 | 123,12 | 109,25 | 116,37 | 109,25 | 120,53 | 105,42 | 120,73 | 433,17 | 480,75 | 111,0 % |
| Treinamento | 23 | 23,35 | 23 | 35,48 | 23 | 29,95 | 23 | 25,25 | 92 | 114,03 | 123,9 % |
| Code Review | 13 | 10,3 | 13 | 8,2 | 13 | 13,23 | 13 | 18,13 | 52 | 49,86 | 95,9 % |
| Analise de Sistema | 10,33 | 10,23 | 10,33 | 18,6 | 10,33 | 21,87 | 10,33 | 13,82 | 41,32 | 64,52 | 156,1 % |
| Daily Scrum | 13,33 | 11,5 | 13,33 | 7,08 | 13,33 | 8,67 | 13,33 | 11,67 | 53,32 | 38,92 | 73,0 % |
| Cafe | 6,25 | 6,5 | 6,25 | 6,5 | 6,25 | 6,33 | 6,25 | 6 | 25 | 25,33 | 101,3 % |
| Reuniao | 2,67 | 8 | 2,67 | 4,9 | 2,67 | 1,33 | 4,5 | 5,47 | 12,51 | 19,7 | 157,5 % |
| Auxilio ao Suporte e Implantacao | 2 | 2,72 | 2 | 5,57 | 2 | 3,25 | 2 | 5,22 | 8 | 16,76 | 209,5 % |
| Retrospectiva | 5,83 | 1 | 5,83 | 6,5 | 5,83 | 7,17 | 5,83 | 5 | 23,32 | 19,67 | 84,3 % |
| Sizing | 6 | 3,77 | 6 | 8 | 6 | 3,5 | 6 | 4,68 | 24 | 19,95 | 83,1 % |
| Atualizacao de Versao | 2,5 | 2,52 | 2,5 | 6,35 | 2,5 | 2,52 | 2,5 | 4,08 | 10 | 15,47 | 154,7 % |
| Ginastica Laboral | 4 | 3,97 | 4 | 3,83 | 4 | 3,5 | 4 | 3,6 | 16 | 14,9 | 93,1 % |
| Sprint Planning 1 | 7,5 | 2 | 7,5 | 3,75 | 7,5 | 2,08 | 7,5 | 2,5 | 30 | 10,33 | 34,4 % |
| Planejamento de Projeto | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 2,17 | 1,33 | 2,67 | 200,8 % |
| Atividades Gerenciais | 1,33 | 3,55 | 1,33 | 1,17 | 1,33 | 0 | 1,5 | 1,7 | 5,49 | 6,42 | 116,9 % |
| Verificando apontamento | 1,92 | 2,43 | 1,92 | 1,63 | 1,92 | 1,97 | 1,92 | 1,58 | 7,68 | 7,61 | 99,1 % |
| Auxilio ao Desenvolvimento | 1 | 0,67 | 1 | 2,75 | 1 | 2,68 | 1 | 1,33 | 4 | 7,43 | 185,8 % |
| Criacao de Ambiente de Desenv. | 1,5 | 2,47 | 1,5 | 1,15 | 1,5 | 2,68 | 1,5 | 0,87 | 6 | 7,17 | 119,5 % |
| Sprint Planning 2 | 2,5 | 0,67 | 2,5 | 0,83 | 2,5 | 0,42 | 2,5 | 0,83 | 10 | 2,75 | 27,5 % |
| Analise Retorno O.S. | 0 | 2,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 | 0 | 3,5 | 0,0 % |
| Clean Code | 1,83 | 0,33 | 1,83 | 0 | 1,83 | 0,5 | 1,83 | 0,33 | 7,32 | 1,16 | 15,8 % |
| Geração de Atas | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,33 | 0,25 | 0 | 0,25 | 0,28 | 1 | 0,61 | 61,0 % |
| Auditoria de DD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Pre-teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Verificar o.s no nome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Documentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Gerenciamento de Rede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Preparando ambiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Ausencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Folga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Checklist dos Backups | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atendimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Recesso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atestado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |


| Correção de Erros Interno | 1,25 | 0 | 1,25 | 0 | 1,25 | 0 | 1,25 | 0 | 5 | 0 | 0,0 % |
|---------------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Teste Automatizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Zabbix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auditoria da Garantia da Qualidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Férias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Manutenção Preventiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Release Notes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atraso / Saida antecipada | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,15 | 0,0 % |
| Levantamento de Requisito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Compilacao de sistemas | 1 | 0,68 | 1 | 0,42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1,1 | 27,5 % |
| Feriado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Organização sala / equipamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Teste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Manutenção de Servidores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Analise de O.S | 0 | 0 | 0 | 3,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,52 | 0,0 % |
| Recursos Humanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Integrações de sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Geracao de Baseline | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 % |
| Atividade Externa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio suporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Análise de Sistemas H/FW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Instrutor Treinamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Atendimento GBS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Fazendo manual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Curso/Palestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Banheiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxilio Review | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auditoria de Gerencia de Configuracao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Auxílio Desenv. Outras Equipes | 0,5 | 1,32 | 0,5 | 0,22 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 1,54 | 77,0 % |
| Abrir o.s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Correcao de Erros Externo | 1,25 | 0 | 1,25 | 0 | 1,25 | 0 | 1,25 | 0 | 5 | 0 | 0,0 % |
| Particular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 0,0 % |
| Auxilio Comercial / Backoffice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Solicitar merge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Outros | 0 | 0,67 | 0 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,25 | 0,0 % |
| Check List | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Merge O.S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Total Geral | 219,99 | 225,5 | 219,99 | 243,88 | 219,99 | 234,88 | 219,99 | 236,01 | 879,96 | 940,27 | 106,9 % |

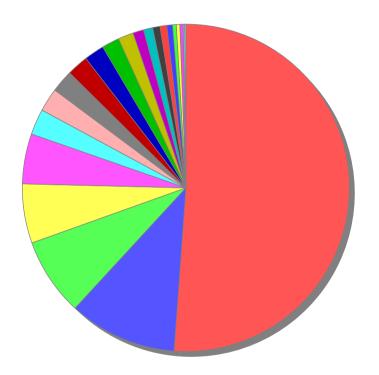

- Desenvolvimento [51.15%]
- Treinamento [10.7%]
- Code Review [7.68%]
- Analise de Sistema [5.86%]
- Daily Scrum [4.94%]
- Ocafe [2.54%]
- Reuniao [2.32%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [2.21%]
- Retrospectiva [2.12%]
- Sizing [1.98%]
- Atualizacao de Versao [1.73%]
- Ginastica Laboral [1.53%]
- Sprint Planning 1 [1.06%]
- Planejamento de Projeto [0.92%]
- Atividades Gerenciais [0.72%]
- Verificando apontamento [0.67%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.56%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.37%]
- Sprint Planning 2 [0.35%]
- Analise Retorno O.S. [0.33%]
- Clean Code [0.14%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


| | | Spri | nt 1 | Spri | nt 2 | Spri | int 3 | Spri | nt 4 | То | tal | % HP/HR |
|------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Area CMMI | | Planejado | Realizado | Total |
| RD - Desenvolvimento de Requisitos | 3 | 116,58 | 127,9 | 116,58 | 120,48 | 116,58 | 126,4 | 112,75 | 123,27 | 462,49 | 498,05 | 107,7 % |
| PMC - Monitoramento e Controle de | Projeto | 32,17 | 22,8 | 32,17 | 21,78 | 32,17 | 29,07 | 32,17 | 34,8 | 128,68 | 108,45 | 84,3 % |
| REQM - Gestao de Requisitos | | 26,33 | 19,4 | 26,33 | 31,18 | 26,33 | 27,87 | 26,33 | 22,6 | 105,32 | 101,05 | 95,9 % |
| DIV - Diversos* | | 16,25 | 25,4 | 16,25 | 22,55 | 16,25 | 14,42 | 18,25 | 21,98 | 67 | 84,35 | 125,9 % |
| PI - Integracao de Produto | | 2,5 | 2,52 | 2,5 | 6,35 | 2,5 | 2,52 | 2,5 | 4,08 | 10 | 15,47 | 154,7 % |
| PP - Planejamento de Projeto | | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 | 2,17 | 1,33 | 2,67 | 200,8 % |
| CM - Gerencia de Configuracao | | 1 | 1,18 | 1 | 0,42 | 1 | 0 | 1,5 | 0 | 4,5 | 1,6 | 35,6 % |
| OT - Treinamento na Organizacao | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| PPQA - Garantia da Qualidade de P | rocesso e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| | Total Geral | 194,83 | 199,7 | 194,83 | 202,76 | 194,83 | 200,28 | 194,83 | 208,9 | 779,32 | 811,64 | 104,1 % |

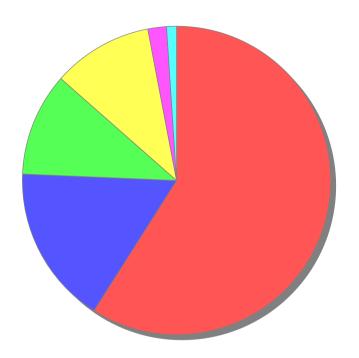


- Desenvolvimento de Requisitos [59.01%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [16.66%]
- Gestao de Requisitos [10.82%]
- Diversos* [10.52%]
- Integracao de Produto [1.95%]
- O Planejamento de Projeto [1.04%]

INDICADORES DO PROJETO


| | 202303 | 202304 | 202305 | 202306 | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 |
|--|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| 01. Horas planejadas de todas atividades | 880h00m | 798h24m | 792h00m | 1005h36m | 880h00m | 880h00m | 792h00m | 880h00m |
| 02. Horas realizadas de todas atividades | 905h31m | 833h01m | 795h51m | 930h23m | 938h39m | 950h28m | 824h44m | 940h16m |
| 03. Horas planejadas de desenvolvimento | 710h05m | 631h54m | 588h30m | 779h36m | 696h35m | 653h50m | 580h10m | 583h00m |
| 04. Horas realizadas de desenvolvimento | 709h15m | 665h48m | 628h26m | 732h19m | 690h49m | 708h03m | 518h09m | 579h39m |
| 05. Pontos planejados para o projeto | 241,5 | 214,0 | 200,0 | 234,0 | 208,0 | 200,0 | 176,0 | 180,0 |
| 06. Pontos planejados | 201,5 | 201,0 | 230,5 | 230,5 | 209,0 | 244,0 | 187,0 | 173,5 |
| 07. Pontos entregues | 216,5 | 204,5 | 192,5 | 222,5 | 220 | 220 | 166,5 | 192,5 |
| 08. Pontos entregues (apenas Tarefa) | 163,50 | 158,00 | 137,50 | 169,50 | 168,00 | 167,50 | 142,50 | 129,50 |
| 09. Pontos entregues (apenas NP) | 53,00 | 46,50 | 55,00 | 53,00 | 52,00 | 52,50 | 24,00 | 63,00 |
| 10. Pontos entregues (apenas Erro) | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa) | 54 | 57 | 35 | 50 | 73 | 60 | 50 | 44 |
| 12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP) | 34 | 34 | 50 | 43 | 45 | 57 | 36 | 68 |
| 13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro) | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 14. Horas de correção de bug | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m | 0h00m |
| 15. Pontos de retrabalho | 1 | 1,5 | 2 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 0 | 6 |
| 16. Produtividade planejada | 0,284 | 0,319 | 0,392 | 0,296 | 0,301 | 0,374 | 0,323 | 0,298 |
| 17. Produtividade realizada | 0,306 | 0,308 | 0,307 | 0,304 | 0,319 | 0,311 | 0,322 | 0,333 |
| 18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto | 89,7 | 95,6 | 96,3 | 95,1 | 105,8 | 110 | 94,7 | 107 |
| 19. % Pontos NP / Pontos entregues | 24,5 | 22,8 | 28,6 | 23,9 | 23,7 | 23,9 | 14,5 | 32,8 |

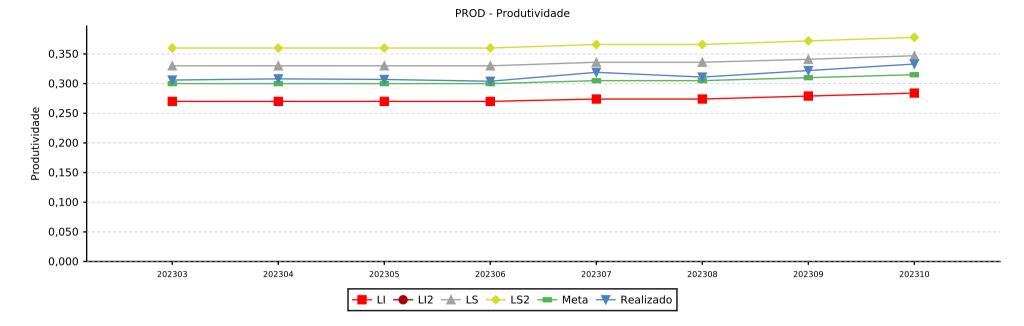


| | 202303 | 202304 | 202305 | 202306 | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 0,306 | 0,308 | 0,307 | 0,304 | 0,319 | 0,311 | 0,322 | 0,333 |
| Meta | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,305 | 0,305 | 0,310 | 0,315 |
| LS2 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,360 | 0,366 | 0,366 | 0,372 | 0,378 |
| LS | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,330 | 0,336 | 0,336 | 0,341 | 0,347 |
| LI2 | | | | | | | | |
| LI | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,274 | 0,274 | 0,279 | 0,284 |

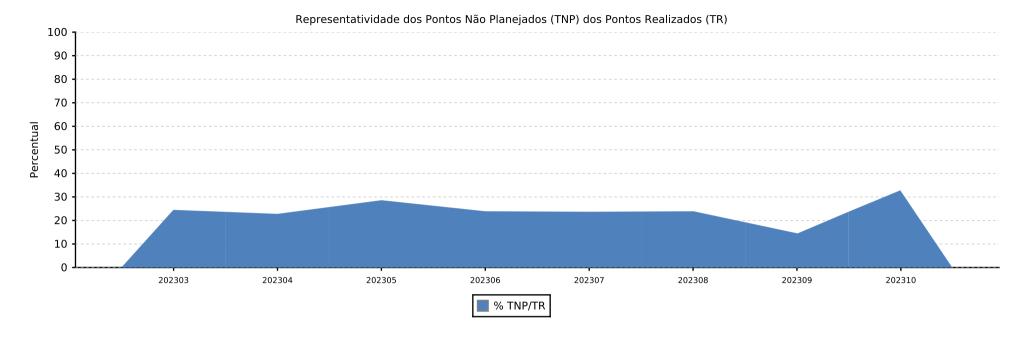


| | 202303 | 202304 | 202305 | 202306 | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TR - Pontos Realizados | 216.5 | 204.5 | 192.5 | 222.5 | 220 | 220 | 166.5 | 192.5 |
| TNP - Pontos Não Planejados | 53 | 46.5 | 55 | 53 | 52 | 52.5 | 24 | 63 |
| % TNP/TR | 24,5 | 22,8 | 28,6 | 23,9 | 23,7 | 23,9 | 14,5 | 32,8 |

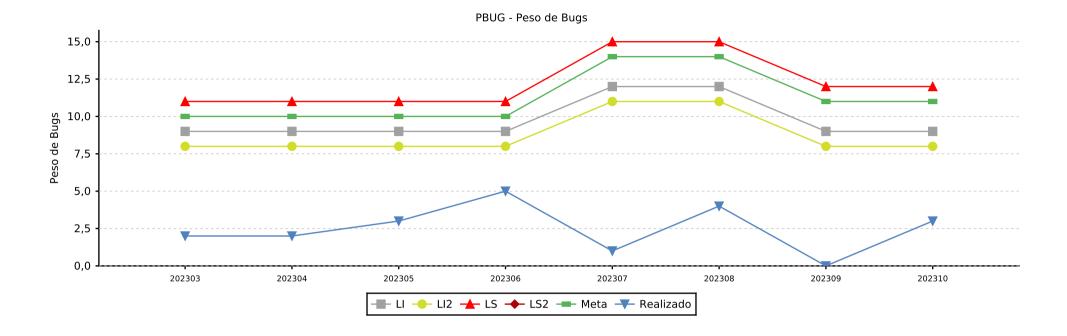


| | 202303 | 202304 | 202305 | 202306 | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Meta | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 11 | 11 |
| LS2 | | | | | | | | |
| LS | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 12 | 12 |
| LI2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 |
| LI | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 9 | 9 |
| Pontos Entregues | 216.5 | 204.5 | 192.5 | 222.5 | 220 | 220 | 166.5 | 192.5 |
| % PBUG / TR | 0,93 | 0,98 | 1,56 | 2,25 | 0,46 | 1,82 | 0,00 | 1,56 |

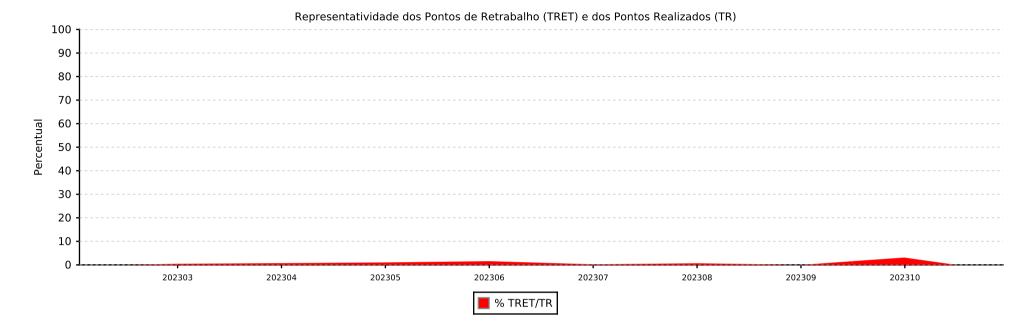


| | 202303 | 202304 | 202305 | 202306 | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TR - Pontos Realizados | 216.5 | 204.5 | 192.5 | 222.5 | 220 | 220 | 166.5 | 192.5 |
| TRET - Pontos de Retrabalho | 1 | 1.5 | 2 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 6 |
| % TRET/TR | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 0,2 | 0,7 | 0,0 | 3,1 |

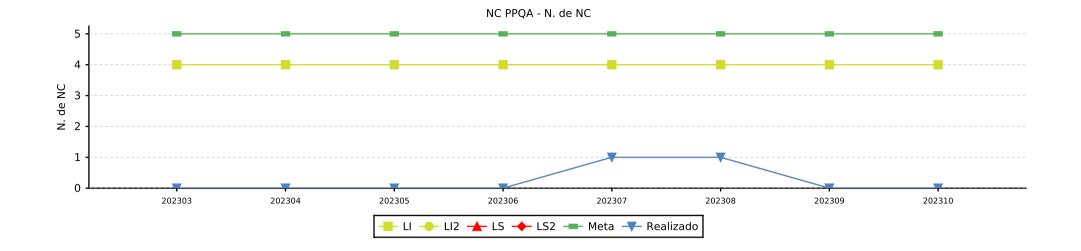

| | 202303 | 202304 | 202305 | 202306 | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Meta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| LS2 | | | | | | | | |
| LS | | | | | | | | |
| LI2 | | | | | | | | |
| LI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

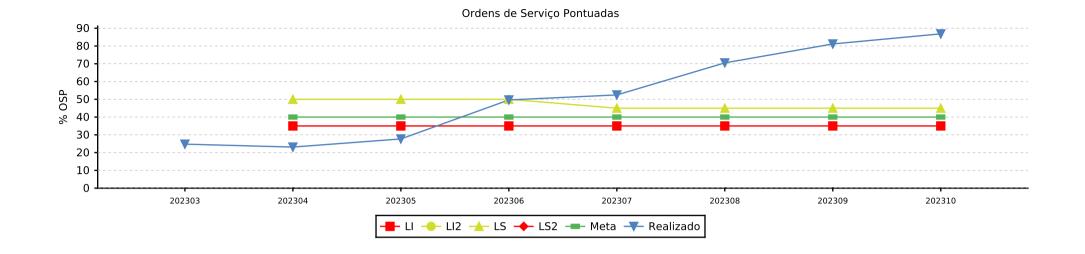

| | 202303 | 202304 | 202305 | 202306 | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Realizado | 24.76 | 23.11 | 27.69 | 49.64 | 52.46 | 70.5 | 81.15 | 86.83 |
| Meta | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| LS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LS | 0 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| LI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |




% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [51.13%]
- Treinamento [12.13%]
- Analise de Sistema [6.86%]
- Code Review [5.3%]
- Daily Scrum [4.14%]
- Ocafe [2.69%]
- Sizing [2.12%]
- Reuniao [2.1%]
- Retrospectiva [2.09%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [1.78%]

Atraso / Saida antecipada [0.02%]

- Atualizacao de Versao [1.65%]
- Ginastica Laboral [1.58%]
- Sprint Planning 1 [1.1%]
- Verificando apontamento [0.81%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.79%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.76%]
- Atividades Gerenciais [0.68%]
- Analise de O.S [0.37%]
- Analise Retorno O.S. [0.37%]
- Sprint Planning 2 [0.29%]
- Particular [0.29%]
- Planejamento de Projeto [0.28%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.16%]
- Outros [0.13%]
- Clean Code [0.12%]
- Compilacao de sistemas [0.12%]
- Geração de Atas [0.07%]
- Geracao de Baseline [0.05%]

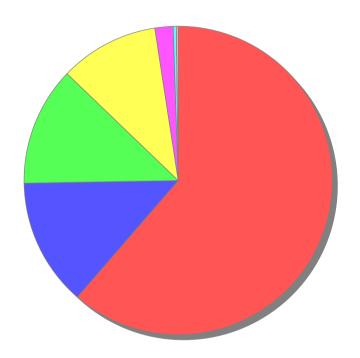

- Desenvolvimento de Requisitos [52.97%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [11.53%]
- Gestao de Requisitos [10.75%]
- Diversos* [8.97%]
- Integracao de Produto [1.65%]
- Planejamento de Projeto [0.28%]
- Gerencia de Configuracao [0.17%]
