

INDICADORES DA SPRINT

		202404				202405		
	2	3	4	0	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	396h00m	388h00m	400h00m	0h00m	387h00m	328h00m	402h00m	338h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	412h39m	405h15m	419h32m	0h16m	443h40m	354h05m	460h07m	361h28m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	317h30m	313h35m	320h30m	0h00m	300h10m	253h40m	315h10m	261h30m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	280h06m	288h58m	303h16m	0h00m	275h19m	222h32m	309h31m	215h16m
05. Pontos planejados	89,5	53,0	75,5	0,0	56,0	68,5	65,5	52,0
06. Pontos entregues	96	61,5	96,5	0	78,5	84	85	40
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	70,00	54,00	85,50	0	59,00	80,00	75,00	25,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	26,00	7,50	11,00	0	19,50	4,00	10,00	15,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	3	2	0	0	0	3	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	31	24	28	0	26	31	32	17
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	17	5	8	0	16	5	6	4
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	2	0	0	0	3	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0,5	1	0	0,5	0	2,5	0
15. Produtividade planejada	0,282	0,170	0,236	0	0,187	0,271	0,208	0,199
16. Produtividade realizada	0,343	0,213	0,319	0,280	0,286	0,378	0,275	0,186
17. % Pontos NP / Pontos entregues	27,1	12,2	11,4	0	24,9	4,8	11,8	37,5

PROD - Produtividade

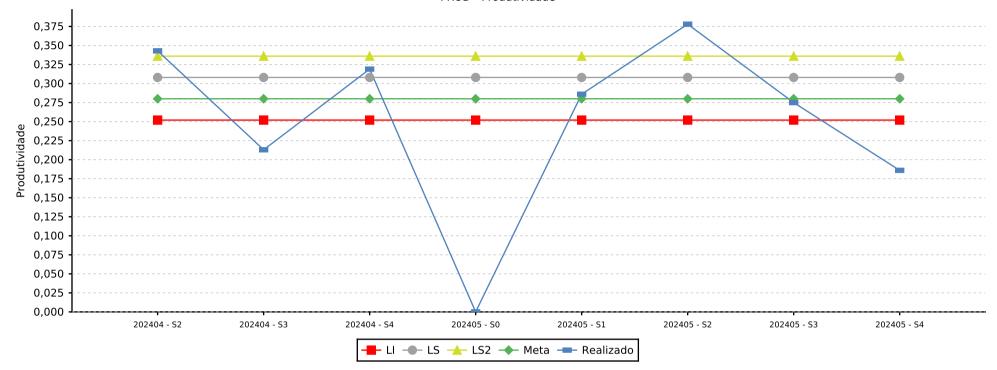


		202404				202405		
	2	3	4	0	1	2	3	4
Realizado	0,343	0,213	0,319	0	0,286	0,378	0,275	0,186
Meta	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280
LS2	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
LS	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308
LI	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252	0,252

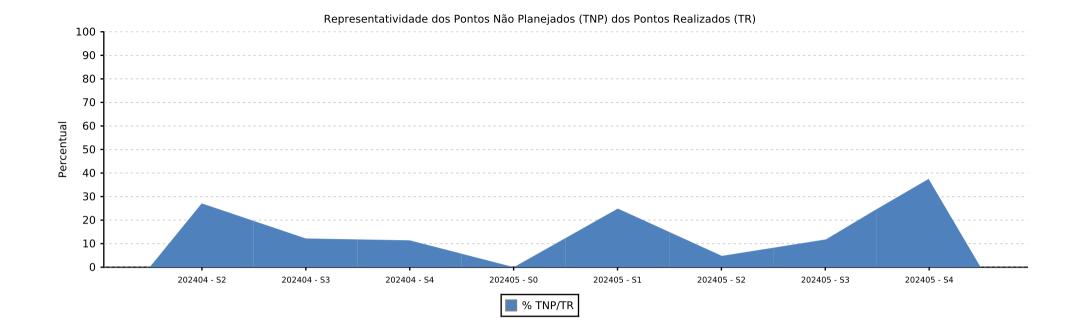


		202404				202405		
	2	2 3 4 0 1 2 3					3	4
TR - Pontos Realizados	96	61.5	96.5	0	78.5	84	85	40
TNP - Pontos Não Planejados	26	7.5	11	0	19.5	4	10	15
% TNP/TR	27,1	12,2	11,4	0,0	24,9	4,8	11,8	37,5

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

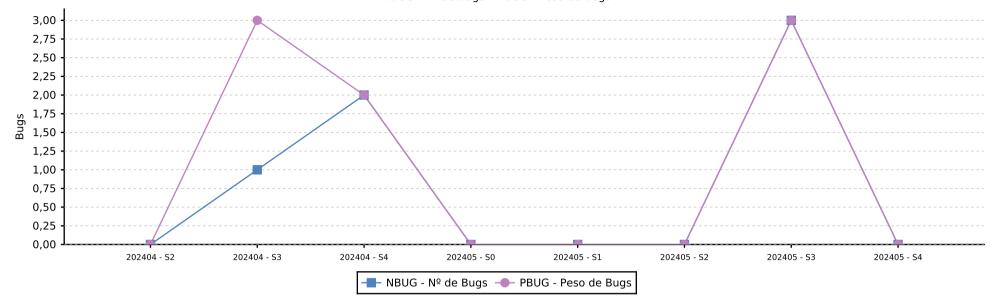

		202404				202405	-	
	2	3	4	0	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	1	2	0	0	0	3	0
PBUG - Peso de Bugs	0	3	2	0	0	0	3	0
Pontos Entregues	96	61.5	96.5	0	78.5	84	85	40
% PBUG / TR	0,00	4,88	2,08	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00

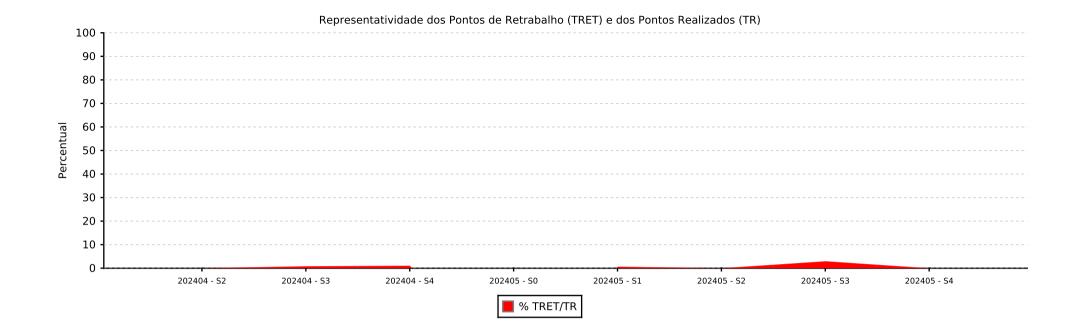


		202404				202405		
	2	2 3 4 0 1 2 3					3	4
TR - Pontos Realizados	96	61.5	96.5	0	78.5	84	85	40
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0.5	1	0	0.5	0	2.5	0
% TRET/TR	0,0	0,8	1,0	0,0	0,6	0,0	2,9	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Spr	int 1	Spr	int 2	Spri	int 3	Spri	int 4	To	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	242,92	253,57	201	177,65	258,42	276,25	206,08	167,93	908,42	875,4	96,4 %
Analise de Sistema	23,5	29,78	21,17	33,9	23,5	35,28	21,25	31,62	89,42	130,58	146,0 %
Ausencia	0	53	0	35,88	0	45,48	0	24,98	0	159,34	0,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	19,15	0	19,15	0,0 %
Code Review	19,5	35,63	17	13,53	19,5	16,05	17	15,8	73	81,01	111,0 %
Sprint Planning 1	15	0	15	9	15	14	15	14,63	60	37,63	62,7 %
Retrospectiva	11,67	0	11,67	9,75	11,67	5	11,67	9,33	46,68	24,08	51,6 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	4,58	0,9	4,42	4,6	4,58	0,25	4,58	8,97	18,16	14,72	81,1 %
Preparando ambiente	0,33	1,3	0,33	2,97	0,33	0,9	0,33	7,83	1,32	13	984,8 %
Cafe	11	11	8,75	8,75	11	10,5	9	7,73	39,75	37,98	95,5 %
Sizing	6	5,18	5	0	6	4,92	5	7,3	22	17,4	79,1 %
Ginastica Laboral	8,17	7,78	6,5	5,95	8,17	6,8	6,83	5,45	29,67	25,98	87,6 %
Daily Scrum	13,33	7,98	10	7,97	13,33	3,4	10,33	4,93	46,99	24,28	51,7 %
Clean Code	4	2,58	3,75	5,2	4	0	3,92	4,42	15,67	12,2	77,9 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1,17	8,08	1,17	5,08	1,17	3,07	1,17	4,35	4,68	20,58	439,7 %
Sprint Planning 2	5	0	5	5,25	5	4,5	5	4	20	13,75	68,8 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	1,28	0,67	0	1	5,62	0,67	3,58	3,34	10,48	313,8 %
Analise de O.S	0	2,07	0	3,33	0	1,58	0	3,42	0	10,4	0,0 %
Atualizacao de Versao	2,5	3,1	2	2,63	2,5	3,3	2	2,92	9	11,95	132,8 %
Verificando apontamento	6	3,62	5,58	3,15	6	5,25	5,92	2,8	23,5	14,82	63,1 %
Atividades Gerenciais	1	1,85	1	2,37	1	0	1	2,7	4	6,92	173,0 %
Analise Retorno O.S.	0,17	0	0,17	0,72	0,17	0	0,17	2	0,68	2,72	400,0 %
Treinamento	1,08	7,13	0,92	0,67	1,08	0,33	0,92	1,82	4	9,95	248,7 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	1,75	0	1,75	0,0 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	2,25	1	2,25	1	44,4 %
Reuniao	3,33	5,57	1,67	3,63	3,33	8,33	2,67	0,72	11	18,25	165,9 %
Outros	0	1,53	0	7,48	0	4,63	0	0,33	0	13,97	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0,22	0	0	0	0,17	0	0	0	0,39	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuração	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,58	0,5	0,58	0,17	0,58	4,5	0,58	0	2,32	5,17	222,8 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,92	0	1,92	0	1,92	0	1,92	0	7,68	0	0,0 %


Particular		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno		2,17	0	2,17	0	2,17	0	2,17	0	8,68	0	0,0 %
Teste Automatizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas		0,25	0	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0	1	0,25	25,0 %
Release Notes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas		0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,32	0	0,0 %
Feriado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento		0	0	0	4,2	0	0	0	0	0	4,2	0,0 %
Teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline		0,5	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,0 %
Atividade Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	387	443,65	328,02	354,08	402	460,11	338,01	361,46	1.455,03	1.619,3	111,3 %

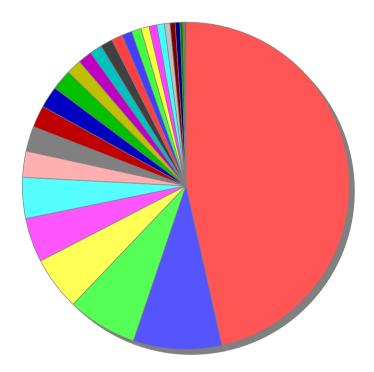

- Desenvolvimento [46.46%]
- Analise de Sistema [8.75%]
- Ausencia [6.91%]
- Atestado [5.3%]
- Code Review [4.37%]
- Sprint Planning 1 [4.05%]
- Retrospectiva [2.58%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [2.48%]
- Preparando ambiente [2.17%]
- Cafe [2.14%]
- Sizing [2.02%]
- Ginastica Laboral [1.51%]
- Daily Scrum [1.36%]
- Clean Code [1.22%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.2%]
- Sprint Planning 2 [1.11%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.99%]
- Analise de O.S [0.95%]
- Atualizacao de Versao [0.81%]
- Verificando apontamento [0.77%]
- Atividades Gerenciais [0.75%]
- Analise Retorno O.S. [0.55%]
- Treinamento [0.5%]
- Manutenção de Servidores [0.48%]
- Planejamento de Projeto [0.28%]
- Reuniao [0.2%]
- Outros [0.09%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	int 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	S	257,33	265,63	215	192,7	272,83	284,07	220,42	185,67	965,58	928,07	96,1 %
REQM - Gestao de Requisitos		50	36,27	46,67	51,83	50	59,6	46,75	67,38	193,42	215,08	111,2 %
DIV - Diversos*		24,5	82,02	18,58	64,07	24,5	81,37	20,17	45,5	87,75	272,96	311,1 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	44,5	43,62	38,67	31,25	44,5	24,45	39	30,07	166,67	129,39	77,6 %
PI - Integracao de Produto		2,5	3,1	2	2,63	2,5	3,3	2	2,92	9	11,95	132,8 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	2,25	1	2,25	1	44,4 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		0,83	0	0,33	0	0,33	0	0,33	0	1,82	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	379,66	430,64	321,25	342,48	394,66	452,79	330,92	332,54	1.426,49	1.558,45	109,3 %

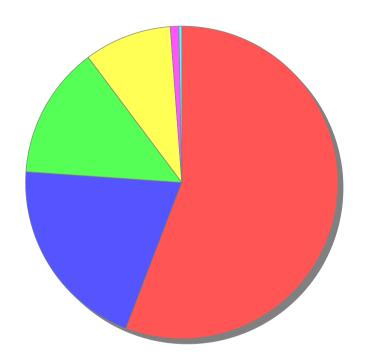


- Desenvolvimento de Requisitos [55.84%]
- Gestao de Requisitos [20.26%]
- Diversos* [13.68%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [9.04%]
- Integracao de Produto [0.88%]
- Planejamento de Projeto [0.3%]

INDICADORES DO PROJETO


	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405
01. Horas planejadas de todas atividades	800h00m	840h00m	612h20m	1451h12m	1416h00m	1376h00m	1543h12m	1455h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	845h36m	909h31m	655h11m	1563h21m	1483h22m	1479h18m	1607h11m	1619h36m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	457h20m	470h44m	389h00m	1172h42m	1116h50m	1057h40m	1229h08m	1130h30m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	468h37m	493h13m	416h24m	1063h55m	1101h33m	1003h37m	1134h08m	1022h38m
05. Pontos planejados para o projeto	144,0	148,0	142,0	339,5	327,0	312,0	348,0	316,0
06. Pontos planejados	153,0	168,5	146,5	282,0	297,5	316,5	296,5	242,0
07. Pontos entregues	165,5	164,5	134	338	344	293,5	328,5	287,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	121,50	134,50	107,00	261,00	257,50	222,00	270,50	239,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	44,00	30,00	27,00	77,00	86,50	71,50	58,00	48,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	0	5	4	0	5	3
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	35	32	28	74	67	84	107	106
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	39	31	15	64	71	57	43	31
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	2	2	0	3	3
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0	0,5	0	2,5	0,5	2,5	3,5	3
16. Produtividade planejada	0,335	0,358	0,377	0,241	0,267	0,300	0,242	0,215
17. Produtividade realizada	0,354	0,334	0,322	0,318	0,313	0,293	0,290	0,282
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	115	111,2	94,4	99,6	105,2	94,1	94,4	91
19. % Pontos NP / Pontos entregues	26,6	18,3	20,2	22,8	25,2	24,4	17,7	16,9

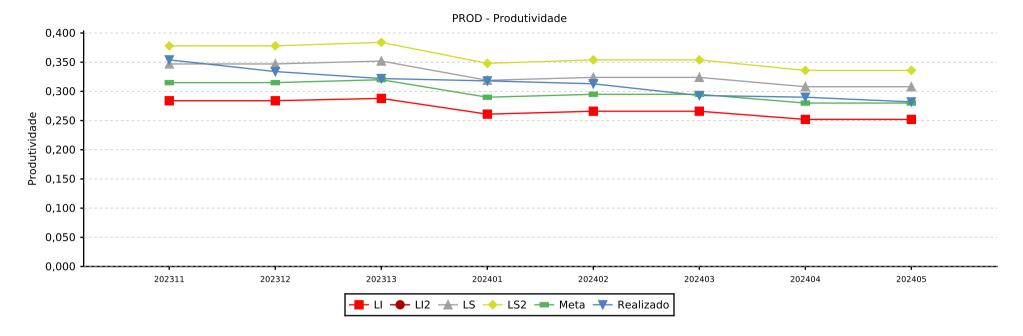


	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405
Realizado	0,354	0,334	0,322	0,318	0,313	0,293	0,290	0,282
Meta	0,315	0,315	0,320	0,290	0,295	0,295	0,280	0,280
LS2	0,378	0,378	0,384	0,348	0,354	0,354	0,336	0,336
LS	0,347	0,347	0,352	0,319	0,324	0,324	0,308	0,308
LI2								
LI	0,284	0,284	0,288	0,261	0,266	0,266	0,252	0,252

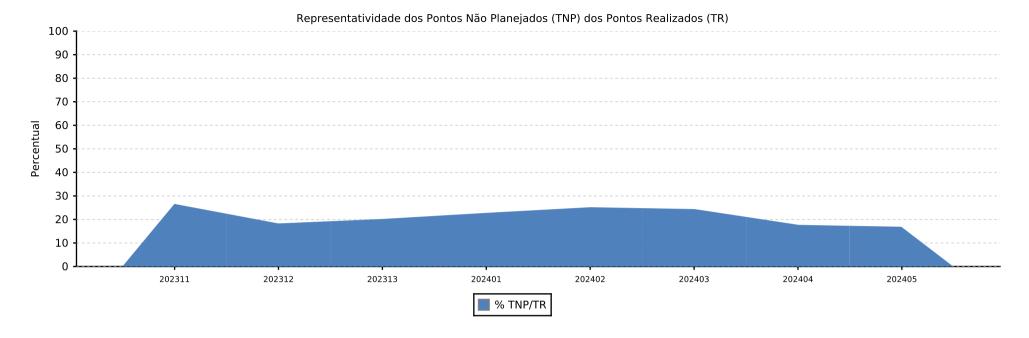


	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405
TR - Pontos Realizados	165.5	164.5	134	338	344	293.5	328.5	287.5
TNP - Pontos Não Planejados	44	30	27	77	86.5	71.5	58	48.5
% TNP/TR	26,6	18,3	20,2	22,8	25,2	24,4	17,7	16,9




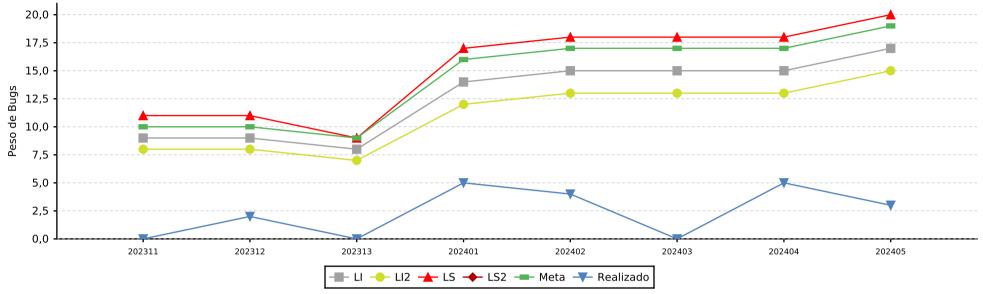


	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405
Realizado	0	2	0	5	4	0	5	3
Meta	10	10	9	16	17	17	17	19
LS2								
LS	11	11	9	17	18	18	18	20
LI2	8	8	7	12	13	13	13	15
LI	9	9	8	14	15	15	15	17
Pontos Entregues	165.5	164.5	134	338	344	293.5	328.5	287.5
% PBUG / TR	0,00	1,22	0,00	1,48	1,17	0,00	1,53	1,05

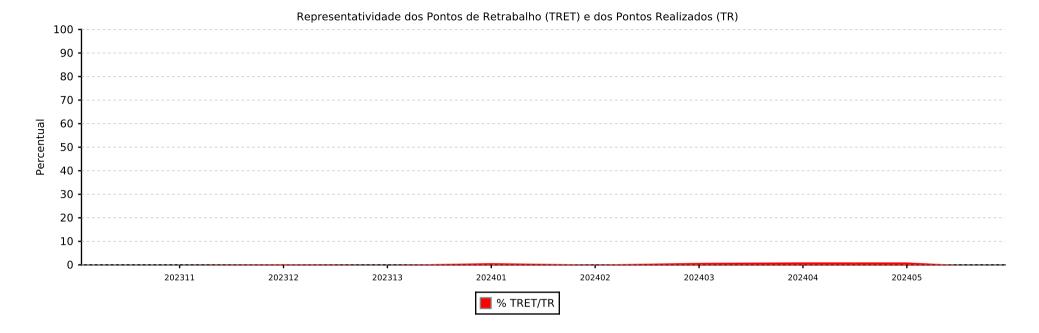

	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405
TR - Pontos Realizados	165.5	164.5	134	338	344	293.5	328.5	287.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0.5	0	2.5	0.5	2.5	3.5	3
% TRET/TR	0,0	0,3	0,0	0,7	0,1	0,9	1,1	1,0

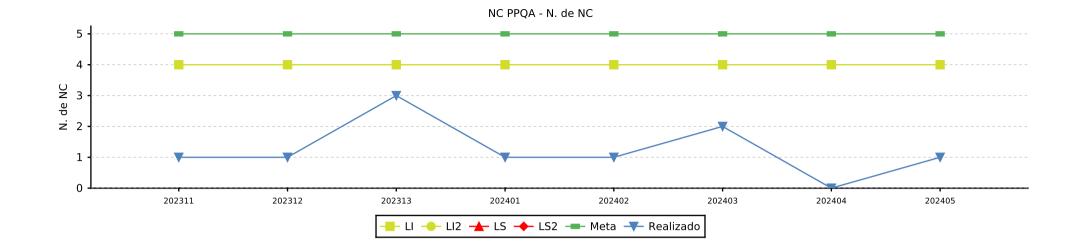

	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405
Realizado	1	1	3	1	1	2	0	1
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

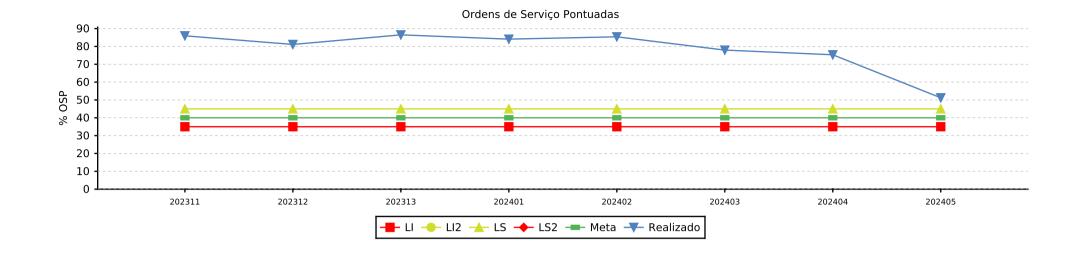


	202311	202312	202313	202401	202402	202403	202404	202405
Realizado	85.96	81.11	86.49	84.09	85.4	77.95	75.33	51.22
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [54.05%]
- Ausencia [9.85%]
- Analise de Sistema [8.06%]
- Code Review [5%]
- Cafe [2.35%]
- Sprint Planning 1 [2.32%]
- Ginastica Laboral [1.6%]
- Daily Scrum [1.5%]
- Retrospectiva [1.49%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.27%]
- Atestado [1.18%]
- Reuniao [1.13%]
- Sizing [1.07%]
- Verificando apontamento [0.92%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.91%]
- Outros [0.86%]
- Sprint Planning 2 [0.85%]
- Preparando ambiente [0.8%]
- Clean Code [0.75%]
- Atualizacao de Versao [0.74%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.65%]
- Analise de O.S [0.64%]
- Treinamento [0.61%]
- Atividades Gerenciais [0.43%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.32%]
- Organização sala / equipamento [0.26%]
- Analise Retorno O.S. [0.17%]
- Manutenção de Servidores [0.11%]

- Planejamento de Projeto [0.06%]
- Banheiro [0.02%]
- Geração de Atas [0.02%]

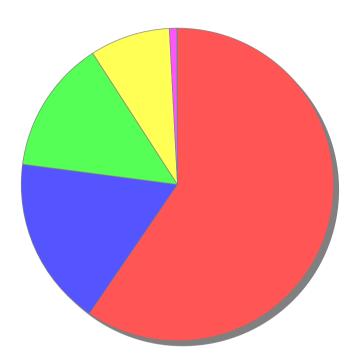

- Desenvolvimento de Requisitos [57.3%]
- Diversos* [16.86%]
- Gestao de Requisitos [13.28%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [7.99%]
- Integracao de Produto [0.74%]
- Planejamento de Projeto [0.06%]
