

## **INDICADORES DA SPRINT**

		202	503			202	504	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	294h00m	186h00m	250h00m	238h00m	206h00m	144h00m	204h00m	180h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	310h00m	184h45m	251h43m	243h54m	211h33m	143h26m	208h29m	186h31m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	212h55m	130h05m	204h25m	192h50m	161h30m	113h50m	156h20m	128h45m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	213h00m	94h13m	146h56m	150h58m	124h16m	79h15m	142h19m	112h31m
05. Pontos planejados	83,5	48,5	77,5	67,0	47,0	36,0	47,5	49,0
06. Pontos entregues	60,5	21	43	54	42,5	18	33,5	46,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	43,50	16,00	40,50	47,00	39,00	17,00	33,00	45,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	17,00	5,00	2,50	7,00	3,50	1,00	0,50	1,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	3	0	0	0	0	0	0	3
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	8	7	11	21	12	3	6	9
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	10	4	4	3	2	1	1	2
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	0	0	0	0	0	1
13. Horas de correção de bug	0h00m							
14. Pontos de retrabalho	2	0	0,5	0	0	0	0	1
15. Produtividade planejada	0,393	0,373	0,380	0,348	0,292	0,317	0,304	0,381
16. Produtividade realizada	0,285	0,223	0,293	0,358	0,342	0,228	0,236	0,414
17. % Pontos NP / Pontos entregues	28,1	23,9	5,9	13	8,3	5,6	1,5	3,3

PROD - Produtividade

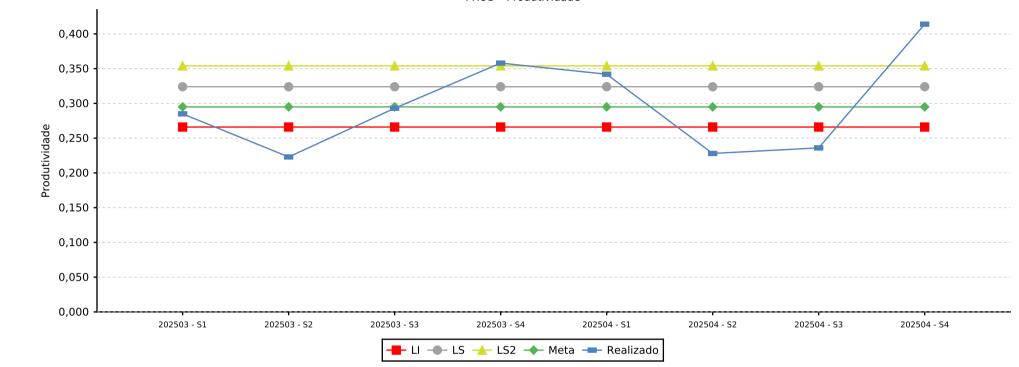


		202	503			202	504	
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,285	0,223	0,293	0,358	0,342	0,228	0,236	0,414
Meta	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295	0,295
LS2	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354
LS	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324
LI	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266	0,266

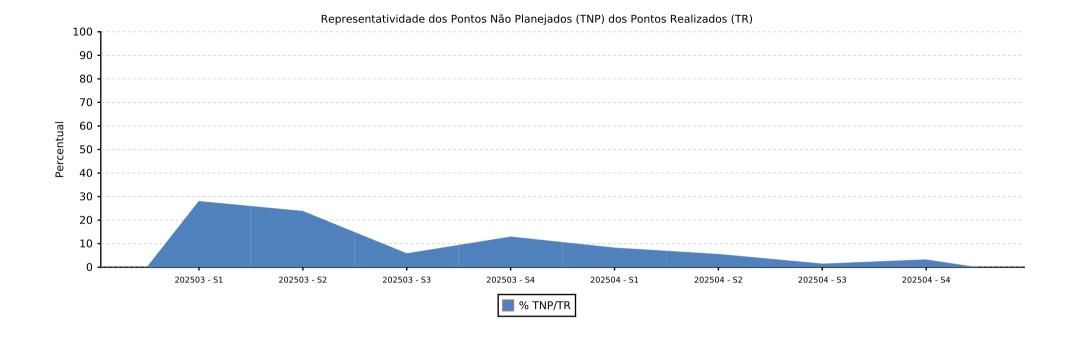


		202	503			202	504	
	1	1 2 3 4 1				2	3	4
TR - Pontos Realizados	60.5	21	43	54	42.5	18	33.5	46.5
TNP - Pontos Não Planejados	17	5	2.5	7	3.5	1	0.5	1.5
% TNP/TR	28,1	23,9	5,9	13,0	8,3	5,6	1,5	3,3

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

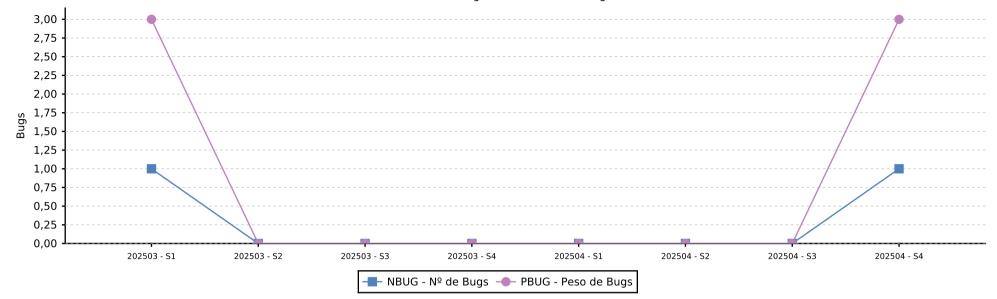

		202	503	-		202	504	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	1	0	0	0	0	0	0	1
PBUG - Peso de Bugs	3	0	0	0	0	0	0	3
Pontos Entregues	60.5	21	43	54	42.5	18	33.5	46.5
% PBUG / TR	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,46

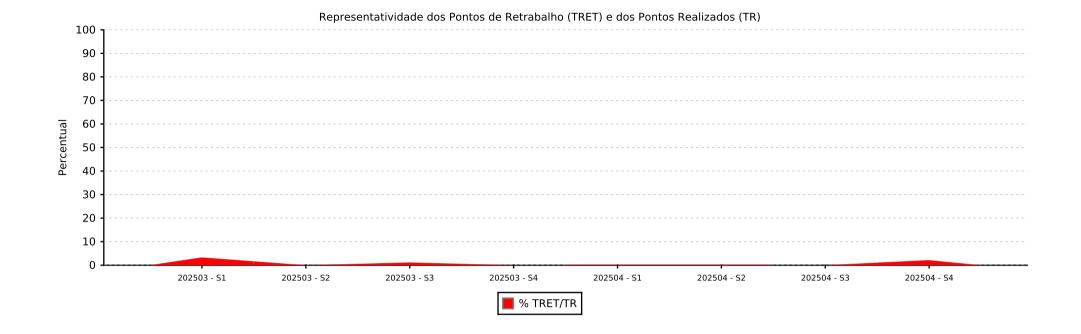


		202	503			202	504	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	60.5	21	43	54	42.5	18	33.5	46.5
TRET - Pontos de Retrabalho	2	0	0.5	0	0	0	0	1
% TRET/TR	3,3	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2

## **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spr	int 1	Spr	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	130,92	108,52	90,67	69,15	126,33	128,03	95,33	91,03	443,25	396,73	89,5 %
Analise de Sistema	8,75	25,57	5,75	17,32	11,75	22,52	11,5	19,27	37,75	84,68	224,3 %
Sizing	0	0	0	0	0	0	6	13,05	6	13,05	217,5 %
Code Review	12	17,32	9,5	12,98	14	9,23	13,5	8,47	49	48	98,0 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	2,92	3,15	2	6,22	2,92	5,02	2,75	6,5	10,59	20,89	197,3 %
Daily Scrum	7,83	5,58	5,42	2,42	7,33	4,5	6,67	5,5	27,25	18	66,1 %
Cafe	5,17	4,55	3,92	3,77	5,92	5,5	5,08	4,25	20,09	18,07	89,9 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,5	1,32	0,5	3,52	1	1	1	3,62	3	9,46	315,3 %
Sprint Planning 1	6	2,33	5	1	4,5	2	5,5	3	21	8,33	39,7 %
Ausencia	0	12,97	0	1,57	0	4,4	0	2,92	0	21,86	0,0 %
Ginastica Laboral	4	3,45	2,67	1,98	3,67	4,55	3,5	2,73	13,84	12,71	91,8 %
Atualizacao de Versao	2	0,17	2	0,17	4,5	1,92	4,5	2,45	13	4,71	36,2 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0,45	0	2,17	0	2,62	0,0 %
Retrospectiva	6	3,58	5	1,67	4,5	1,75	5,5	2	21	9	42,9 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,33	3,6	0,33	0	0,58	0,32	0,58	2	1,82	5,92	325,3 %
Verificando apontamento	2,5	2,45	2	1,72	1,83	1,78	1,33	1,58	7,66	7,53	98,3 %
Analise de O.S	0,83	2,57	0,5	5,03	0,83	0,5	0,67	1,53	2,83	9,63	340,3 %
Atividades Gerenciais	1,5	1,25	1	0,75	1,5	0,25	1	1,5	5	3,75	75,0 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,25	1,42	1,25	1,42	113,6 %
Sprint Planning 2	2,5	1,25	2	1,33	2	1	2,5	1,33	9	4,91	54,6 %
Outros	0,17	2,75	0,17	4,92	0,17	2,65	0,17	0,95	0,68	11,27	1.657,4
Banheiro	1,5	2,65	1,5	2,37	1,5	2,32	1	0,58	5,5	7,92	144,0 %
Reuniao	0	0	0	0	1	5,17	2,17	0,42	3,17	5,59	176,3 %
Merge O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0	0,25	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Compilacao de sistemas	0,5	2,08	0,5	3,58	0,5	1,72	0,5	0	2	7,38	369,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0,83	0	0	0	0	0	0,83	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0,25	0	0,25	0	0,5	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0,5	0	0,85	0	0	0	0	0	1,35	0,0 %


Recursos Humanos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline		0	0,5	0	0	0	0	0,5	0	0,5	0,5	100,0 %
Atividade Externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo		0,75	0	0,75	0	1	0	1	0	3,5	0	0,0 %
Particular		4	0,35	0	0,13	0	0	0	0	4	0,48	12,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de DD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome		0,17	0,08	0,17	0	0,17	0,08	0,17	0	0,68	0,16	23,5 %
Documentação		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente		0	1,67	0	0	0	0	0	0	0	1,67	0,0 %
Folga		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno		2	0	0,5	0	2,25	1,08	2,17	0	6,92	1,08	15,6 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao		0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0,0 %
Clean Code		2,83	0,93	1,83	0	2,75	0,5	2,67	0	10,08	1,43	14,2 %
Teste Automatizado		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas		0,33	0,42	0,33	0,17	0,25	0,25	0,25	0	1,16	0,84	72,4 %
	Total Geral	206	211,56	144,01	143,45	204	208,49	180,01	186,52	734,02	750,02	102,2 %

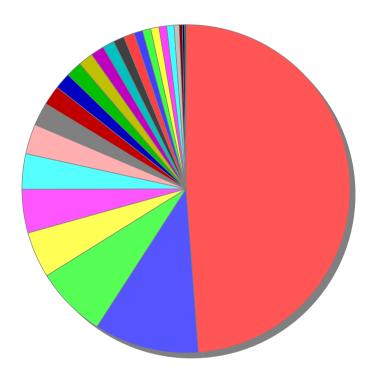

- Desenvolvimento [48.8%]
- Analise de Sistema [10.33%]
- Sizing [7%]
- Code Review [4.54%]
- Atestado [4.29%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [3.48%]
- Daily Scrum [2.95%]
- Cafe [2.28%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.94%]
- Sprint Planning 1 [1.61%]
- Ausencia [1.57%]
- Ginastica Laboral [1.46%]
- Atualizacao de Versao [1.31%]
- Manutenção de Servidores [1.16%]
- Retrospectiva [1.07%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [1.07%]
- Verificando apontamento [0.85%]
- Analise de O.S [0.82%]
- Atividades Gerenciais [0.8%]
- Planejamento de Projeto [0.76%]
- Sprint Planning 2 [0.71%]
- Outros [0.51%]
- Banheiro [0.31%]
- Reuniao [0.23%]
- Merge O.S. [0.13%]

# HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	140,25	117,52	96,58	79,72	136,83	135,95	105,5	103,15	479,16	436,34	91,1 %
REQM - Gestao de Requisitos		17,25	31,32	12,75	20,5	18,25	25,52	25,5	36,65	73,75	113,99	154,6 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	25,83	26,48	19,92	17,07	25,83	15,48	25,67	15,97	97,25	75	77,1 %
DIV - Diversos*		10,83	24,97	7,75	12,98	13,25	22,52	12,92	13,02	44,75	73,49	164,2 %
PI - Integracao de Produto		2	0,17	2	0,17	4,5	1,92	4,5	2,45	13	4,71	36,2 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	1,25	1,42	1,25	1,42	113,6 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
CM - Gerencia de Configuração		0,5	2,58	0,5	3,58	0,5	1,72	1	0	2,5	7,88	315,2 %
	Total Geral	196,66	203,04	139,5	134,02	199,16	203,11	176,34	172,66	711,66	712,83	100,2 %

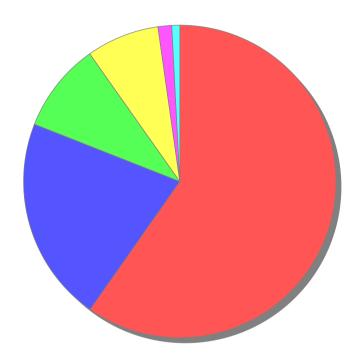


- Desenvolvimento de Requisitos [59.75%]
- Gestao de Requisitos [21.23%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [9.25%]
- Diversos\* [7.54%]
- Integracao de Produto [1.42%]
- Planejamento de Projeto [0.82%]

## **INDICADORES DO PROJETO**


	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504
01. Horas planejadas de todas atividades	1619h00m	1712h00m	1488h00m	922h00m	854h00m	1176h00m	968h00m	734h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1596h58m	1735h03m	1467h27m	968h44m	924h35m	1227h32m	990h22m	749h59m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1285h05m	1376h10m	1175h59m	669h35m	627h10m	887h30m	740h15m	560h25m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	1201h02m	1285h16m	1019h42m	630h15m	596h30m	757h47m	605h07m	458h21m
05. Pontos planejados para o projeto	360,0	385,0	330,0	194,0	180,0	256,0	218,0	165,0
06. Pontos planejados	414,5	463,5	410,5	199,0	242,0	314,0	276,5	179,5
07. Pontos entregues	370	413,5	319,5	183	173,5	228	178,5	140,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	280,50	331,00	289,50	150,00	134,00	200,00	147,00	134,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	89,50	82,50	30,00	33,00	39,50	28,00	31,50	6,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	6	4	4	6	6	3	3	3
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	80	100	87	52	49	53	47	30
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	75	48	36	23	23	22	21	6
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	2	2	2	2	2	1	1	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	1h55m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	1,5	3	11	2,5	4,5	1,5	2,5	1
16. Produtividade planejada	0,323	0,337	0,350	0,298	0,386	0,354	0,374	0,321
17. Produtividade realizada	0,309	0,322	0,314	0,291	0,291	0,301	0,295	0,307
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	102,8	107,5	96,9	94,4	96,4	89,1	81,9	85,2
19. % Pontos NP / Pontos entregues	24,2	20	9,4	18,1	22,8	12,3	17,7	4,7

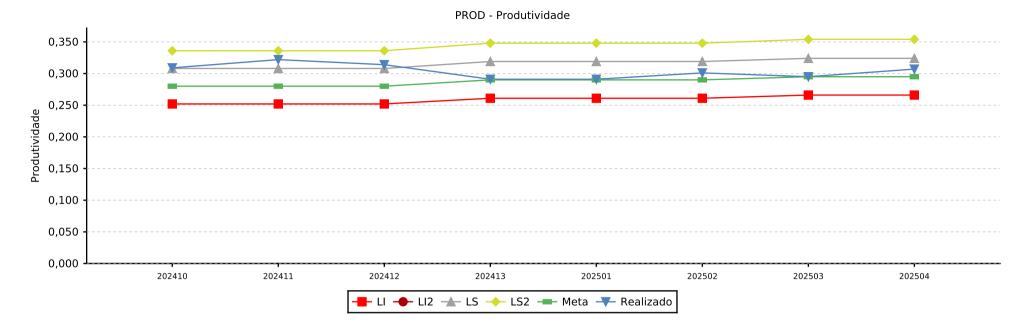


	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504
Realizado	0,309	0,322	0,314	0,291	0,291	0,301	0,295	0,307
Meta	0,280	0,280	0,280	0,290	0,290	0,290	0,295	0,295
LS2	0,336	0,336	0,336	0,348	0,348	0,348	0,354	0,354
LS	0,308	0,308	0,308	0,319	0,319	0,319	0,324	0,324
LI2								
LI	0,252	0,252	0,252	0,261	0,261	0,261	0,266	0,266

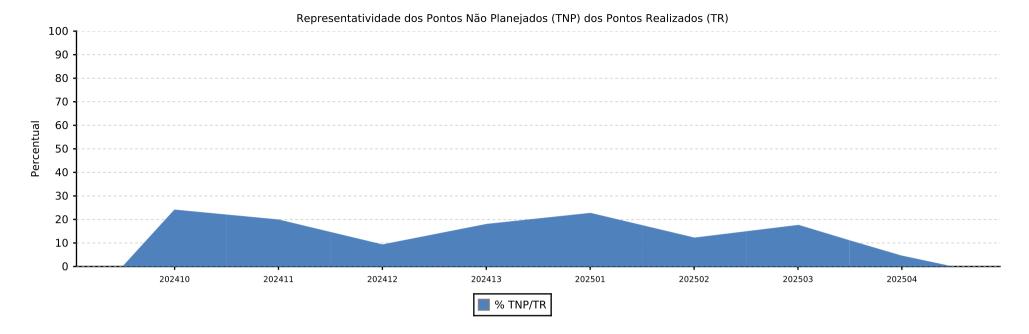


	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504
TR - Pontos Realizados	370	413.5	319.5	183	173.5	228	178.5	140.5
TNP - Pontos Não Planejados	89.5	82.5	30	33	39.5	28	31.5	6.5
% TNP/TR	24,2	20,0	9,4	18,1	22,8	12,3	17,7	4,7

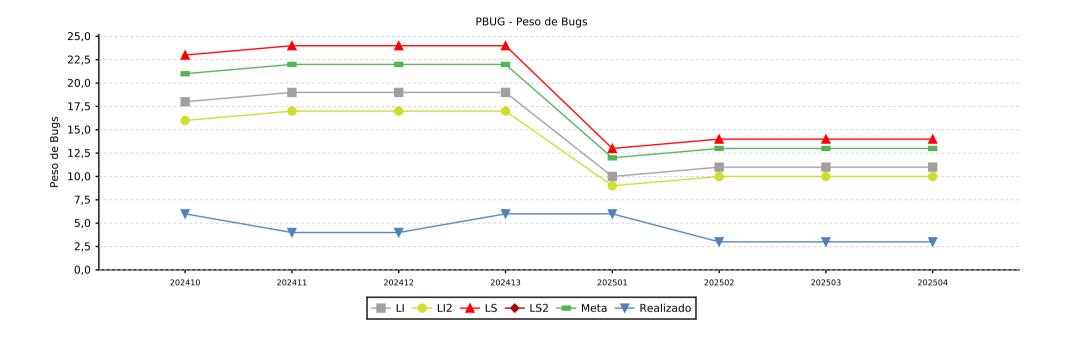


	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504
Realizado	6	4	4	6	6	3	3	3
Meta	21	22	22	22	12	13	13	13
LS2								
LS	23	24	24	24	13	14	14	14
LI2	16	17	17	17	9	10	10	10
LI	18	19	19	19	10	11	11	11
Pontos Entregues	370	413.5	319.5	183	173.5	228	178.5	140.5
% PBUG / TR	1,63	0,97	1,26	3,28	3,46	1,32	1,69	2,14

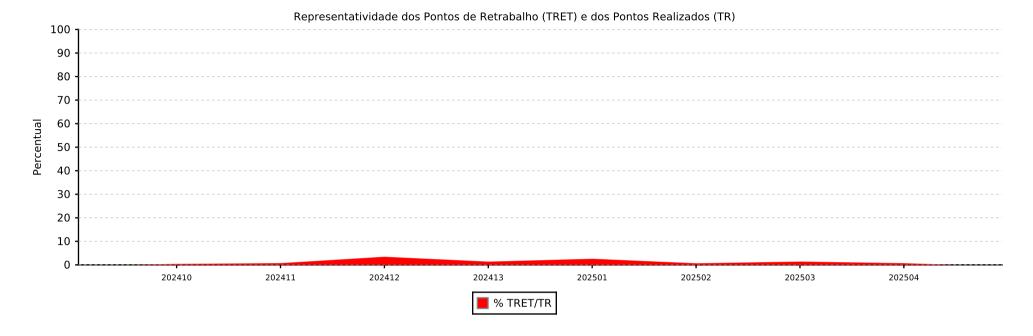

	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504
TR - Pontos Realizados	370	413.5	319.5	183	173.5	228	178.5	140.5
TRET - Pontos de Retrabalho	1.5	3	11	2.5	4.5	1.5	2.5	1
% TRET/TR	0,4	0,7	3,4	1,4	2,6	0,7	1,4	0,7

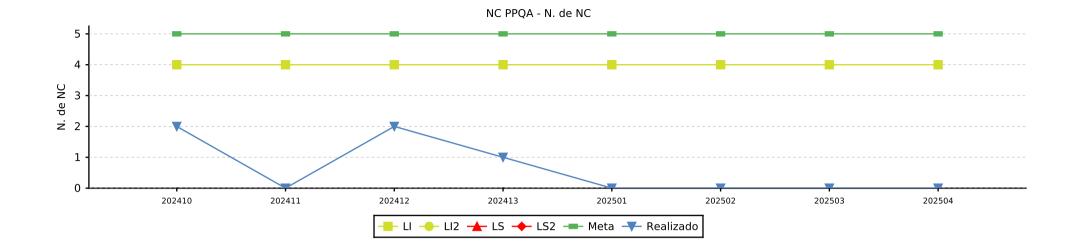

	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504
Realizado	2	0	2	1	0	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

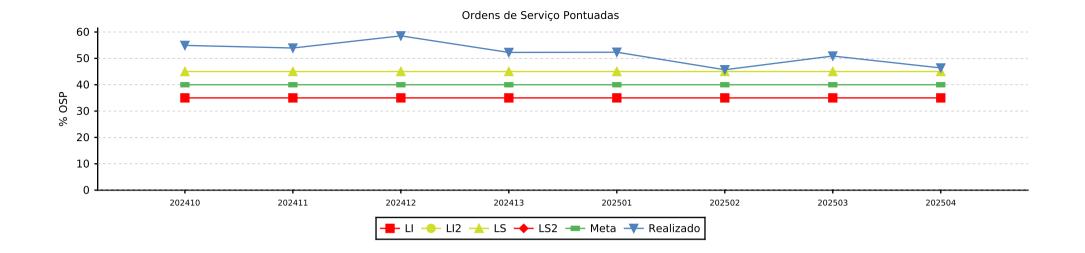


	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503	202504
Realizado	54.92	53.93	58.54	52.25	52.34	45.68	50.89	46.37
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

#### % de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [52.9%]
- Analise de Sistema [11.29%]
- Code Review [6.4%]
- Ausencia [2.91%]
- Oriação de Ambiente de Desenv. [2.78%] Particular [0.06%]
- Cafe [2.41%]
- Daily Scrum [2.4%]
- Sizing [1.74%]
- Ginastica Laboral [1.7%]
- Outros [1.5%]
- Analise de O.S [1.28%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.26%]
- Retrospectiva [1.2%]
- Sprint Planning 1 [1.11%]
- Atestado [1.07%]
- Banheiro [1.06%]
- Verificando apontamento [1%]
- Compilacao de sistemas [0.98%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.79%]
- Reuniao [0.74%]
- Sprint Planning 2 [0.66%]
- Atualizacao de Versao [0.63%]
- Atividades Gerenciais [0.5%]
- Manutenção de Servidores [0.35%]
- Preparando ambiente [0.22%]
- Clean Code [0.19%]
- Planejamento de Projeto [0.19%]
- Analise Retorno O.S. [0.18%]

- Correção de Erros Interno [0.14%]
- Teste [0.11%]
- Geração de Atas [0.11%]
- O Geração de Baseline [0.07%]
- Merge O.S. [0.03%]
- Verificar o.s no nome [0.02%]

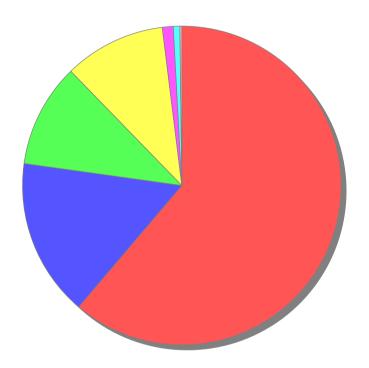

- Desenvolvimento de Requisitos [58.18%]
- Gestao de Requisitos [15.2%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [10%]
- Diversos\* [9.8%]
- Gerencia de Configuracao [1.05%]
- Integracao de Produto [0.63%]
- Planejamento de Projeto [0.19%]
