

## **INDICADORES DA SPRINT**

		202	502			202	503	
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	294h00m	294h00m	294h00m	294h00m	294h00m	186h00m	250h00m	238h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	305h04m	307h45m	313h31m	301h12m	310h00m	184h45m	251h43m	243h54m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	221h55m	221h55m	221h55m	221h45m	212h55m	130h05m	204h25m	192h50m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	193h01m	189h52m	194h33m	180h21m	213h00m	94h13m	146h56m	150h58m
05. Pontos planejados	71,5	80,0	91,5	71,0	83,5	48,5	77,5	67,0
06. Pontos entregues	41,5	68	57,5	61	60,5	21	43	54
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	36,50	51,00	56,50	56,00	43,50	16,00	40,50	47,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	5,00	17,00	1,00	5,00	17,00	5,00	2,50	7,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	3	0	3	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	15	12	13	13	8	7	11	21
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	7	10	2	3	10	4	4	3
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	1	0	1	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h30m	0h00m	0h00m	1h25m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0,5	0	1	0	2	0	0,5	0
15. Produtividade planejada	0,323	0,361	0,413	0,321	0,393	0,373	0,380	0,348
16. Produtividade realizada	0,216	0,359	0,296	0,339	0,285	0,223	0,293	0,358
17. % Pontos NP / Pontos entregues	12,1	25	1,8	8,2	28,1	23,9	5,9	13

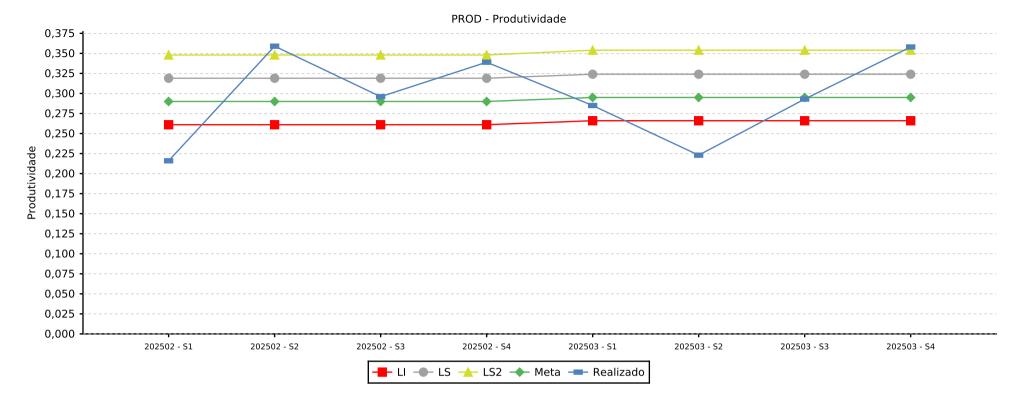


		202	502		202503					
	1	2	3	4	1	2	3	4		
Realizado	0,216	0,359	0,296	0,339	0,285	0,223	0,293	0,358		
Meta	0,290	0,290	0,290	0,290	0,295	0,295	0,295	0,295		
LS2	0,348	0,348	0,348	0,348	0,354	0,354	0,354	0,354		
LS	0,319	0,319	0,319	0,319	0,324	0,324	0,324	0,324		
LI	0,261	0,261	0,261	0,261	0,266	0,266	0,266	0,266		

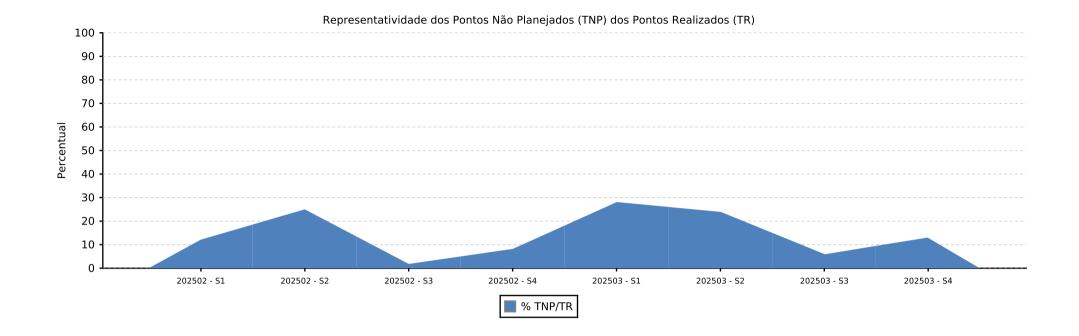


		202	502			202	503	
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	41.5	68	57.5	61	60.5	21	43	54
TNP - Pontos Não Planejados	5	17	1	5	17	5	2.5	7
% TNP/TR	12,1	25,0	1,8	8,2	28,1	23,9	5,9	13,0

NBUG - Nº de Bugs X PBUG - Peso de Bugs

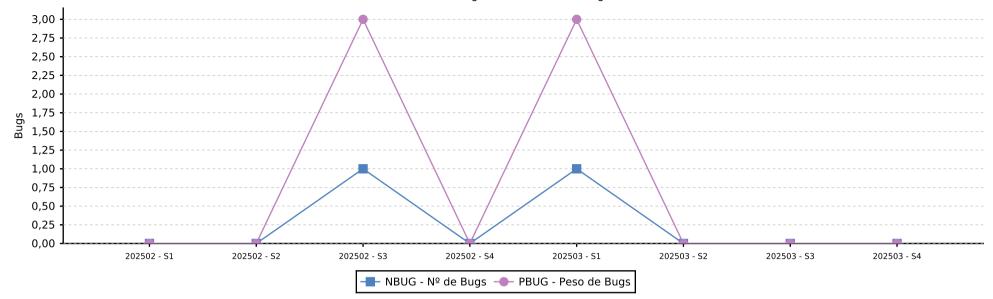

		202	502			202	503	
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	1	0	1	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	3	0	3	0	0	0
Pontos Entregues	41.5	68	57.5	61	60.5	21	43	54
% PBUG / TR	0,00	0,00	5,22	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00

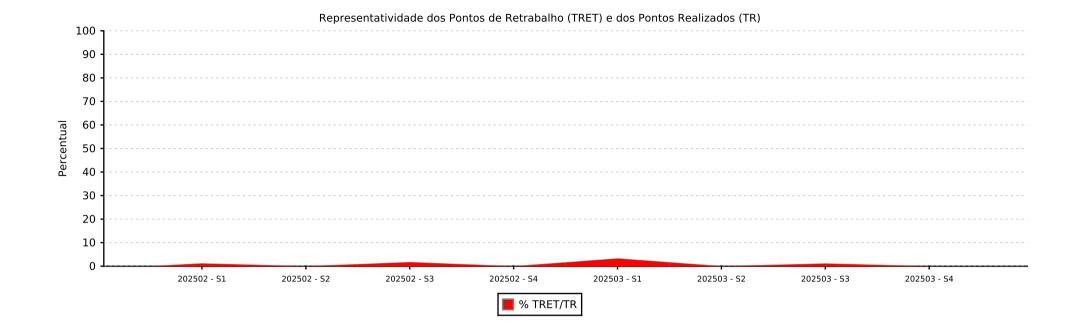


		202	502		202503				
	1	2	3	4	1	2	3	4	
TR - Pontos Realizados	41.5	68	57.5	61	60.5	21	43	54	
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	1	0	2	0	0.5	0	
% TRET/TR	1,2	0,0	1,7	0,0	3,3	0,0	1,2	0,0	

## **HORAS POR ATIVIDADE**

	Spri	int 1	Spr	int 2	Spr	int 3	Spri	nt 4	То	tal	% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Total								
Desenvolvimento	170,17	171,4	92,5	79,1	170,92	127,92	157,92	124,38	591,51	502,8	85,0 %
Code Review	21,5	11,92	17,5	14,48	14	16,7	14	27,82	67	70,92	105,9 %
Analise de Sistema	20	33,52	13	19,12	10	29,98	9,75	20,5	52,75	103,12	195,5 %
Atestado	0	0	0	0	0	4	0	9,92	0	13,92	0,0 %
Sprint Planning 1	8,5	6,67	8,5	2,33	7,5	5,33	7,5	7,42	32	21,75	68,0 %
Ausencia	0	6,03	0	9,88	0	15,97	0	7	0	38,88	0,0 %
Cafe	7,67	7,63	5,17	4,25	6,42	5,93	6,42	5,92	25,68	23,73	92,4 %
Daily Scrum	12,17	13,03	7,5	1,8	9,67	5,98	9,33	5,53	38,67	26,34	68,1 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1	1,92	1	0,73	0,5	0,58	0,5	4,3	3	7,53	251,0 %
Ginastica Laboral	4,83	5,55	3,33	2,97	4	3,55	3,83	3,93	15,99	16	100,1 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	3,67	1,33	3,33	10,83	3,42	4,67	3,42	3,07	13,84	19,9	143,8 %
Sprint Planning 2	3,5	1,75	3,5	1,17	3	1,53	3	3	13	7,45	57,3 %
Atividades Gerenciais	1	1,68	0,5	0	0	2,33	0	2,42	1,5	6,43	428,7 %
Verificando apontamento	3	1,62	2,33	1,23	2,83	1,83	2,83	2,38	10,99	7,06	64,2 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	2,27	0	2,27	0,0 %
Correção de Erros Interno	1,5	3,75	1,5	2,58	1,25	2,25	1,25	2,25	5,5	10,83	196,9 %
Banheiro	1,5	1,68	1,5	1,5	1,5	2,1	1,5	2,2	6	7,48	124,7 %
Compilacao de sistemas	0,5	0	0,5	0	0,5	4,58	0,5	1,92	2	6,5	325,0 %
Analise de O.S	1,67	1,03	1	0,17	1,67	4,3	1,5	1,67	5,84	7,17	122,8 %
Retrospectiva	8,17	5,83	8,17	5,83	7,17	3,33	7,17	1,58	30,68	16,57	54,0 %
Clean Code	2,58	3	2,58	0	2,33	0	2,33	1,5	9,82	4,5	45,8 %
Outros	0,17	4,15	0,17	1,17	0,17	2,17	0,17	1	0,68	8,49	1.248,5
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,25	0,75	1,25	0,75	60,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,58	1,25	0,58	1,08	0,33	1,17	0,33	0,4	1,82	3,9	214,3 %
Geração de Atas	0,25	0	0,25	0	0,25	0,33	0,25	0,33	1	0,66	66,0 %
Geracao de Baseline	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0,25	1	0,25	25,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0,2	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0,17	0,13	0,17	0,35	0,17	0	0,17	0	0,68	0,48	70,6 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %


Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	6	2,92	4	10,42	0	0	0	0	10	13,34	133,4 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	3,5	5,52	3,5	0,32	1	0	1	0	9	5,84	64,9 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0,25	4,02	0,25	7,62	0	0	0	0	0,5	11,64	2.328,0
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0,42	0	0,5	0	1,17	0	0	0	2,09	0,0 %
Reuniao	2	5,67	1	5,32	0	0	0,17	0	3,17	10,99	346,7 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	6,33	0	0	0	0	0	0	0	6,33	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0,25	0	0	0	0	0	0	0	0,25	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	1,17	0	1,17	0	0,92	0	0,92	0	4,18	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	2	0	0,0 %
Total Gera	294,02	310	186	184,75	250,02	251,7	238,01	243,91	968,05	990,36	102,3 %

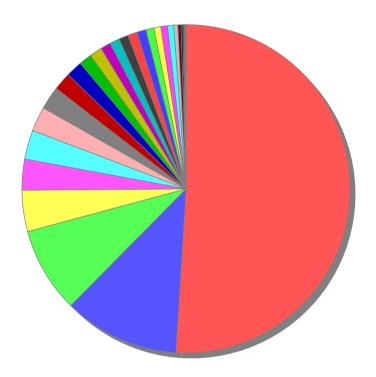

- Desenvolvimento [51%]
- Code Review [11.41%]
- Analise de Sistema [8.41%]
- Atestado [4.07%]
- Sprint Planning 1 [3.04%]
- Ausencia [2.87%]
- Cafe [2.43%]
- Daily Scrum [2.27%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [1.76%]
- Ginastica Laboral [1.61%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.26%]
- Sprint Planning 2 [1.23%]
- Atividades Gerenciais [0.99%]
- Verificando apontamento [0.98%]
- Preparando ambiente [0.93%]
- Correção de Erros Interno [0.92%]
- Banheiro [0.9%]
- Compilacao de sistemas [0.79%]
- Analise de O.S [0.68%]
- Retrospectiva [0.65%]
- Clean Code [0.62%]
- Outros [0.41%]
- Planejamento de Projeto [0.31%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.16%]
- Geração de Atas [0.14%]
- Geracao de Baseline [0.1%]
- Teste [0.08%]

# HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Spri	nt 1	Spri	nt 2	Spri	int 3	Spri	nt 4	Total		% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Total								
RD - Desenvolvimento de Requisitos	3	180,67	182,65	102,67	94,33	179,67	136,58	166,67	136,1	629,68	549,66	87,3 %
PMC - Monitoramento e Controle de	Projeto	41,83	30,78	33,17	22,12	30,83	26,02	30,5	34,93	136,33	113,85	83,5 %
REQM - Gestao de Requisitos		38	45,27	29	33,53	20,5	38,02	20,25	33,18	107,75	150	139,2 %
DIV - Diversos*		17,17	30,72	11,67	23,58	11,08	29,95	11,08	20,27	51	104,52	204,9 %
CM - Gerencia de Configuração		1	0	0,5	0	0,5	4,58	1	2,17	3	6,75	225,0 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	1,25	0,75	1,25	0,75	60,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto		3,5	5,52	3,5	0,32	1	0	1	0	9	5,84	64,9 %
PPQA - Garantia da Qualidade de P	rocesso e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	287,17	294,94	180,51	173,88	243,58	235,15	231,75	227,4	943,01	931,37	98,8 %

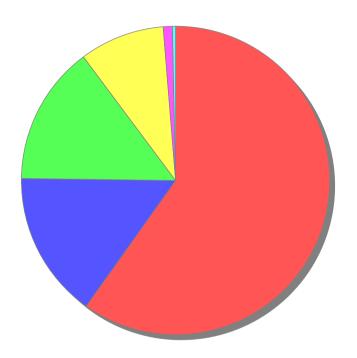


- Desenvolvimento de Requisitos [59.85%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [15.36%]
- Gestao de Requisitos [14.59%]
- Oiversos\* [8.91%]
- Gerencia de Configuracao [0.95%]
- O Planejamento de Projeto [0.33%]

## **INDICADORES DO PROJETO**


	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503
01. Horas planejadas de todas atividades	1739h44m	1619h00m	1712h00m	1488h00m	922h00m	854h00m	1176h00m	968h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1710h24m	1596h58m	1735h03m	1467h27m	968h44m	924h35m	1227h32m	990h22m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	1381h29m	1285h05m	1376h10m	1175h59m	669h35m	627h10m	887h30m	740h15m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	1265h23m	1201h02m	1285h16m	1019h42m	630h15m	596h30m	757h47m	605h07m
05. Pontos planejados para o projeto	462,0	360,0	385,0	330,0	194,0	180,0	256,0	218,0
06. Pontos planejados	462,0	414,5	463,5	410,5	199,0	242,0	314,0	276,5
07. Pontos entregues	375,5	370	413,5	319,5	183	173,5	228	178,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	313,50	280,50	331,00	289,50	150,00	134,00	200,00	147,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	62,00	89,50	82,50	30,00	33,00	39,50	28,00	31,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	10	6	4	4	6	6	3	3
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	81	80	100	87	52	49	53	47
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	47	75	48	36	23	23	22	21
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	4	2	2	2	2	2	1	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	1h55m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	3,5	1,5	3	11	2,5	4,5	1,5	2,5
16. Produtividade planejada	0,335	0,323	0,337	0,350	0,298	0,386	0,354	0,374
17. Produtividade realizada	0,297	0,309	0,322	0,314	0,291	0,291	0,301	0,295
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	81,3	102,8	107,5	96,9	94,4	96,4	89,1	81,9
19. % Pontos NP / Pontos entregues	16,6	24,2	20	9,4	18,1	22,8	12,3	17,7

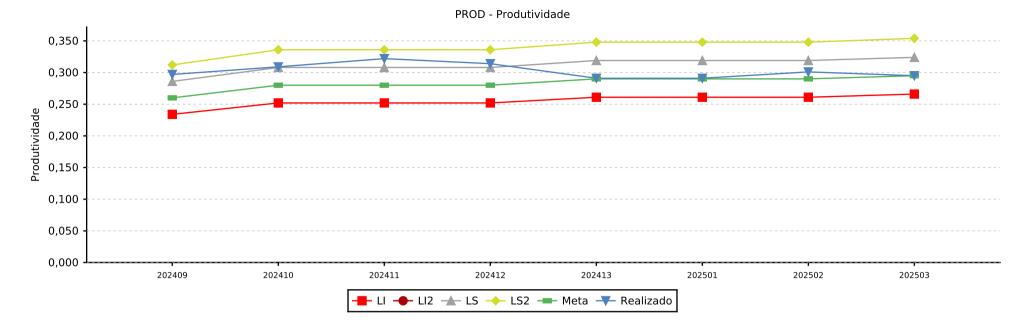


	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503
Realizado	0,297	0,309	0,322	0,314	0,291	0,291	0,301	0,295
Meta	0,260	0,280	0,280	0,280	0,290	0,290	0,290	0,295
LS2	0,312	0,336	0,336	0,336	0,348	0,348	0,348	0,354
LS	0,286	0,308	0,308	0,308	0,319	0,319	0,319	0,324
LI2								
LI	0,234	0,252	0,252	0,252	0,261	0,261	0,261	0,266

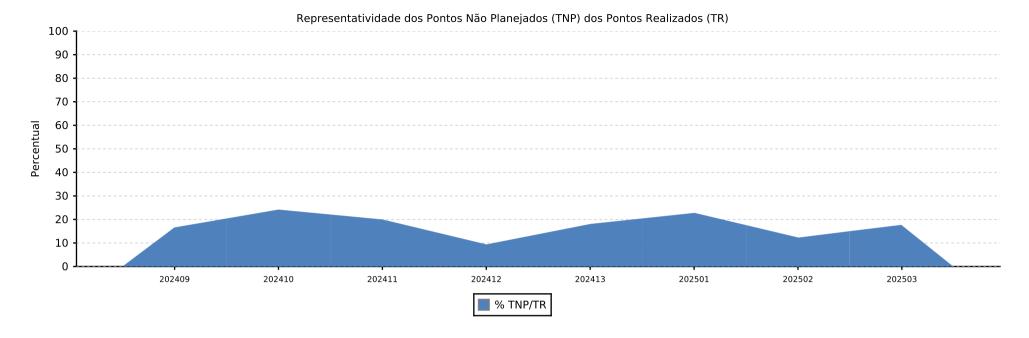


	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503
TR - Pontos Realizados	375.5	370	413.5	319.5	183	173.5	228	178.5
TNP - Pontos Não Planejados	62	89.5	82.5	30	33	39.5	28	31.5
% TNP/TR	16,6	24,2	20,0	9,4	18,1	22,8	12,3	17,7

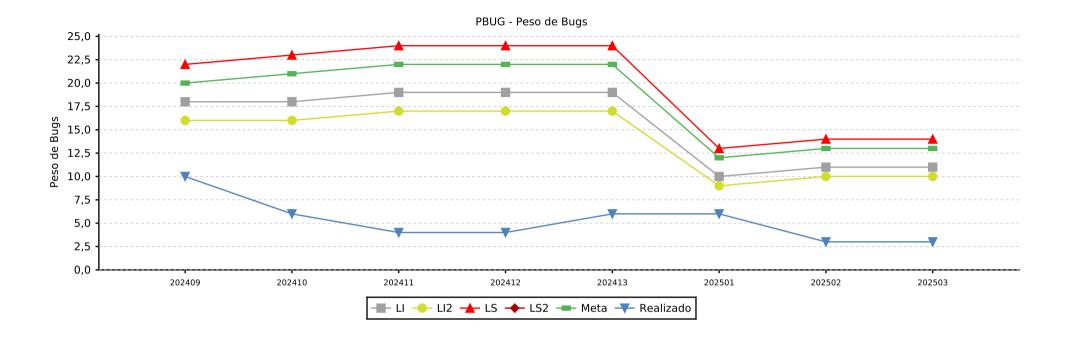


	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503
Realizado	10	6	4	4	6	6	3	3
Meta	20	21	22	22	22	12	13	13
LS2								
LS	22	23	24	24	24	13	14	14
LI2	16	16	17	17	17	9	10	10
LI	18	18	19	19	19	10	11	11
Pontos Entregues	375.5	370	413.5	319.5	183	173.5	228	178.5
% PBUG / TR	2,67	1,63	0,97	1,26	3,28	3,46	1,32	1,69

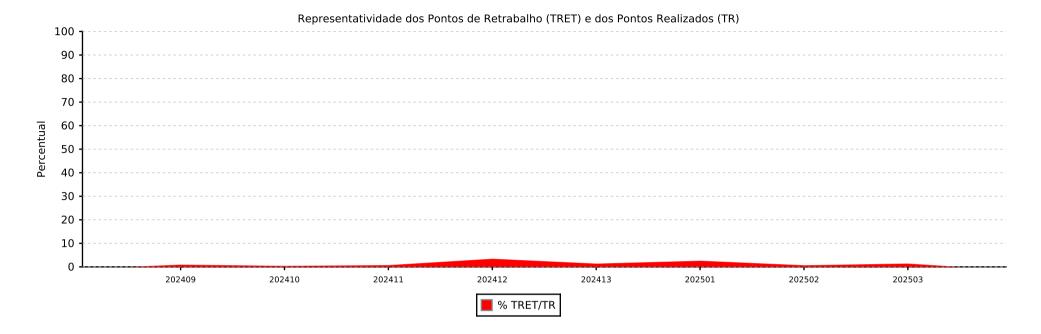

	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503
TR - Pontos Realizados	375.5	370	413.5	319.5	183	173.5	228	178.5
TRET - Pontos de Retrabalho	3.5	1.5	3	11	2.5	4.5	1.5	2.5
% TRET/TR	0,9	0,4	0,7	3,4	1,4	2,6	0,7	1,4

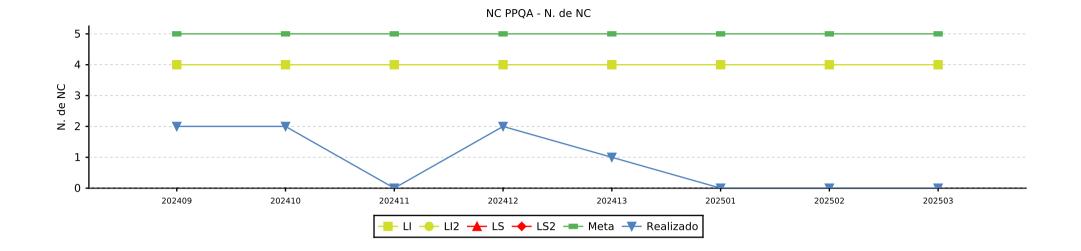

	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503
Realizado	2	2	0	2	1	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

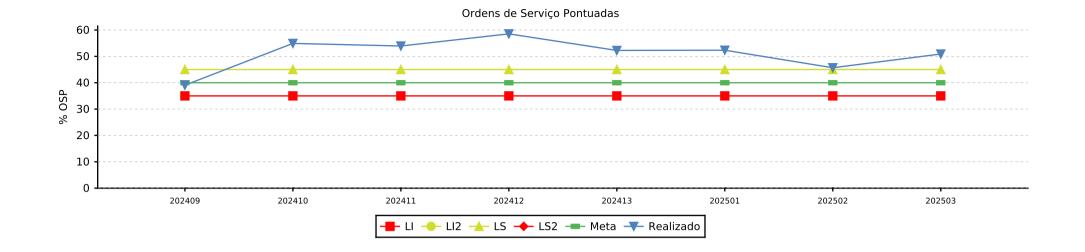


	202409	202410	202411	202412	202413	202501	202502	202503
Realizado	39.06	54.92	53.93	58.54	52.25	52.34	45.68	50.89
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

#### % de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [50.77%]
- Analise de Sistema [10.41%]
- Code Review [7.16%]
- Ausencia [3.93%]
- Daily Scrum [2.66%]
- Ocafe [2.4%]
- Sprint Planning 1 [2.2%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [2.01%]Teste [0.02%]
- Retrospectiva [1.67%]
- Ginastica Laboral [1.62%]
- Atestado [1.41%]
- Sizing [1.35%]
- Treinamento [1.17%]
- Reuniao [1.11%]
- Correção de Erros Interno [1.09%]
- Outros [0.86%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.76%]
- Banheiro [0.76%]
- Sprint Planning 2 [0.75%]
- Analise de O.S [0.72%]
- Verificando apontamento [0.71%]
- Compilação de sistemas [0.66%]
- Atividades Gerenciais [0.65%]
- Instrutor Treinamento [0.64%]
- Atualizacao de Versao [0.59%]
- Clean Code [0.45%]
- Particular [0.4%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.39%]

- Preparando ambiente [0.23%]
- Analise Retorno O.S. [0.21%]
- Planejamento de Projeto [0.08%]
- O Geração de Atas [0.07%]
- Verificar o.s no nome [0.05%]
- Auxilio Review [0.03%]
- Geracao de Baseline [0.03%]

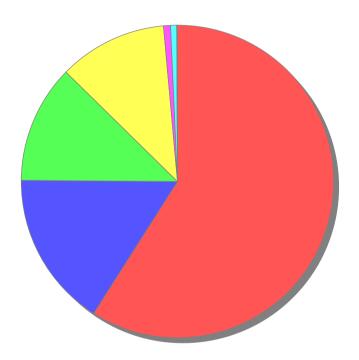

- Desenvolvimento de Requisitos [55.5%]
- Gestao de Requisitos [15.15%]
- Monitoramento e Controle de Projeto [11.5%]
- Diversos\* [10.55%]
- Gerencia de Configuracao [0.68%]
- Integracao de Produto [0.59%]
- Planejamento de Projeto [0.08%]
