



INDICADORES DA SPRINT


	202604				202605			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	176h00m	144h00m	176h00m	220h00m	180h00m	180h00m	264h00m	216h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	183h02m	144h15m	178h54m	239h52m	195h20m	205h30m	271h33m	285h30m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	138h00m	113h17m	120h10m	156h10m	123h25m	123h25m	182h30m	135h50m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	115h33m	82h08m	98h54m	135h16m	107h48m	114h34m	177h11m	169h32m
05. Pontos planejados	34,5	36,5	22,0	18,0	43,5	55,5	62,5	60,0
06. Pontos entregues	35	40	23	37,5	33	32,5	55	56,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	24,50	28,50	16,00	16,00	22,50	23,50	41,50	27,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	10,50	11,50	7,00	21,50	10,50	9,00	13,50	29,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	2	0	0	0	0	0	0	3
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	14	11	11	6	10	5	9	10
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	8	14	8	13	13	12	11	18
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	0	0	0	0	0	1
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0,5	0	0	0	0	0	1	2,5
15. Produtividade planejada	0,250	0,323	0,184	0,116	0,353	0,450	0,343	0,442
16. Produtividade realizada	0,303	0,488	0,233	0,278	0,307	0,284	0,311	0,334
17. % Pontos NP / Pontos entregues	30	28,8	30,5	57,4	31,9	27,7	24,6	52,3

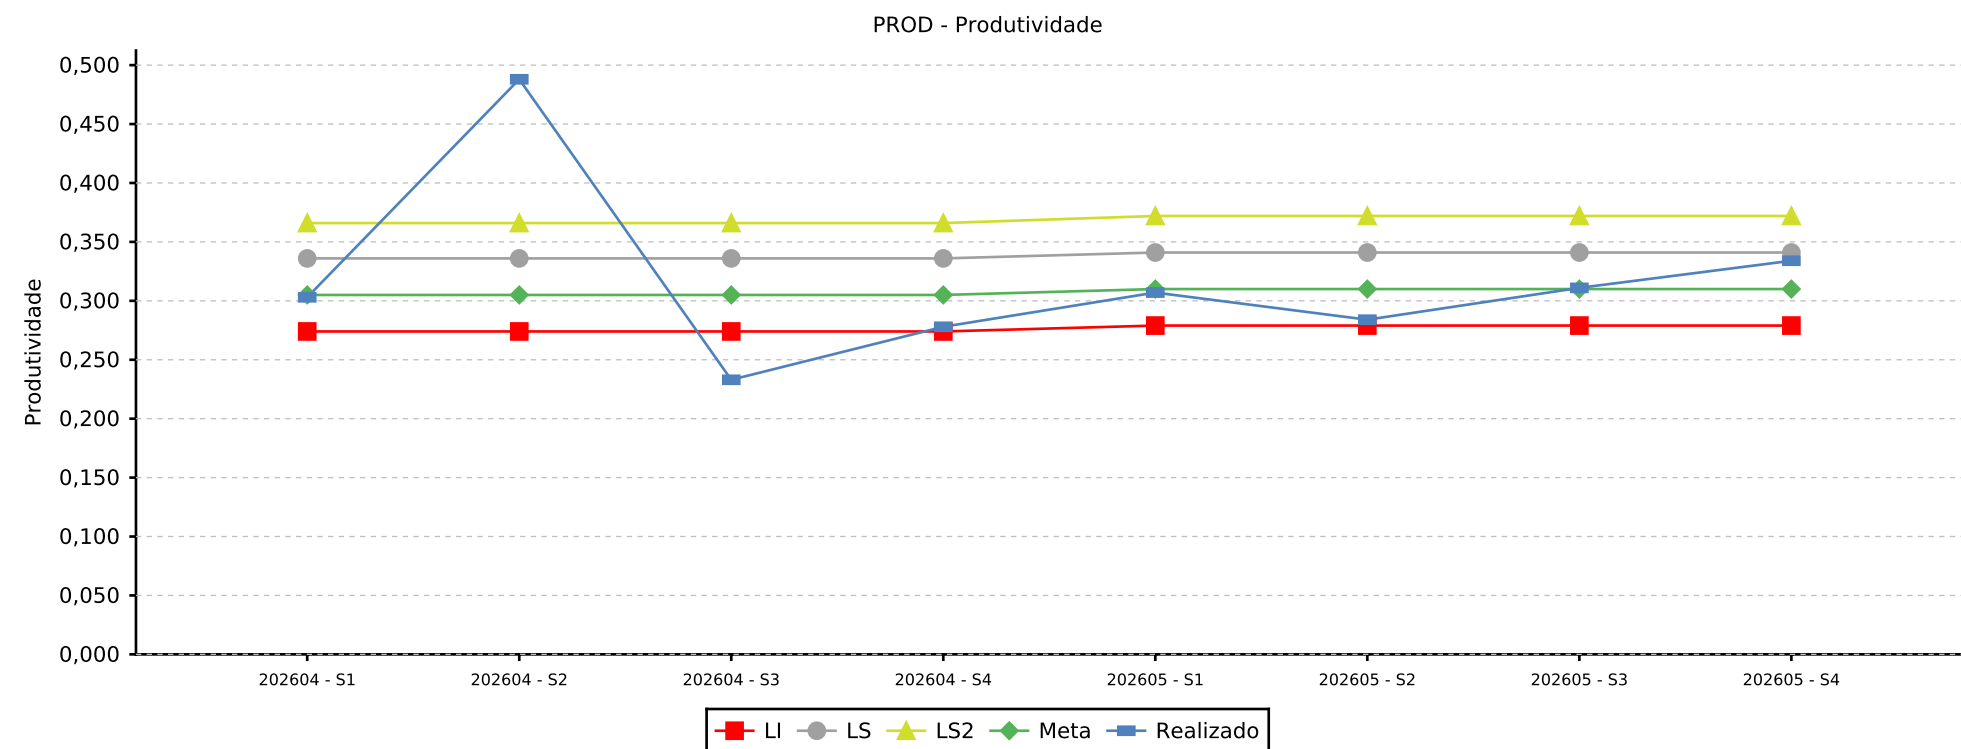

	202604				202605			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,303	0,488	0,233	0,278	0,307	0,284	0,311	0,334
Meta	0,305	0,305	0,305	0,305	0,310	0,310	0,310	0,310
LS2	0,366	0,366	0,366	0,366	0,372	0,372	0,372	0,372
LS	0,336	0,336	0,336	0,336	0,341	0,341	0,341	0,341
LI	0,274	0,274	0,274	0,274	0,279	0,279	0,279	0,279

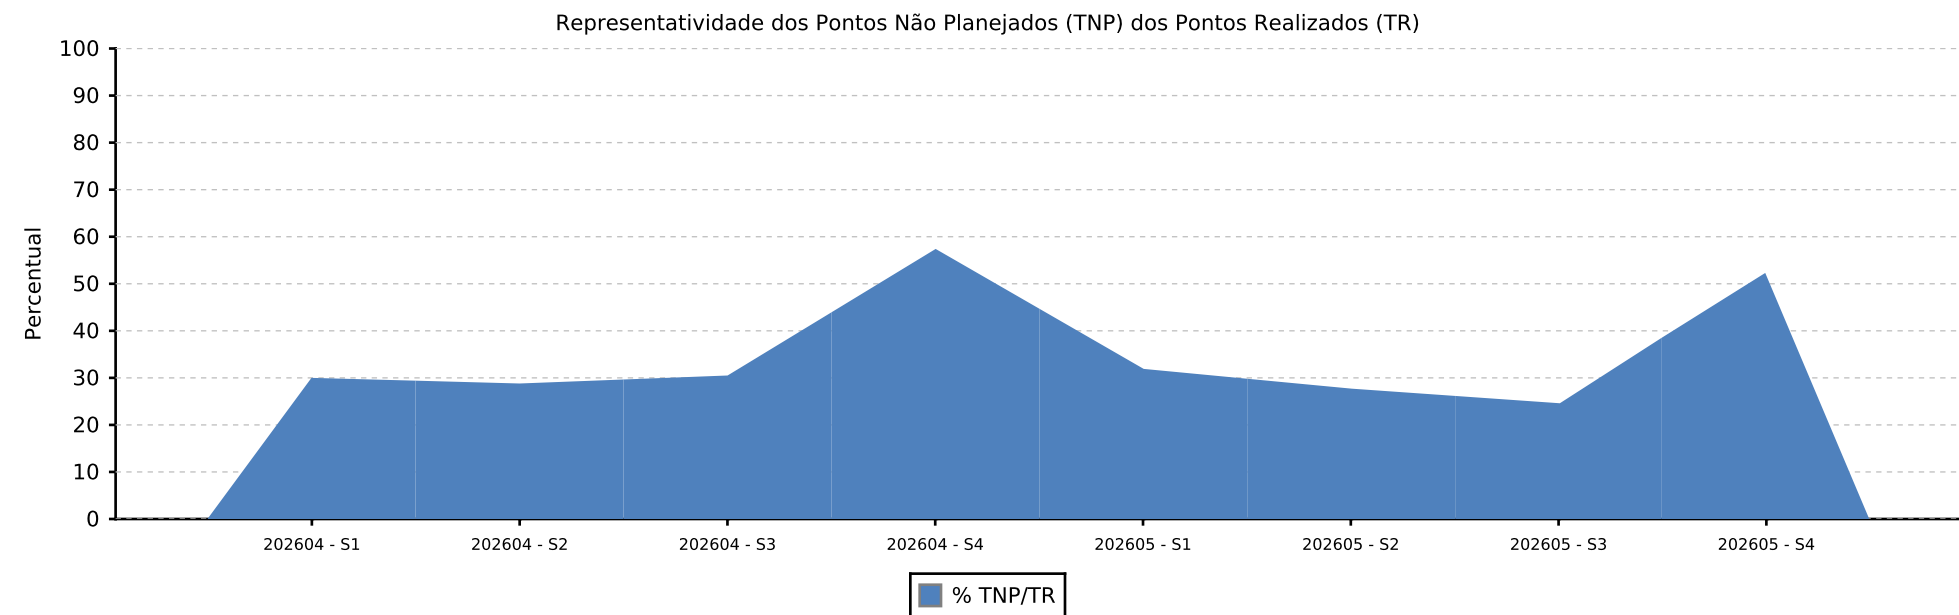

	202604				202605			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	35	40	23	37.5	33	32.5	55	56.5
TNP - Pontos Não Planejados	10.5	11.5	7	21.5	10.5	9	13.5	29.5
% TNP/TR	30,0	28,8	30,5	57,4	31,9	27,7	24,6	52,3

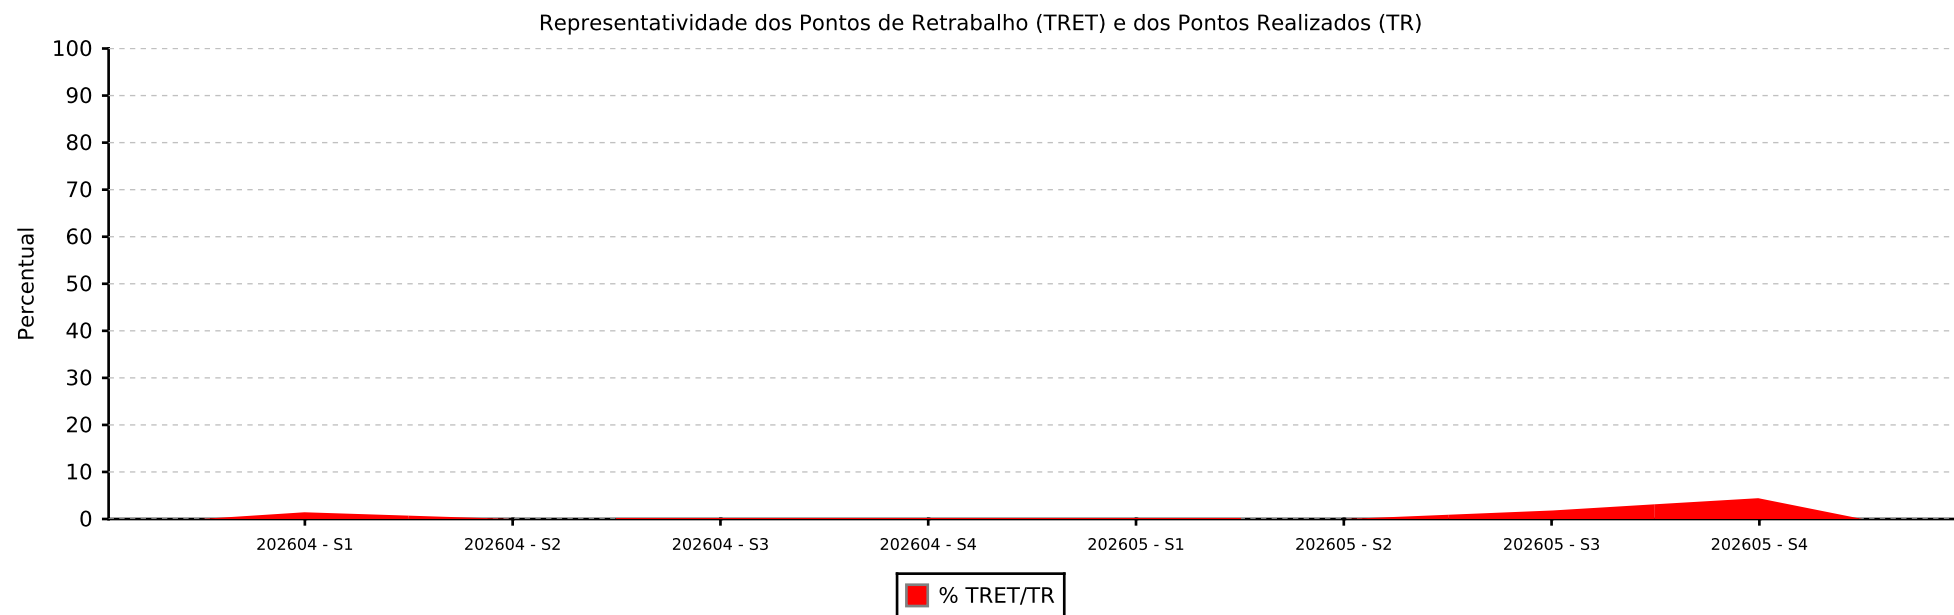



	202604				202605			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	35	40	23	37.5	33	32.5	55	56.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	0	0	0	0	0	1	2.5
% TRET/TR	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	4,4

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0	0	4,97	0,33	0	0,33	0	0,66	4,97	753,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0	0	0	0	0,25	0	0,25	0	0,5	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0,67	0	0,67	0	0,67	0	0,67	0	2,68	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0,5	0	2,75	0	0	0	3,25	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	0	0	0	0,83	0,25	0	0,25	0	0,5	0,83	166,0 %
Clean Code	3,8	1	3,8	0	5	5,43	4,8	0	17,4	6,43	37,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0,67	0	0	0	0	0	0,67	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0,67	0	0	0	0	0	0,67	0,0 %
Total Geral	180,01	195,34	180,01	205,5	264	271,53	215,99	285,5	840,01	957,87	114,0 %


% de Horas por Atividade

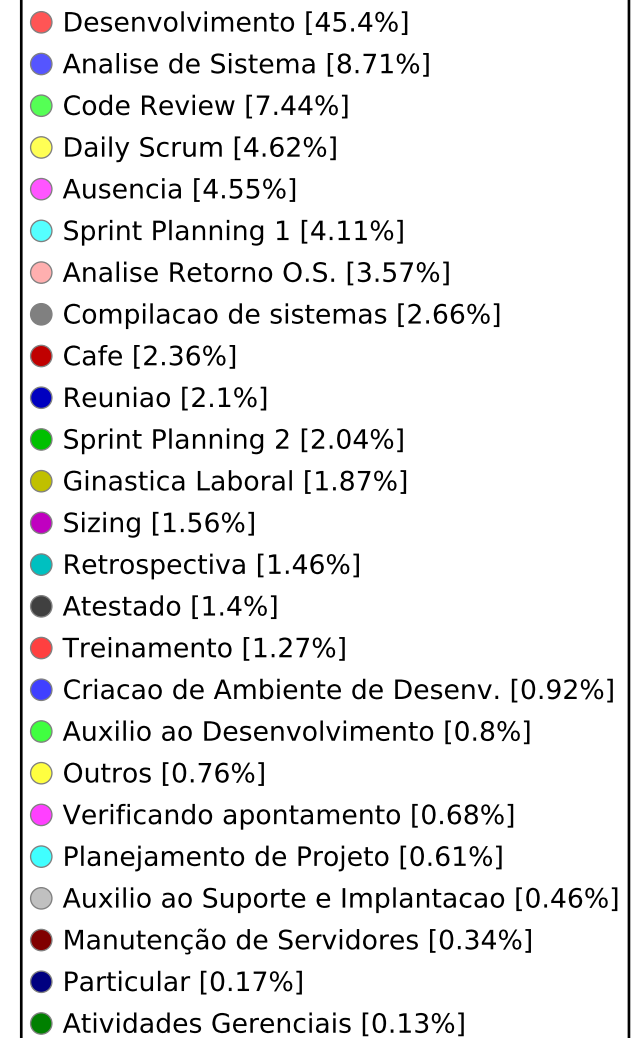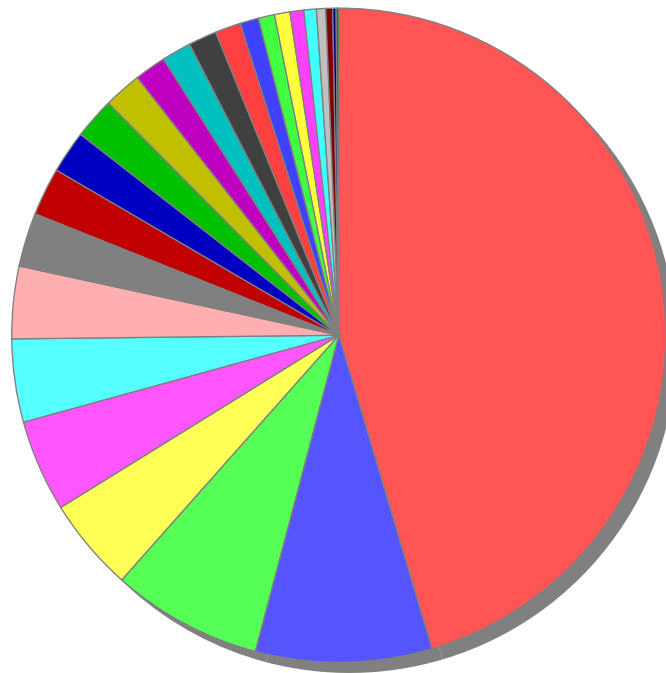

HORAS POR ÁREA DO CMMI


Area CMMI	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	
RD - Desenvolvimento de Requisitos	107,43	87,45	107,43	104,87	162,92	157,48	116,68	134,53	494,46	484,33	98,0 %
REQM - Gestao de Requisitos	24,23	41,57	24,23	33,78	33,33	35,62	28,73	57,07	110,52	168,04	152,0 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	26	28,87	26	25,42	39,67	39,82	34,5	38,6	126,17	132,71	105,2 %
DIV - Diversos*	16,67	24,85	16,67	29,55	20,42	33,6	18,75	34,93	72,51	122,93	169,5 %
CM - Gerencia de Configuracao	4	8,28	4	4,48	5	3,33	5	7,6	18	23,69	131,6 %
PP - Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	2	1,75	2	1,75	87,5 %
OT - Treinamento na Organizacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	178,33	191,02	178,33	198,1	261,34	269,85	205,66	274,48	823,66	933,45	113,3 %

% de Horas por Área do CMMI

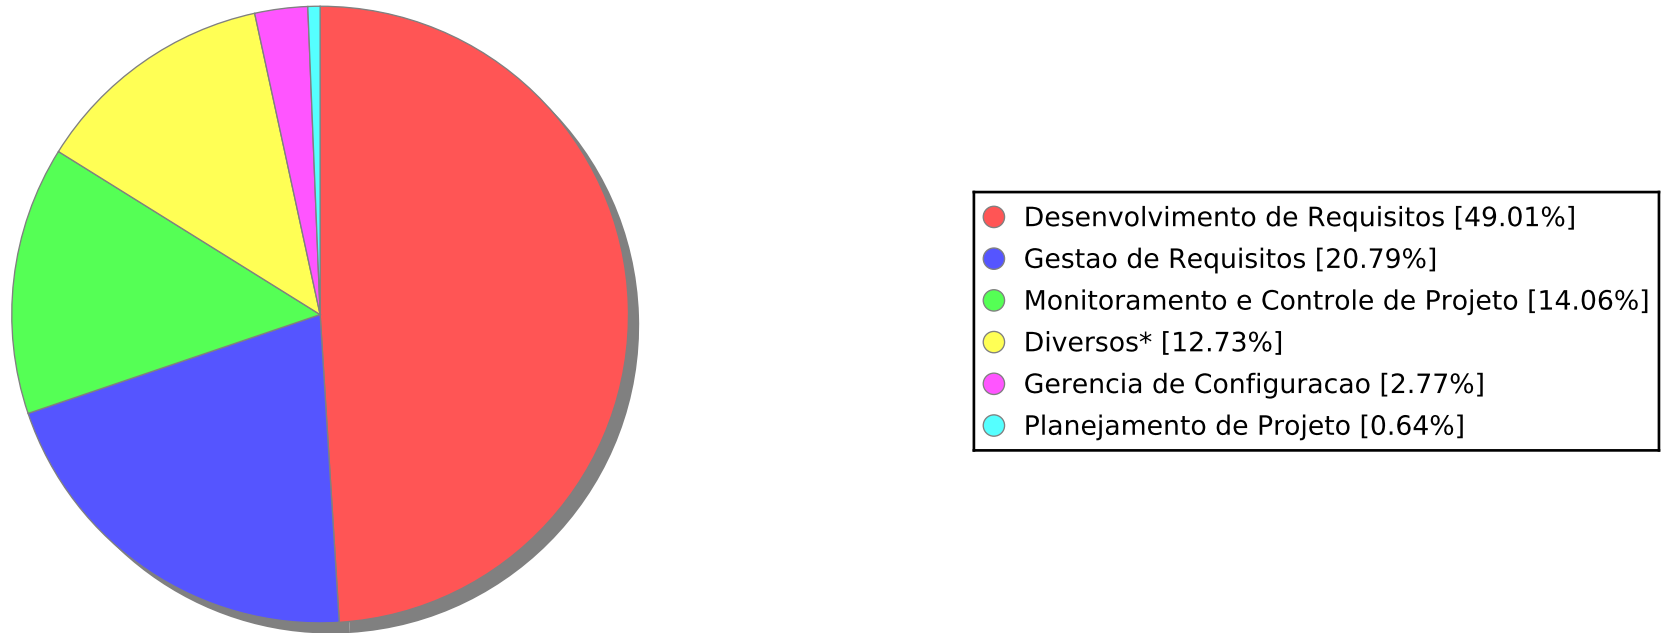


INDICADORES DO PROJETO


	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605
01. Horas planejadas de todas atividades	880h00m	712h00m	531h00m	624h00m	760h00m	880h00m	716h00m	840h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	945h46m	774h53m	588h21m	642h30m	772h50m	937h16m	746h03m	957h53m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	610h47m	477h55m	362h10m	467h15m	562h08m	645h10m	527h37m	565h10m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	544h09m	397h01m	349h29m	379h56m	503h09m	563h33m	431h51m	569h05m
05. Pontos planejados para o projeto	186,0	145,0	110,0	4,0	171,0	4,0	160,8	4,0
06. Pontos planejados	235,5	161,0	108,5	154,5	228,5	293,0	111,0	221,5
07. Pontos entregues	171,5	123,5	111,5	121,5	155	182	135,5	177
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	154,50	109,00	91,50	86,50	137,50	136,00	85,00	114,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	17,00	14,50	20,00	35,00	17,50	46,00	50,50	62,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	3	0	2	0	0	0	2	3
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	38	31	20	32	49	25	42	34
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	20	10	22	13	22	46	43	54
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	0	1	0	0	0	1	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	1	0	1	0	0	0	0,5	3,5
16. Produtividade planejada	0,386	0,337	0,300	0,331	0,407	0,455	0,211	0,392
17. Produtividade realizada	0,316	0,312	0,320	0,320	0,309	0,323	0,314	0,312
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	92,3	85,2	101,4	3037,5	90,7	4550	84,3	4425
19. % Pontos NP / Pontos entregues	10	11,8	18	28,9	11,3	25,3	37,3	35,4

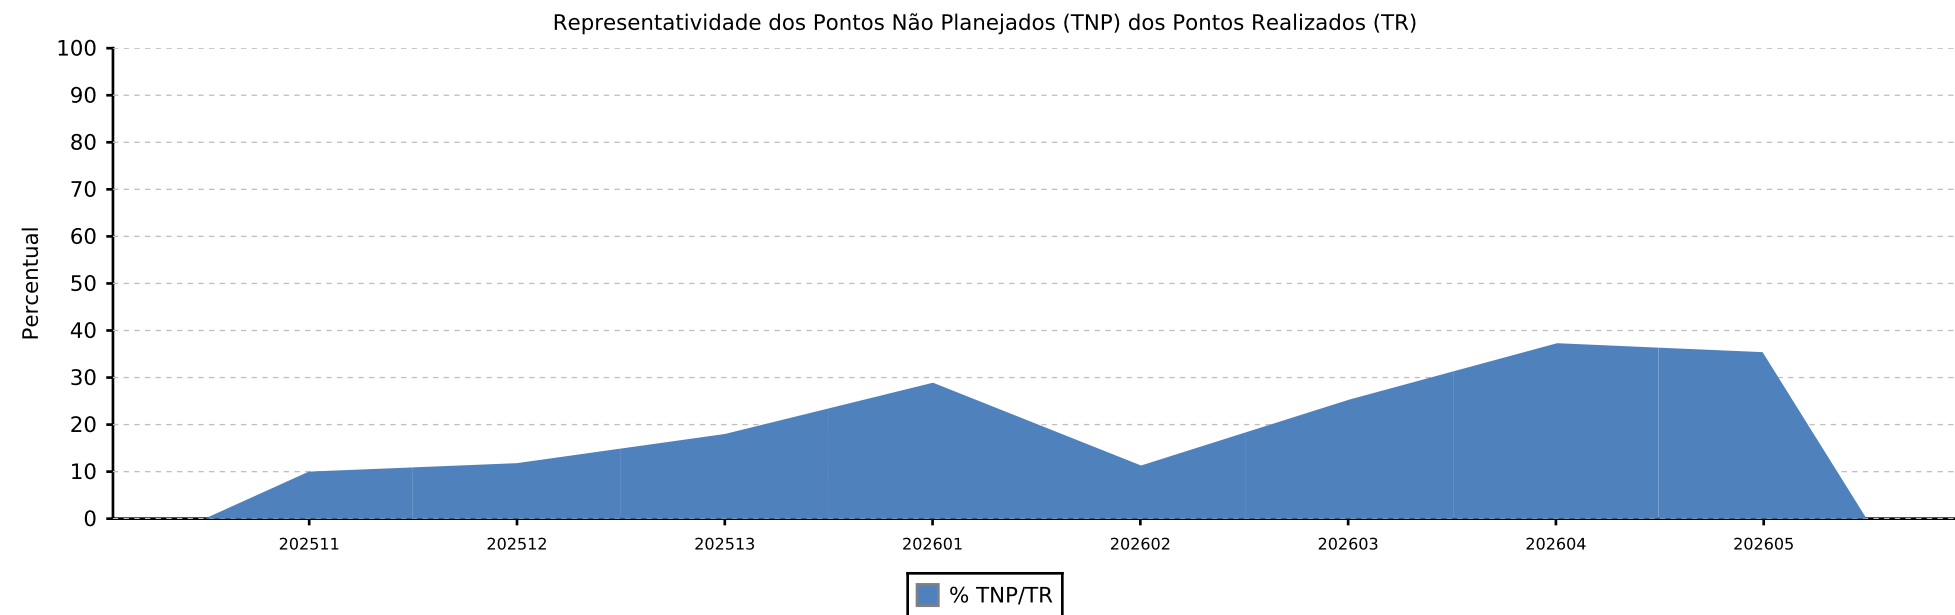


	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605
TR - Pontos Realizados	171.5	123.5	111.5	121.5	155	182	135.5	177
TNP - Pontos Não Planejados	17	14.5	20	35	17.5	46	50.5	62.5
% TNP/TR	10,0	11,8	18,0	28,9	11,3	25,3	37,3	35,4

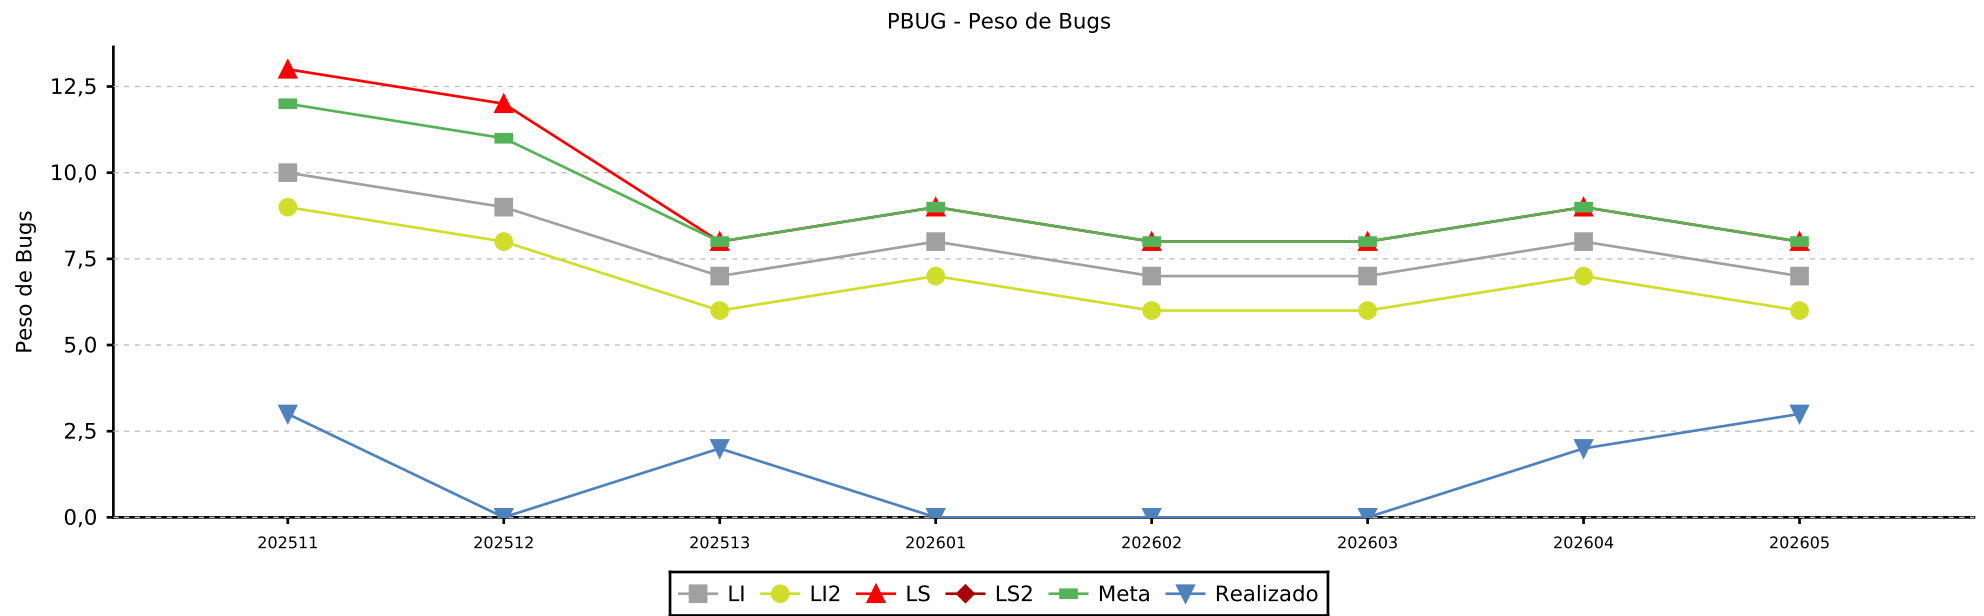


	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605
Realizado	3	0	2	0	0	0	2	3
Meta	12	11	8	9	8	8	9	8
LS2								
LS	13	12	8	9	8	8	9	8
LI2	9	8	6	7	6	6	7	6
LI	10	9	7	8	7	7	8	7
Pontos Entregues	171.5	123.5	111.5	121.5	155	182	135.5	177
% PBUG / TR	1,75	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,48	1,70

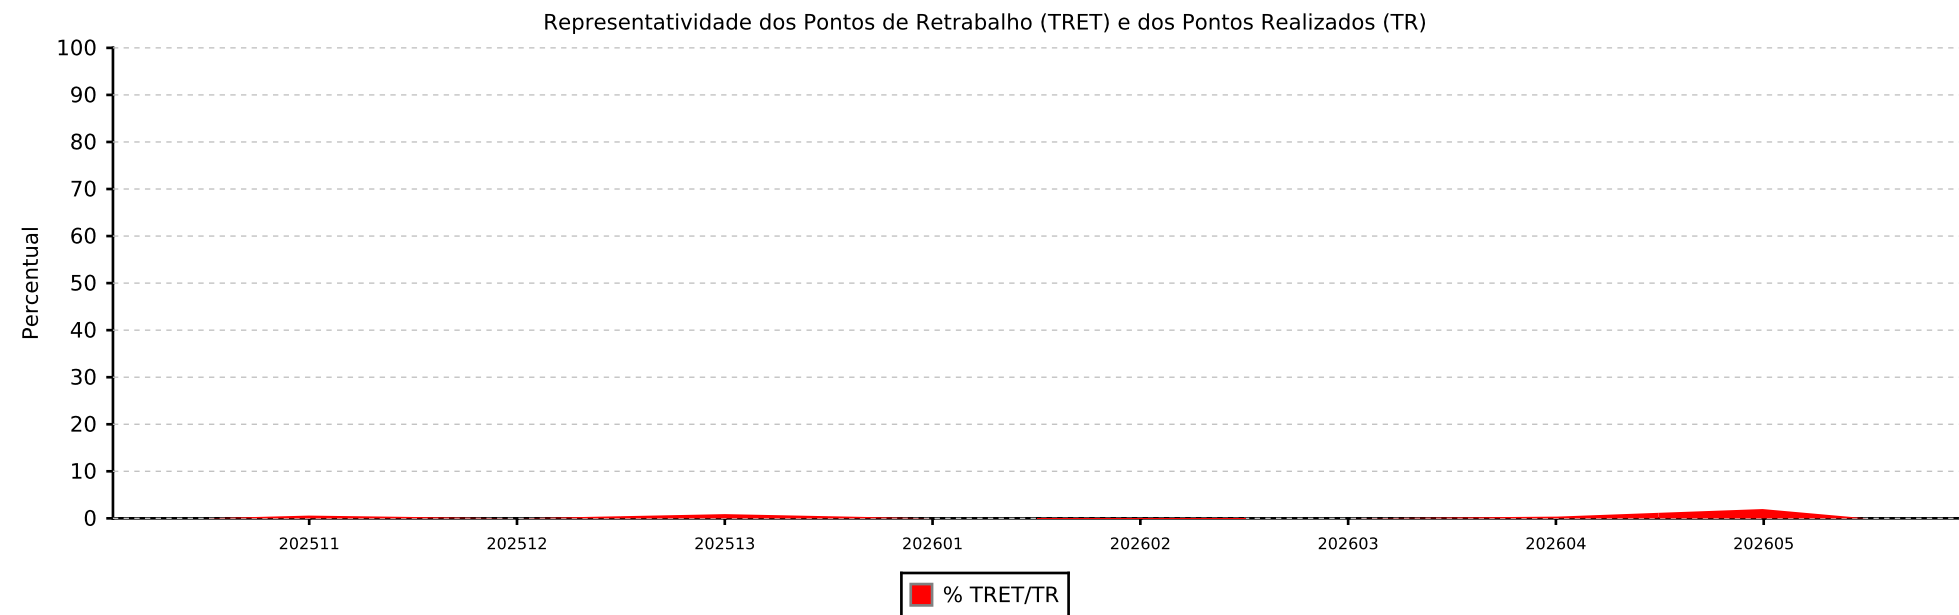


	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605
TR - Pontos Realizados	171.5	123.5	111.5	121.5	155	182	135.5	177
TRET - Pontos de Retrabalho	1	0	1	0	0	0	0.5	3.5
% TRET/TR	0,6	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0

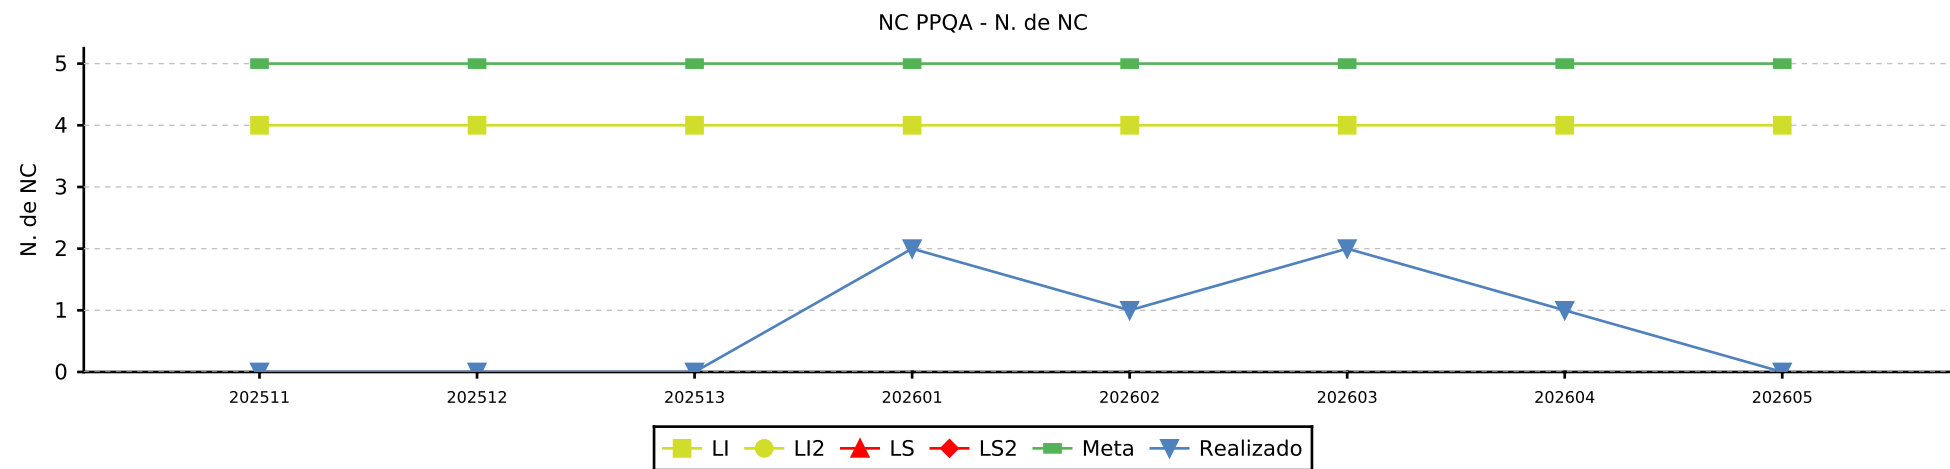

	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605
Realizado	0	0	0	2	1	2	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

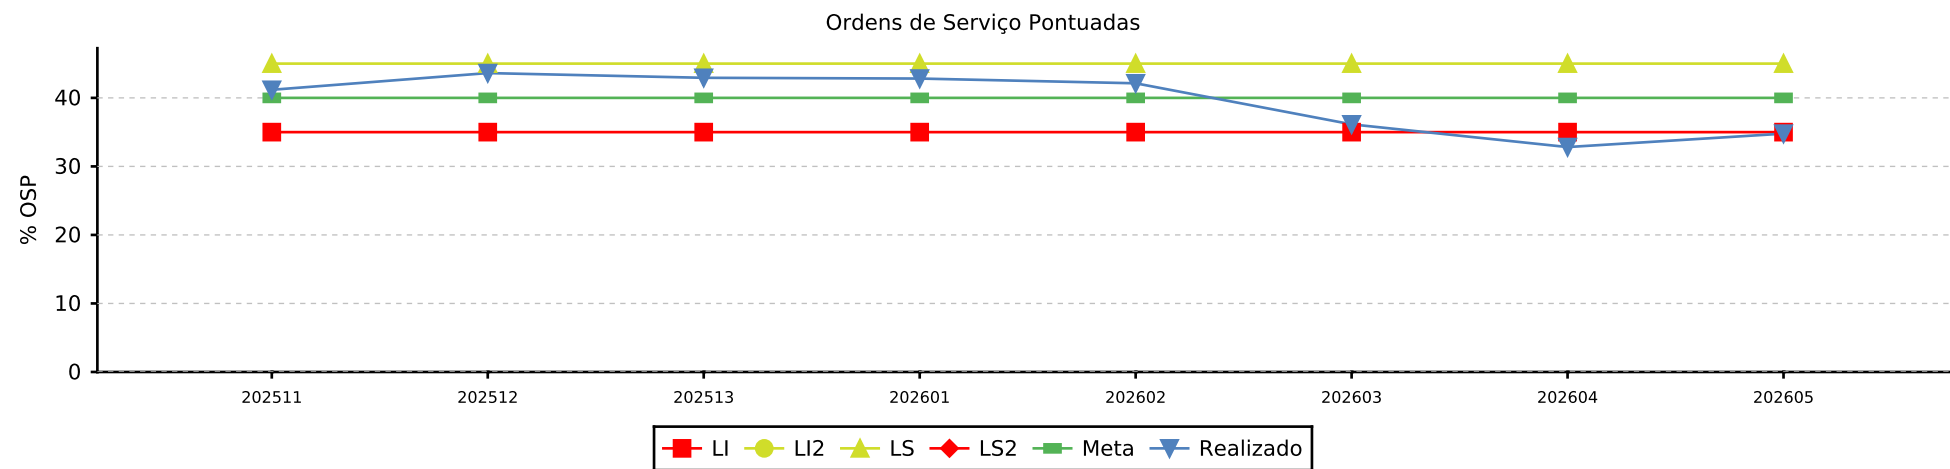

	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604	202605
Realizado	41.18	43.62	42.93	42.82	42.13	36.14	32.82	34.78
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

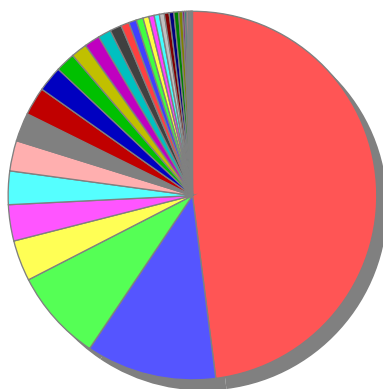

% de Horas por Atividade

● Desenvolvimento [47.98%]	● Teste [0.15%]
● Analise de Sistema [11.44%]	● Atividades Gerenciais [0.13%]
● Code Review [8.03%]	● Correção de Erros Interno [0.09%]
● Daily Scrum [3.59%]	● Organização sala / equipamento [0.07%]
● Reuniao [3.17%]	● Levantamento de Requisito [0.07%]
● Ausencia [2.93%]	
● Sprint Planning 1 [2.67%]	
● Cafe [2.5%]	
● Compilacao de sistemas [2.47%]	
● Retrospectiva [2.24%]	
● Ginastica Laboral [1.72%]	
● Analise Retorno O.S. [1.41%]	
● Auxilio ao Suporte e Implantacao [1.36%]	
● Sprint Planning 2 [1.15%]	
● Outros [1.02%]	
● Criacao de Ambiente de Desenv. [0.72%]	
● Clean Code [0.67%]	
● Verificando apontamento [0.61%]	
● Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.52%]	
● Sizing [0.46%]	
● Treinamento [0.46%]	
● Auxilio ao Desenvolvimento [0.44%]	
● Atestado [0.42%]	
● Manutenção de Servidores [0.41%]	
● Analise de O.S [0.41%]	
● Preparando ambiente [0.34%]	
● Planejamento de Projeto [0.18%]	
● Particular [0.16%]	

% de Horas por Área do CMMI

