



INDICADORES DA SPRINT


	202609				202610			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	240h00m	264h00m	220h00m	224h00m	180h00m	220h00m	220h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	234h46m	231h22m	188h46m	185h44m	191h12m	241h54m	238h31m	249h28m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	154h45m	182h29m	152h05m	153h06m	110h50m	138h14m	144h28m	144h21m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	147h40m	116h24m	106h17m	113h22m	96h48m	146h05m	132h47m	137h13m
05. Pontos planejados	51,0	72,0	30,0	50,5	41,0	41,5	41,5	62,0
06. Pontos entregues	24,5	62	27	42	33	43,5	29	58
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	13,00	60,00	19,00	36,50	21,00	18,50	26,50	53,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	11,50	2,00	8,00	5,50	12,00	25,00	2,50	5,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	4	0	0	0	4	2
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	7	12	10	10	10	8	8	15
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	14	4	6	5	12	15	4	1
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	2	0	0	0	2	1
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	2	0	0	0	0,5	1
15. Produtividade planejada	0,330	0,395	0,198	0,330	0,370	0,301	0,288	0,430
16. Produtividade realizada	0,166	0,533	0,255	0,371	0,341	0,298	0,219	0,423
17. % Pontos NP / Pontos entregues	47	3,3	29,7	13,1	36,4	57,5	8,7	8,7

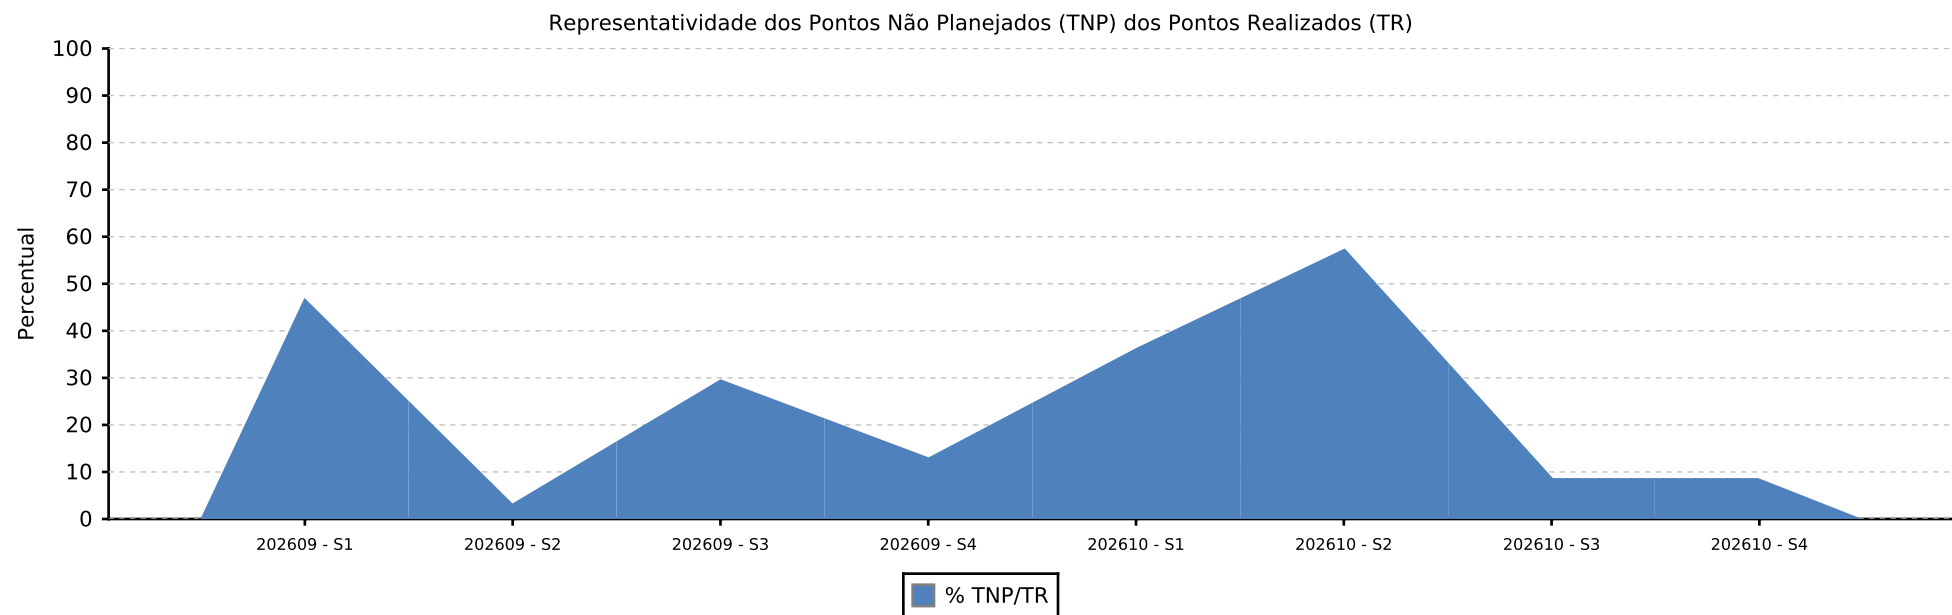

	202609				202610			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	24.5	62	27	42	33	43.5	29	58
TNP - Pontos Não Planejados	11.5	2	8	5.5	12	25	2.5	5
% TNP/TR	47,0	3,3	29,7	13,1	36,4	57,5	8,7	8,7

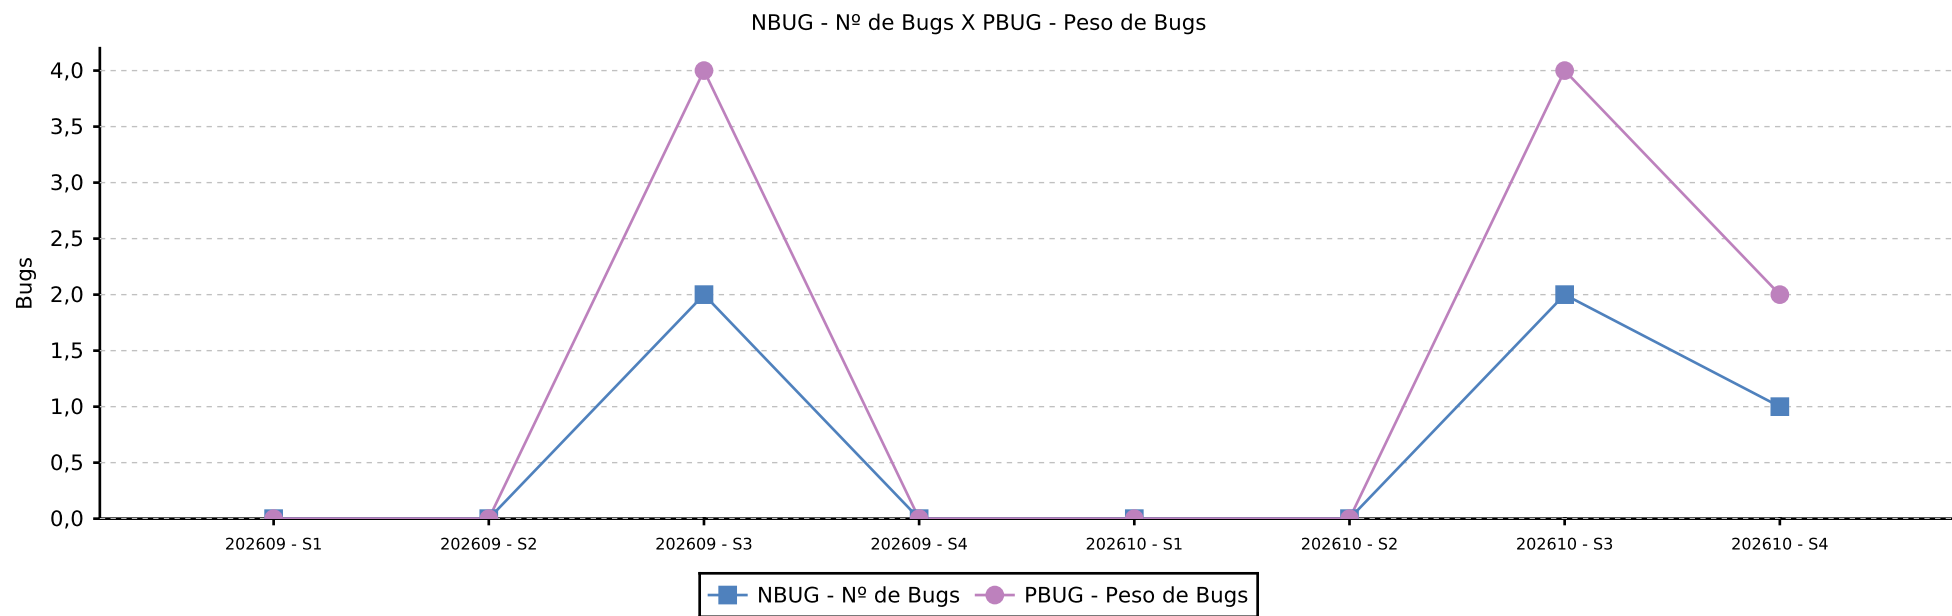

	202609				202610			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	2	0	0	0	2	1
PBUG - Peso de Bugs	0	0	4	0	0	0	4	2
Pontos Entregues	24.5	62	27	42	33	43.5	29	58
% PBUG / TR	0,00	0,00	14,82	0,00	0,00	0,00	13,80	3,45

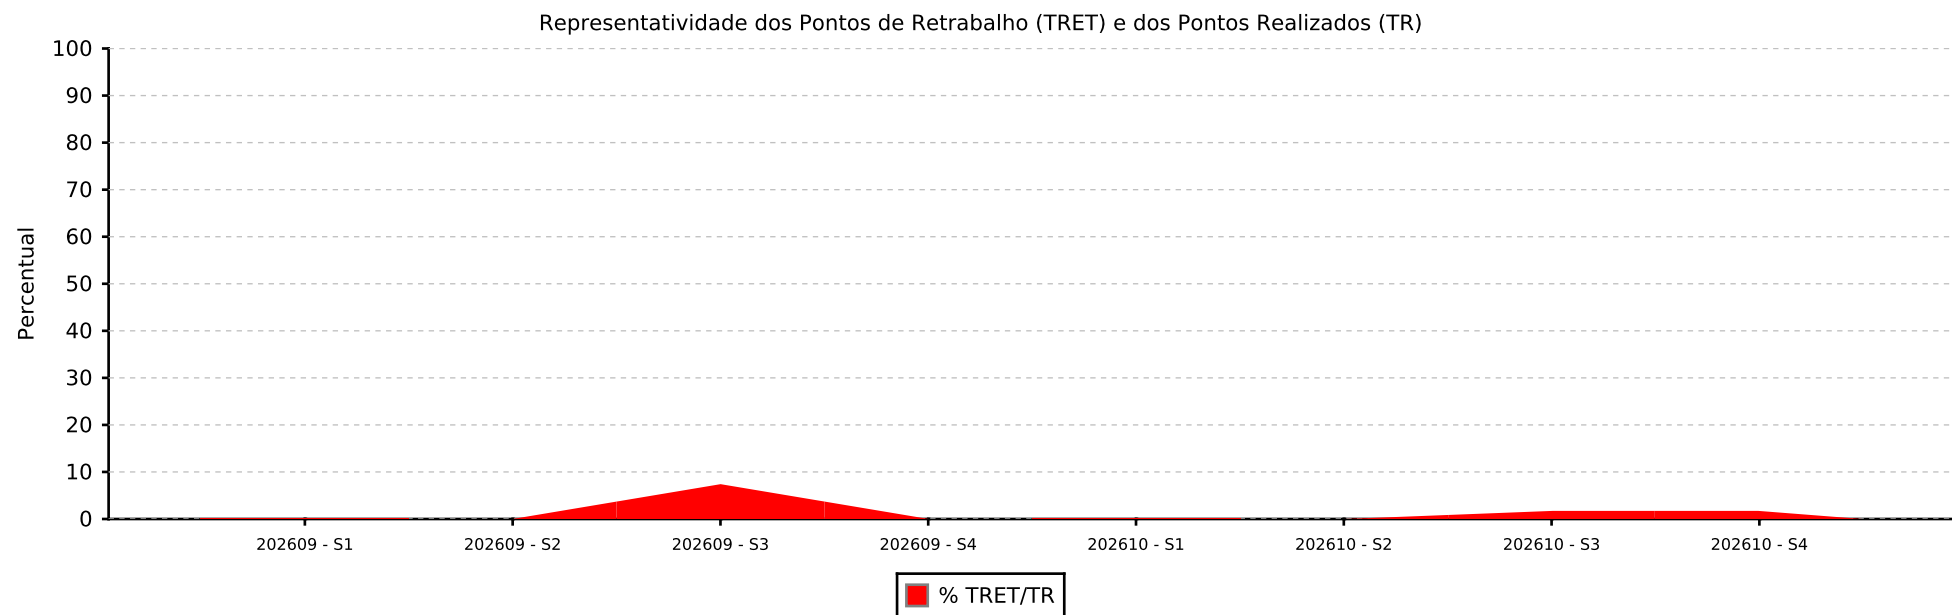



	202609				202610			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	24.5	62	27	42	33	43.5	29	58
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	2	0	0	0	0.5	1
% TRET/TR	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	1,25	1	9,27	1	0,25	1	0	4	10,77	269,2 %	
Clean Code	3	0	3	0,58	3	1,57	3	0	12	2,15	17,9 %	
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Correção do Code Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Geração de Atas	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0,25	25,0 %	
Atividades Gerenciais	1	2,02	1	0	1	0	1	0	4	2,02	50,5 %	
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Treinamento	0,25	0	0,25	0	0,25	0,13	0,25	0	1	0,13	13,0 %	
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Total Geral		179,99	191,19	219,99	241,91	220	238,52	219,99	249,46	839,97	921,08	109,7 %


% de Horas por Atividade

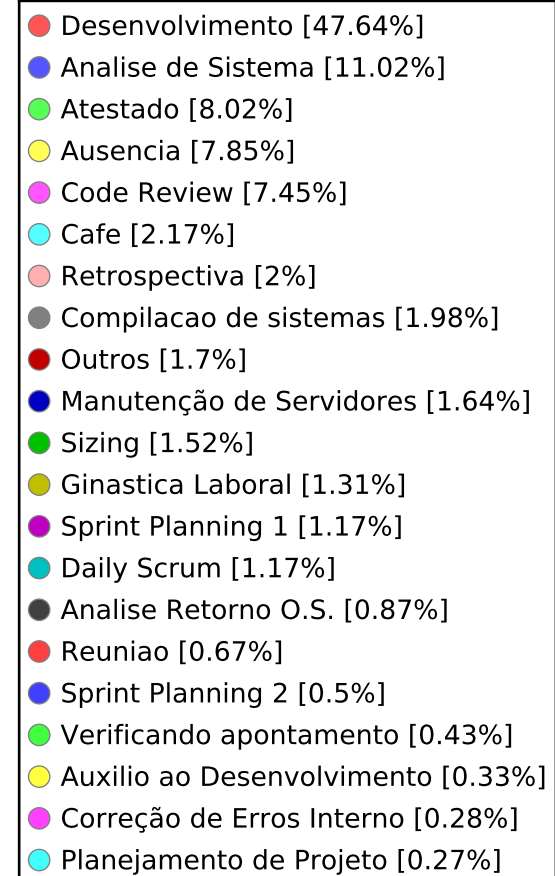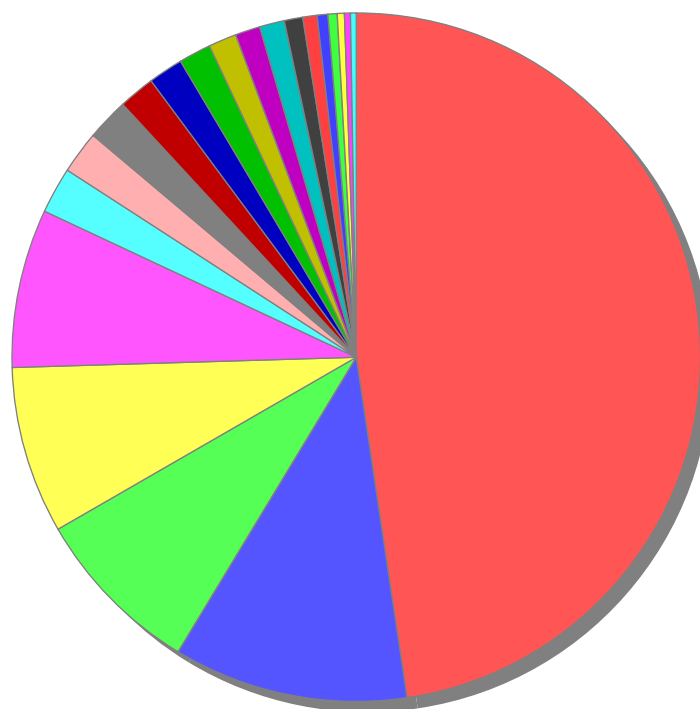

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos		97,75	87,82	126,73	130,05	130,55	122,52	128,37	120,38	483,4	460,77	95,3 %
REQM - Gestao de Requisitos		29	34,3	34,92	23,83	31,12	29,57	34,07	37,6	129,11	125,3	97,0 %
DIV - Diversos*		15,67	26,82	19,4	33,87	19,42	44,97	17,75	34,2	72,24	139,86	193,6 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto		29,67	36,12	30,67	45,68	30,5	36,85	30,4	26,5	121,24	145,15	119,7 %
CM - Gerencia de Configuracao		5,5	3,97	5,5	6,65	5,5	2,02	5,5	4,95	22	17,59	80,0 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0	0	0	0	0	1,25	0,67	1,25	0,67	53,6 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	177,59	189,03	217,22	240,08	217,09	235,93	217,34	224,3	829,24	889,34	107,2 %

% de Horas por Área do CMMI

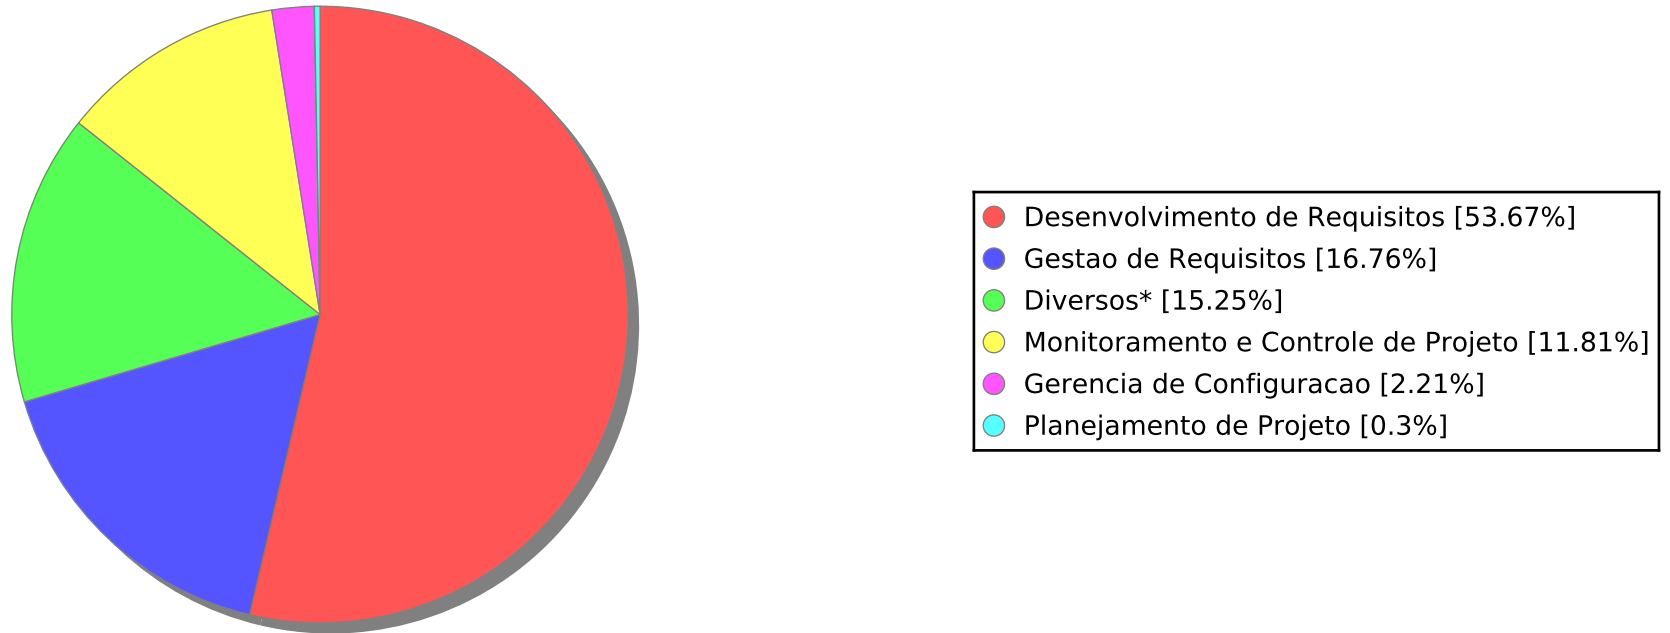


INDICADORES DO PROJETO


	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
01. Horas planejadas de todas atividades	880h00m	716h00m	840h00m	980h00m	1092h32m	1109h27m	948h00m	840h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	937h16m	746h03m	939h50m	1039h55m	1161h40m	1159h28m	840h38m	921h05m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	645h10m	527h37m	565h10m	663h54m	776h51m	749h32m	642h25m	537h53m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	563h33m	431h51m	569h05m	610h47m	677h36m	659h54m	483h43m	512h53m
05. Pontos planejados para o projeto	4,0	160,8	4,0	205,0	248,0	230,0	195,0	164,0
06. Pontos planejados	293,0	111,0	221,5	203,0	183,0	219,5	203,5	186,0
07. Pontos entregues	182	135,5	177	190,5	204,5	214	155,5	163,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	136,00	85,00	113,50	135,00	132,50	140,00	128,50	119,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	46,00	50,50	63,50	55,50	72,00	74,00	27,00	44,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	2	3	3	5	8	4	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	25	42	33	47	52	41	39	41
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	46	43	55	61	72	75	29	32
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	1	1	2	3	2	3
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0	0,5	3,5	4	4	3,5	2	1,5
16. Produtividade planejada	0,455	0,211	0,392	0,306	0,236	0,293	0,317	0,346
17. Produtividade realizada	0,323	0,314	0,312	0,312	0,302	0,325	0,322	0,319
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	4550	84,3	4425	93	82,5	93,1	79,8	99,7
19. % Pontos NP / Pontos entregues	25,3	37,3	35,9	29,2	35,3	34,6	17,4	27,3

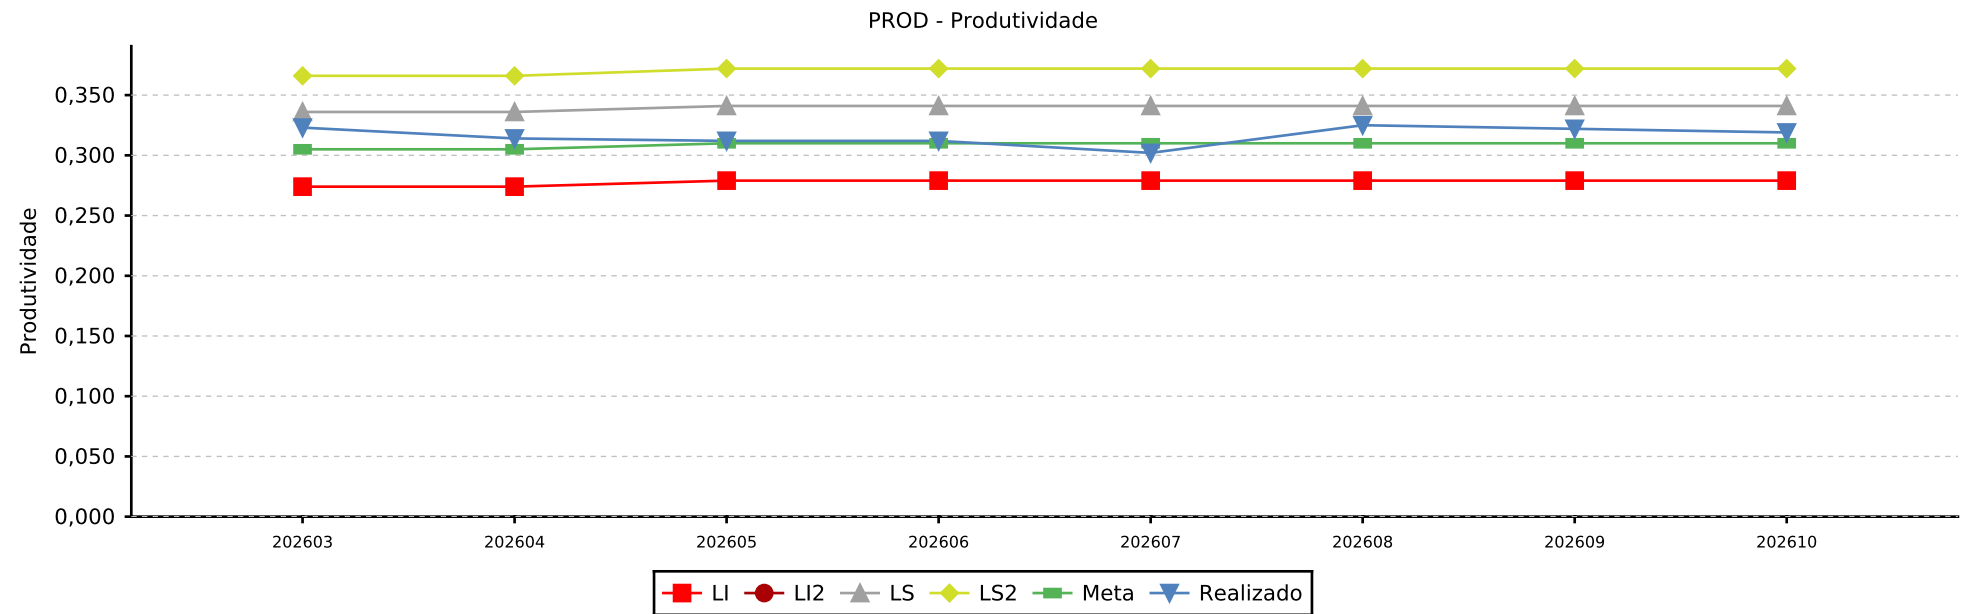


	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
Realizado	0,323	0,314	0,312	0,312	0,302	0,325	0,322	0,319
Meta	0,305	0,305	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310
LS2	0,366	0,366	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372
LS	0,336	0,336	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341
LI2								
LI	0,274	0,274	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279

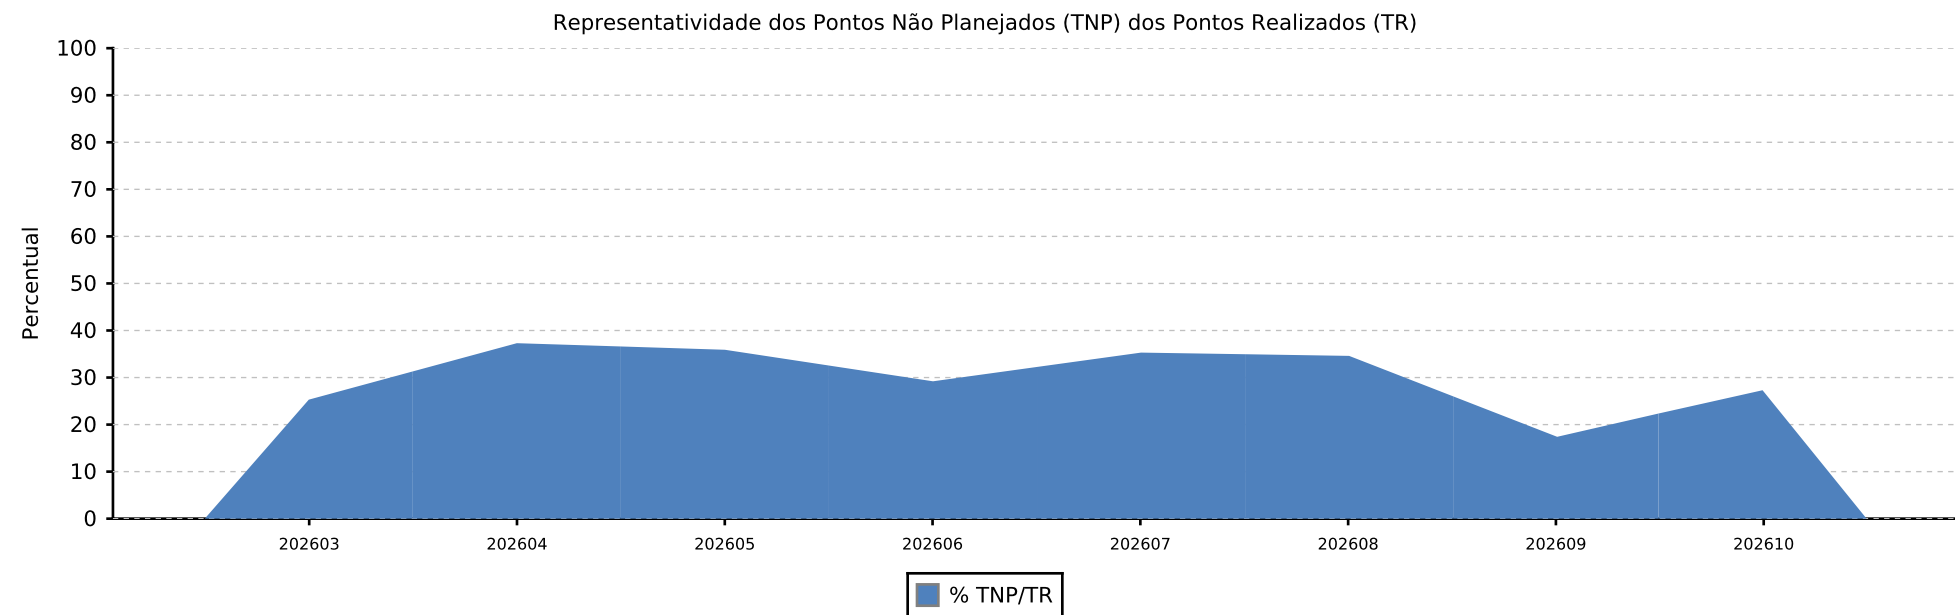


	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
TR - Pontos Realizados	182	135.5	177	190.5	204.5	214	155.5	163.5
TNP - Pontos Não Planejados	46	50.5	63.5	55.5	72	74	27	44.5
% TNP/TR	25,3	37,3	35,9	29,2	35,3	34,6	17,4	27,3

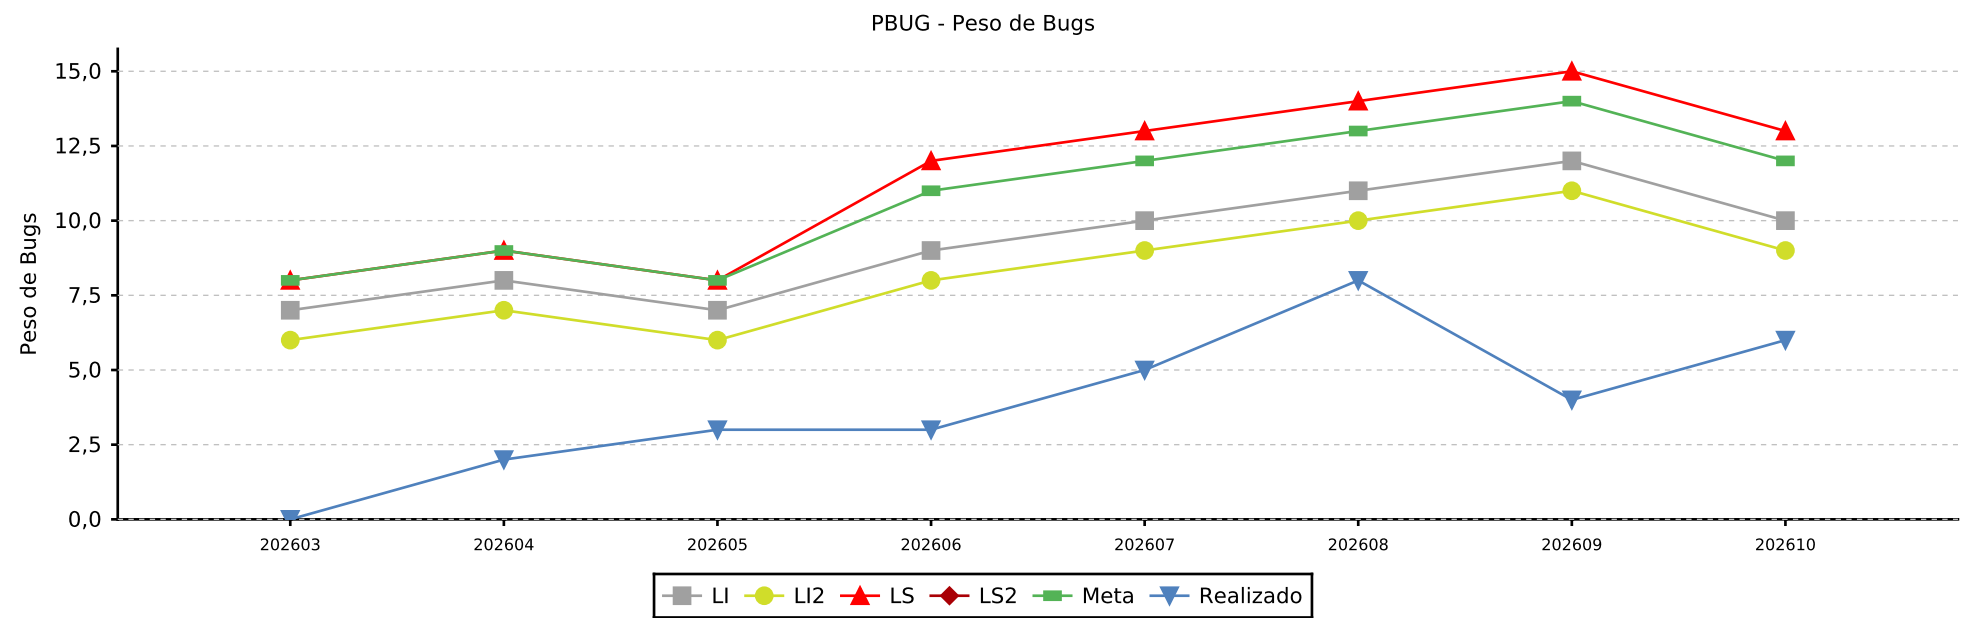


	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
Realizado	0	2	3	3	5	8	4	6
Meta	8	9	8	11	12	13	14	12
LS2								
LS	8	9	8	12	13	14	15	13
LI2	6	7	6	8	9	10	11	9
LI	7	8	7	9	10	11	12	10
Pontos Entregues	182	135.5	177	190.5	204.5	214	155.5	163.5
% PBUG / TR	0,00	1,48	1,70	1,58	2,45	3,74	2,58	3,67

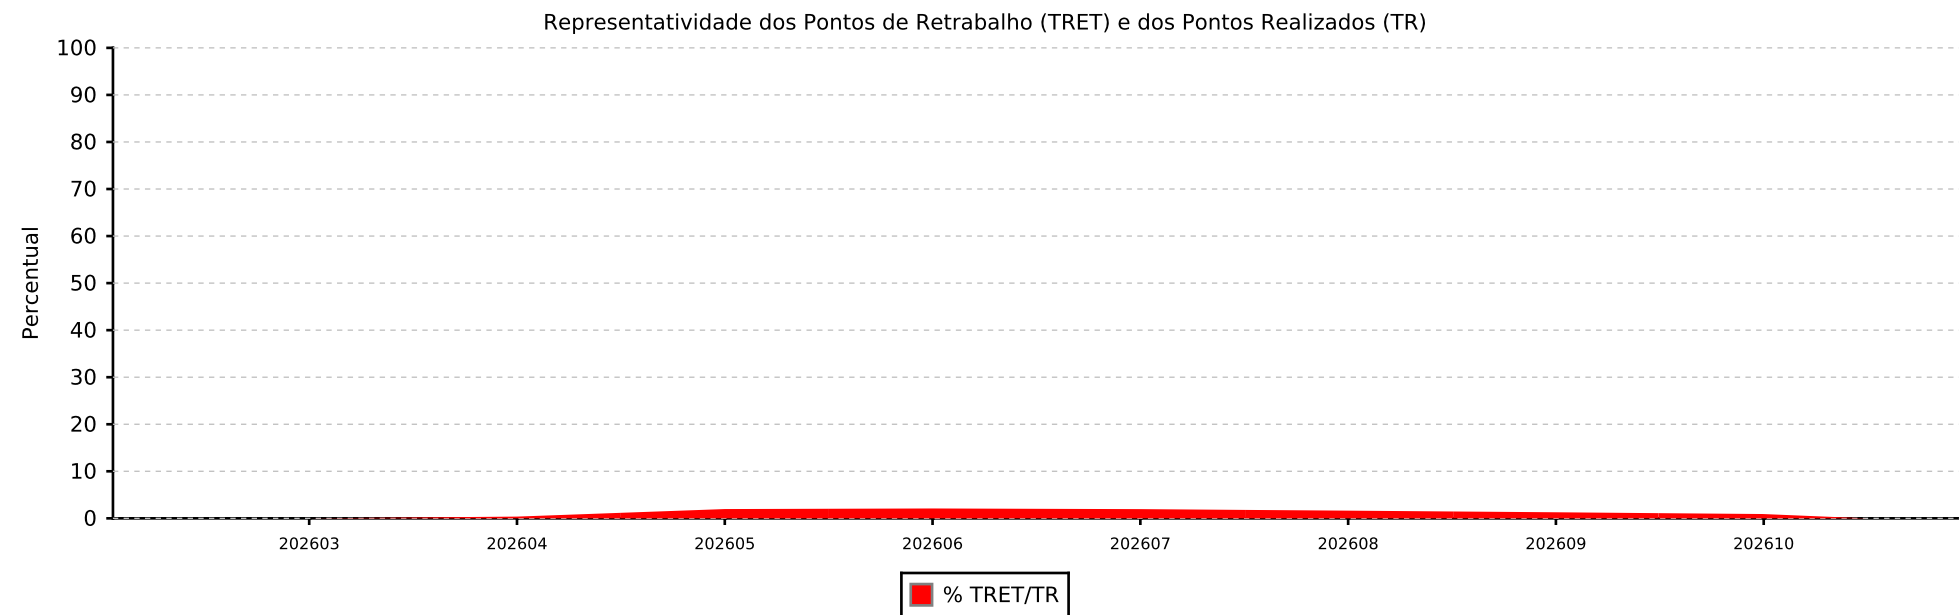

	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
TR - Pontos Realizados	182	135.5	177	190.5	204.5	214	155.5	163.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0.5	3.5	4	4	3.5	2	1.5
% TRET/TR	0,0	0,4	2,0	2,1	2,0	1,6	1,3	0,9

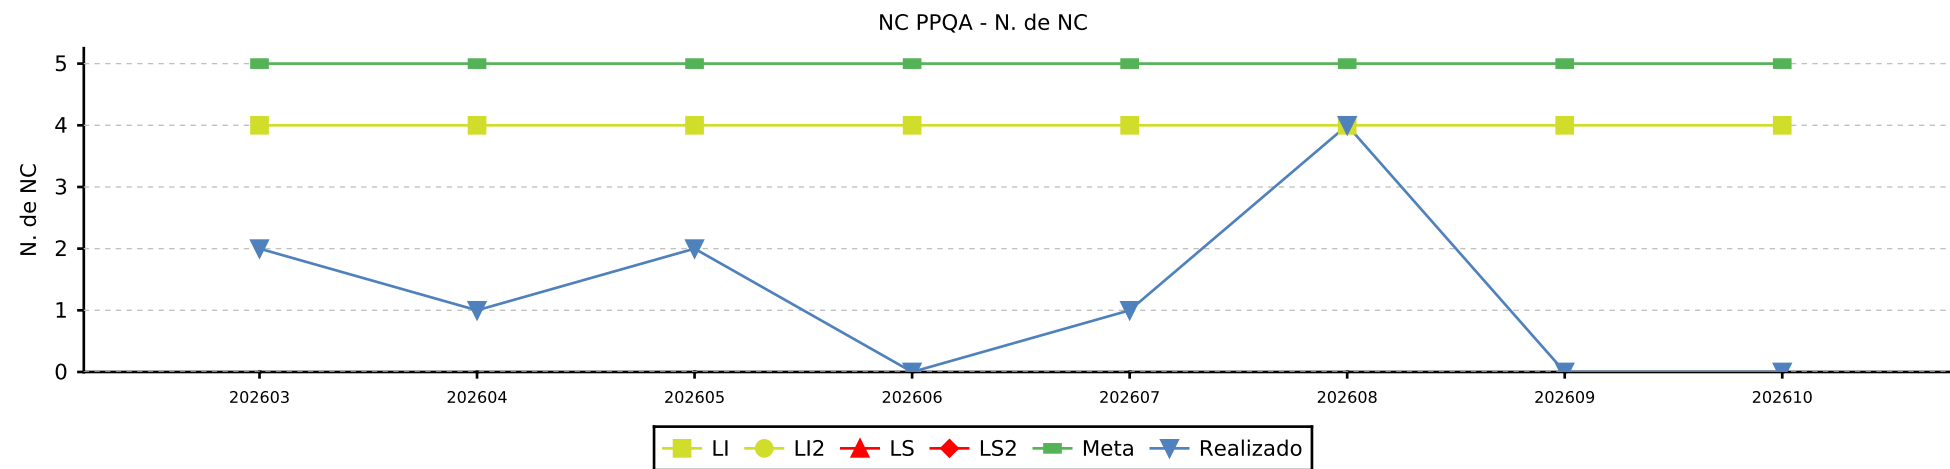


	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
Realizado	2	1	2	0	1	4	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

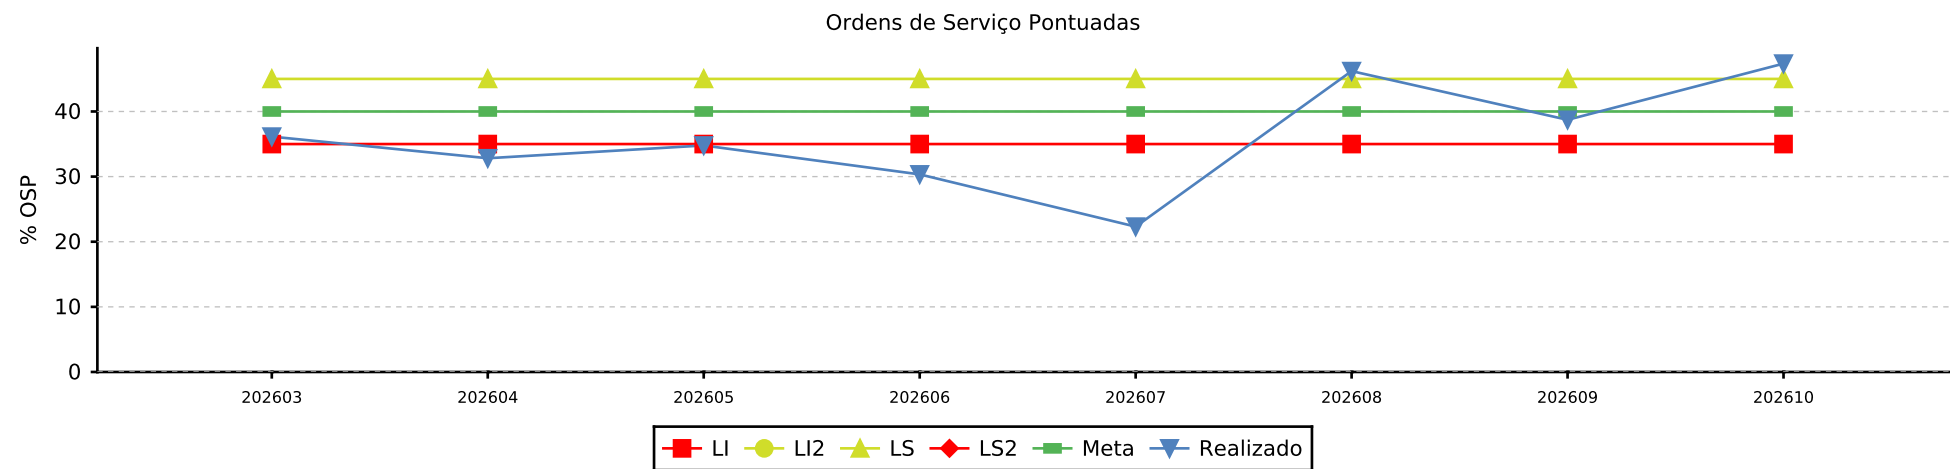

	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610
Realizado	36.14	32.82	34.78	30.34	22.32	46.2	38.72	47.35
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

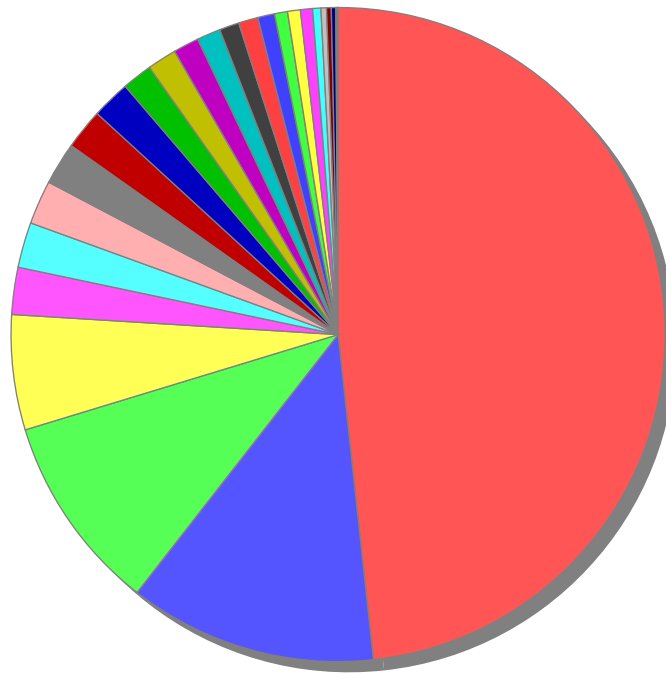

- Desenvolvimento [48.28%]
- Code Review [12.26%]
- Analise de Sistema [9.76%]
- Ausencia [5.68%]
- Cafe [2.33%]
- Outros [2.24%]
- Atestado [2.17%]
- Reuniao [2.09%]
- Daily Scrum [2.01%]
- Compilacao de sistemas [1.91%]
- Retrospectiva [1.49%]
- Ginastica Laboral [1.46%]
- Sprint Planning 1 [1.27%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [1.17%]
- Sizing [0.98%]
- Analise Retorno O.S. [0.97%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.83%]
- Verificando apontamento [0.64%]
- Sprint Planning 2 [0.63%]
- Manutenção de Servidores [0.59%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.41%]
- Correção de Erros Interno [0.27%]
- Clean Code [0.23%]
- Atividades Gerenciais [0.22%]
- Planejamento de Projeto [0.07%]
- Geração de Atas [0.03%]
- Treinamento [0.01%]

% de Horas por Área do CMMI

