



INDICADORES DA SPRINT


	202607				202608			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	261h31m	266h02m	266h04m	298h55m	222h39m	264h46m	311h14m	310h48m
02. Horas realizadas de todas atividades	280h40m	271h55m	284h15m	324h50m	239h46m	286h45m	321h06m	311h51m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	175h15m	195h17m	199h23m	206h56m	135h33m	180h28m	214h12m	219h19m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	152h59m	161h59m	179h50m	182h48m	111h42m	157h21m	199h07m	191h44m
05. Pontos planejados	46,5	58,5	53,0	25,0	45,0	49,5	54,0	71,0
06. Pontos entregues	61	56,5	64	23	37	45,5	69	62,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	39,50	45,50	39,50	8,00	19,50	28,50	41,00	51,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	21,50	11,00	24,50	15,00	17,50	17,00	28,00	11,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	2	3	0	6	2	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	17	17	14	4	11	10	10	10
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	23	14	22	13	22	16	25	12
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	1	1	0	2	1	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0,5	3	0,5	0	2,5	0,5	0,5
15. Produtividade planejada	0,266	0,300	0,266	0,121	0,332	0,275	0,253	0,324
16. Produtividade realizada	0,399	0,349	0,356	0,126	0,332	0,290	0,347	0,326
17. % Pontos NP / Pontos entregues	35,3	19,5	38,3	65,3	47,3	37,4	40,6	18,4

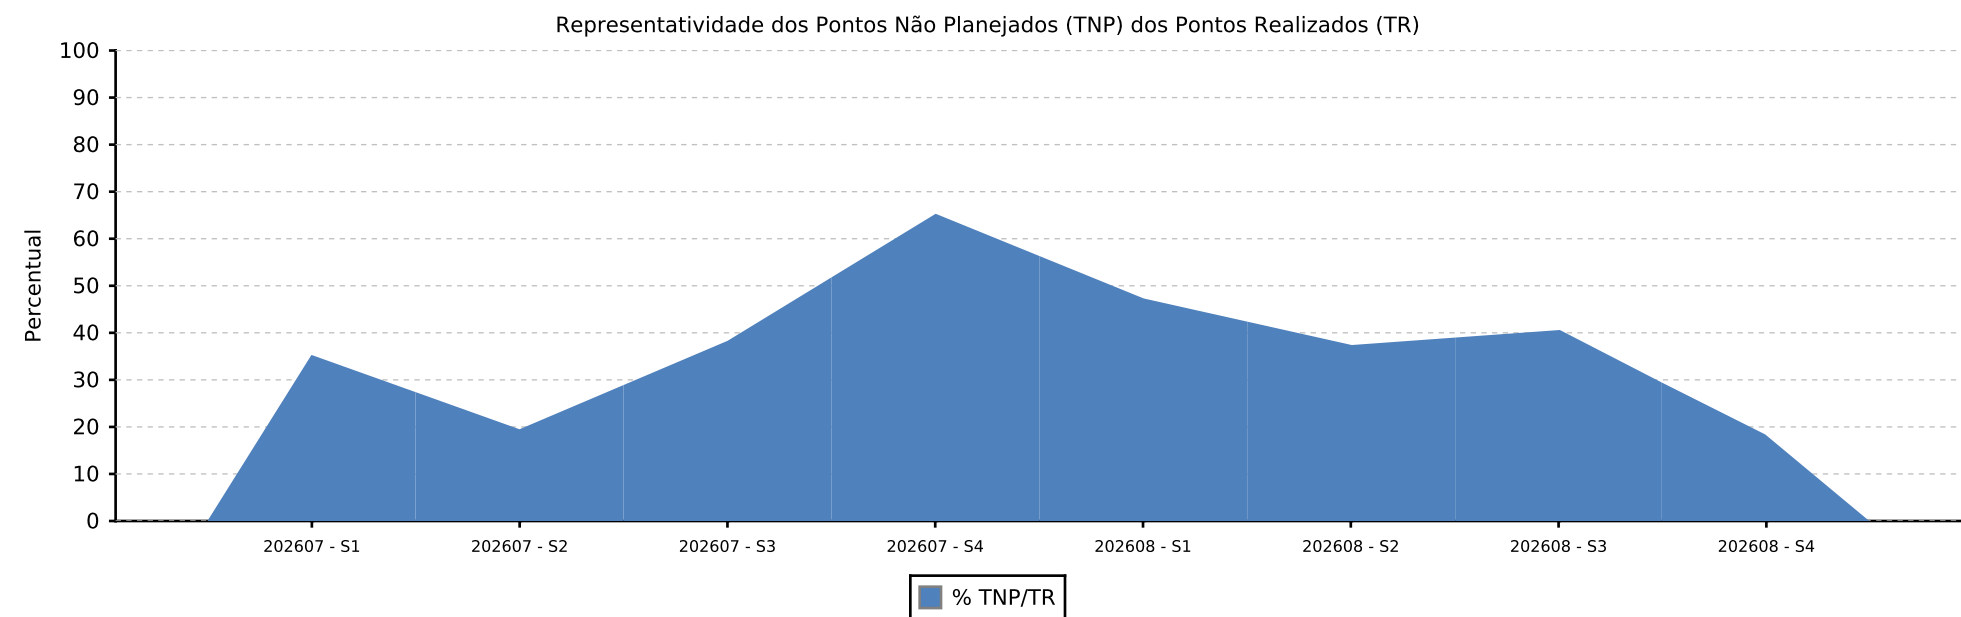

	202607				202608			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	61	56.5	64	23	37	45.5	69	62.5
TNP - Pontos Não Planejados	21.5	11	24.5	15	17.5	17	28	11.5
% TNP/TR	35,3	19,5	38,3	65,3	47,3	37,4	40,6	18,4

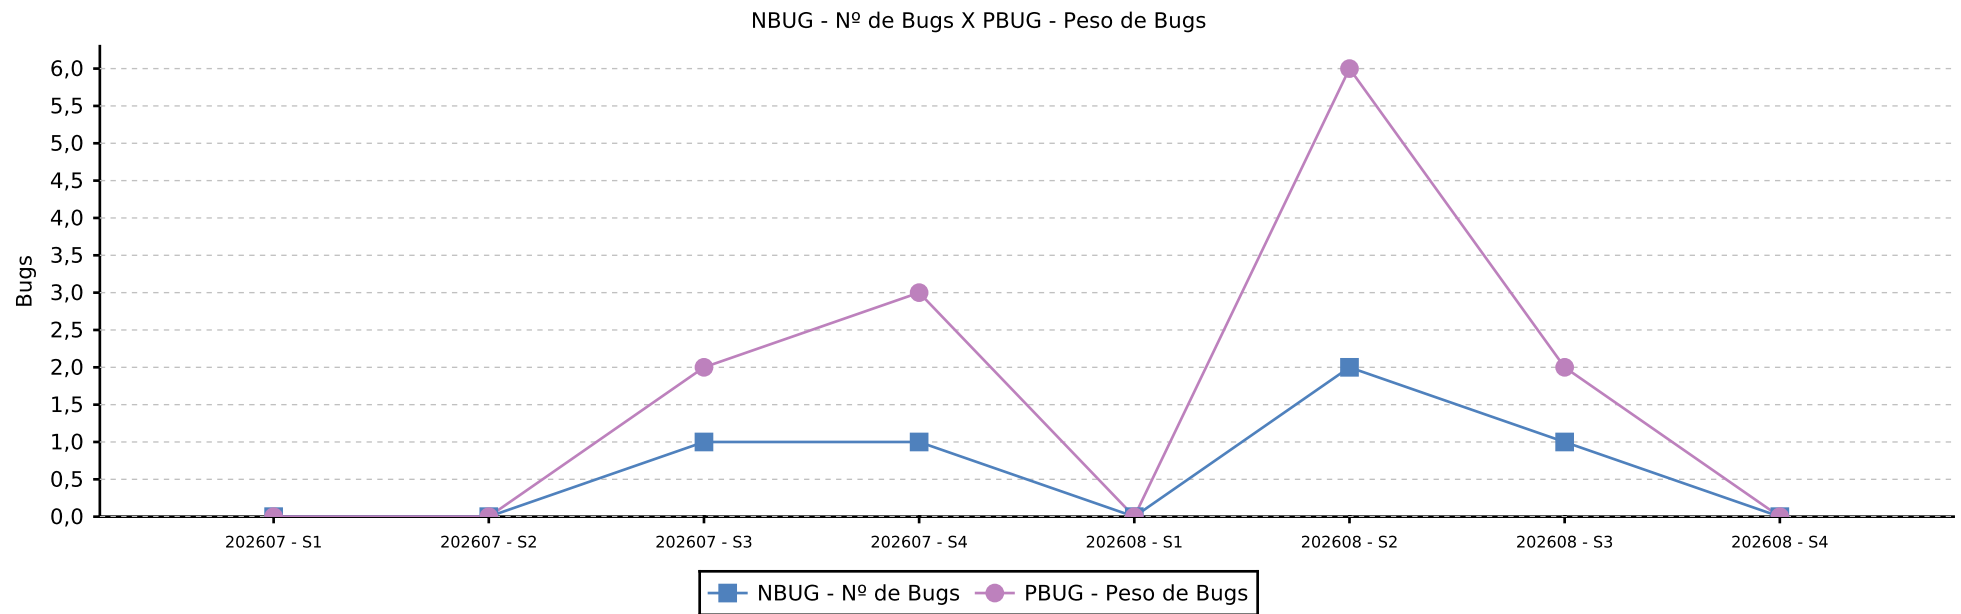

	202607				202608			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	1	1	0	2	1	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	2	3	0	6	2	0
Pontos Entregues	61	56.5	64	23	37	45.5	69	62.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	3,13	13,05	0,00	13,19	2,90	0,00

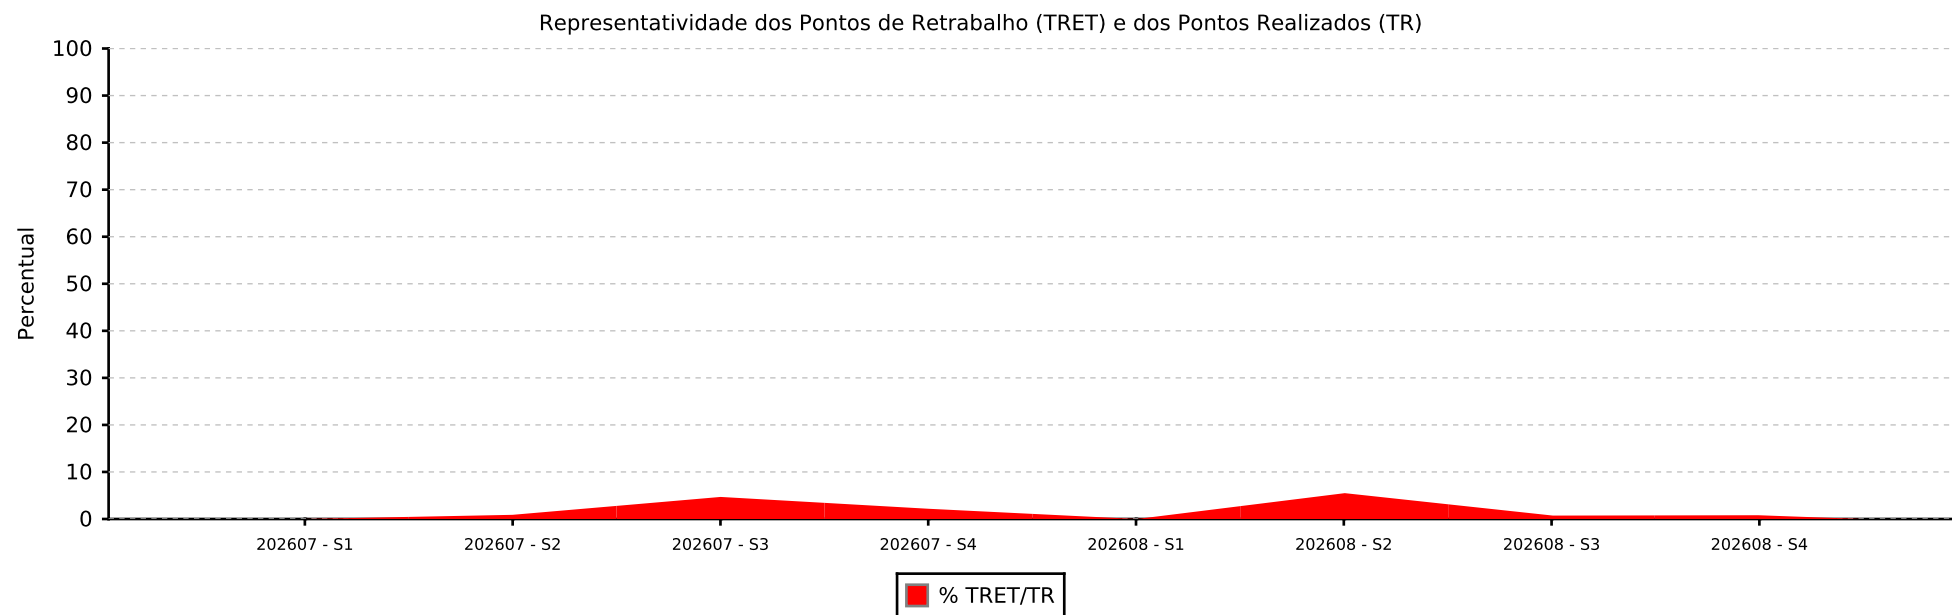



	202607				202608			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	61	56.5	64	23	37	45.5	69	62.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0.5	3	0.5	0	2.5	0.5	0.5
% TRET/TR	0,0	0,9	4,7	2,2	0,0	5,5	0,7	0,8

HORAS POR ATIVIDADE

Atividade	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
Desenvolvimento	113,13	89,4	152,22	133,38	179,7	178,45	183	152,03	628,05	553,26	88,1 %
Análise de Sistema	26,08	32,03	22,83	31,48	22,45	19,28	24,48	29,77	95,84	112,56	117,4 %
Code Review	19	36,02	22	25,22	25	23	25	28,05	91	112,29	123,4 %
Ausencia	0,73	5,67	0,05	10,17	3,05	11,13	0,33	13,2	4,16	40,17	965,6 %
Daily Scrum	6,92	5,75	8,5	4,32	11,08	8,75	9,82	12,73	36,32	31,55	86,9 %
Sizing	6	12,4	6	15,37	6	21,23	6	9,57	24	58,57	244,0 %
Sprint Planning 2	2,33	1,67	2,92	1,67	3,25	1,5	4,08	8,67	12,58	13,51	107,4 %
Cafe	6,25	6	7,25	7,5	8,75	8,75	8,75	7,75	31	30	96,8 %
Sprint Planning 1	4,67	3,33	6	5	6,75	4,5	6,83	6,67	24,25	19,5	80,4 %
Compilacao de sistemas	5,5	4,7	5,5	8,02	5,5	2,83	5,5	5,48	22	21,03	95,6 %
Ginastica Laboral	4	3,92	5	4,83	5,83	5,13	5,83	5,1	20,66	18,98	91,9 %
Manutenção de Servidores	0	4,22	0	3,72	0	0,92	0	5	0	13,86	0,0 %
Outros	7,6	15,43	1,75	7,33	2,33	1,63	0	5	11,68	29,39	251,6 %
Reuniao	4,08	1,33	5,08	4,25	5,08	7,82	5,33	4,98	19,57	18,38	93,9 %
Retrospectiva	5	4	5,83	5	6,67	4	6,58	4,08	24,08	17,08	70,9 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	2,87	3,63	3,88	10,22	5,08	3,25	4,25	3,83	16,08	20,93	130,2 %
Atestado	0	0	0	0	0	0	0	2,73	0	2,73	0,0 %
Verificando apontamento	2,15	1,07	2,12	1,38	4,78	2,17	2,83	1,75	11,88	6,37	53,6 %
Análise Retorno O.S.	0	2,6	0	0	0	2	0	1,67	0	6,27	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,0 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	2,5	0,97	2,5	0,97	38,8 %
Correção de Erros Interno	0,25	1,75	0,25	0	0,25	0	0,25	0,58	1	2,33	233,0 %
Clean Code	3	0	4	2,4	5	0	5	0,5	17	2,9	17,1 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0	1,58	0,5	1,87	1,25	1	1	0,5	2,75	4,95	180,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0,23	0	0,23	0,0 %
Correção do Code Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	1,68	1	1,33	1	1,08	1	0	4	4,09	102,2 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividades Gerenciais	1	0,58	1	0	1	0	1	0	4	0,58	14,5 %

Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	1	0	0,67	0	0,67	0	0	0	2,34	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0,33	0	0,33	0	0,67	0	0,67	0	2	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0,0 %
Documentação	0	0	0	1,63	0	0	0	0	0	1,63	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	222,64	239,76	264,76	286,76	311,22	321,09	310,78	311,84	1.109,4	1.159,45	104,5 %


% de Horas por Atividade

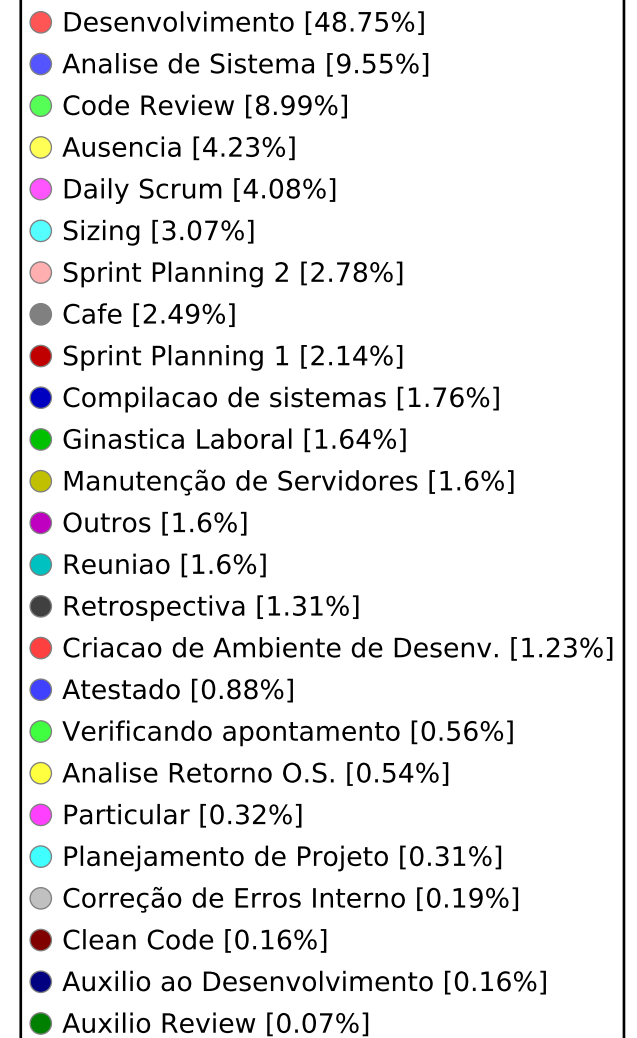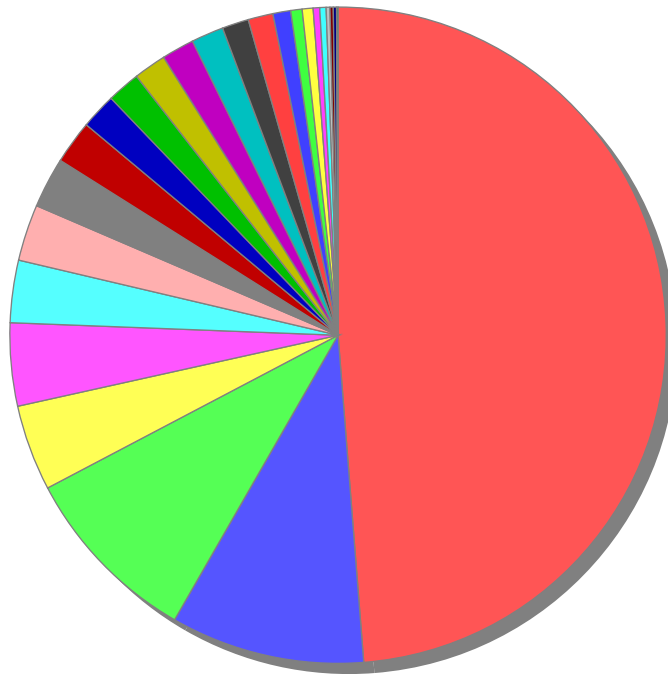

HORAS POR ÁREA DO CMMI


Area CMMI	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	
RD - Desenvolvimento de Requisitos	119,5	97,37	161,1	148,53	191,53	183,37	193,75	157,45	665,88	586,72	88,1 %
REQM - Gestao de Requisitos	39,08	52,03	37,75	53,52	38,45	52,52	41,4	56,33	156,68	214,4	136,8 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	30,92	45,77	36,33	34,53	42,75	35,75	41,4	44,87	151,4	160,92	106,3 %
DIV - Diversos*	25	34,62	21,47	35,42	27,72	35,55	22,92	36,03	97,11	141,62	145,8 %
CM - Gerencia de Configuracao	5,5	4,7	5,5	8,02	5,5	2,83	5,5	5,48	22	21,03	95,6 %
PP - Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	2,5	0,97	2,5	0,97	38,8 %
OT - Treinamento na Organizacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	220	234,49	262,15	280,02	305,95	310,02	307,47	301,13	1.095,57	1.125,66	102,7 %

% de Horas por Área do CMMI

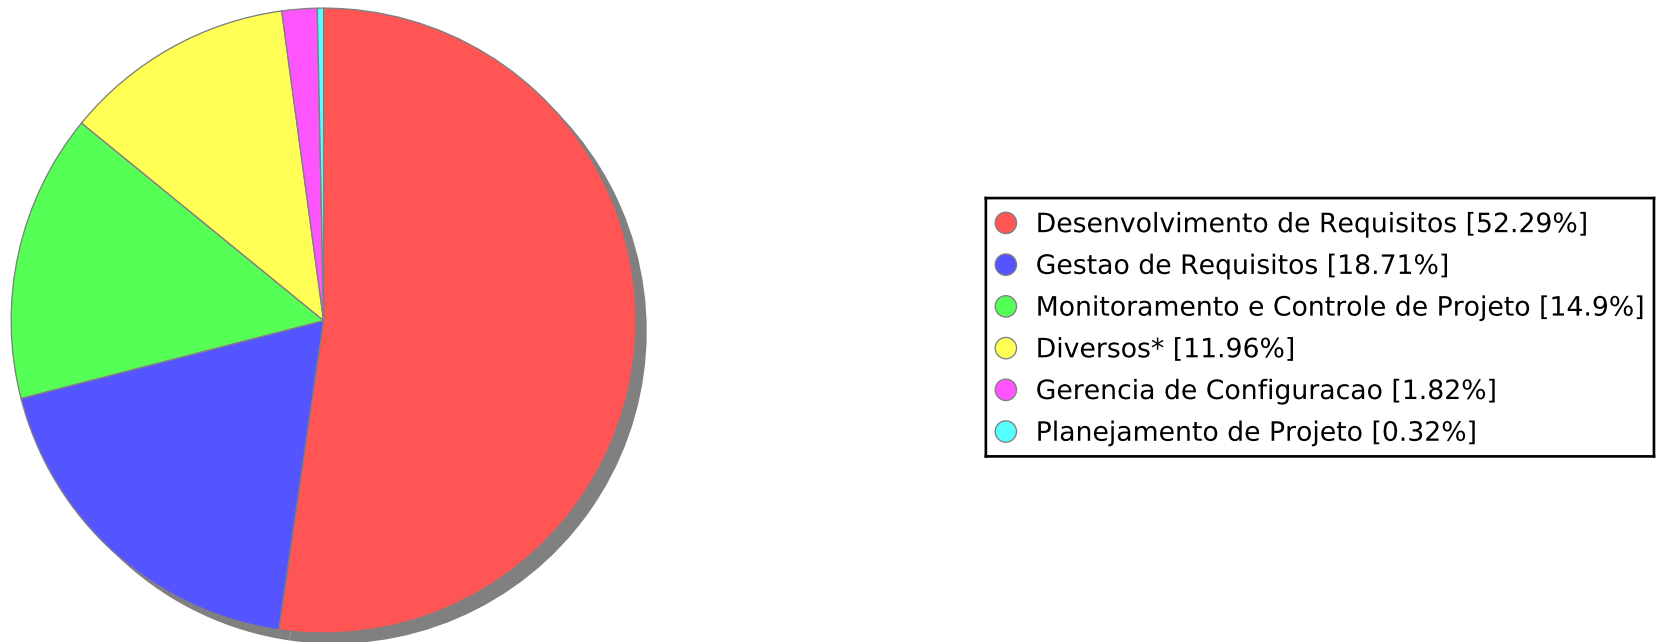


INDICADORES DO PROJETO


	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608
01. Horas planejadas de todas atividades	624h00m	760h00m	880h00m	716h00m	840h00m	980h00m	1092h32m	1109h27m
02. Horas realizadas de todas atividades	642h30m	772h50m	937h16m	746h03m	939h50m	1039h55m	1161h40m	1159h28m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	467h15m	562h08m	645h10m	527h37m	565h10m	663h54m	776h51m	749h32m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	379h56m	503h09m	563h33m	431h51m	569h05m	610h47m	677h36m	659h54m
05. Pontos planejados para o projeto	4,0	171,0	4,0	160,8	4,0	205,0	248,0	230,0
06. Pontos planejados	154,5	228,5	293,0	111,0	221,5	203,0	183,0	219,5
07. Pontos entregues	121,5	155	182	135,5	177	190,5	204,5	214
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	86,50	137,50	136,00	85,00	113,50	135,00	132,50	140,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	35,00	17,50	46,00	50,50	63,50	55,50	72,00	74,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	2	3	3	5	8
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	32	49	25	42	33	47	52	41
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	13	22	46	43	55	61	72	75
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	1	1	1	2	3
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0	0	0	0,5	3,5	4	4	3,5
16. Produtividade planejada	0,331	0,407	0,455	0,211	0,392	0,306	0,236	0,293
17. Produtividade realizada	0,320	0,309	0,323	0,314	0,312	0,312	0,302	0,325
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	3037,5	90,7	4550	84,3	4425	93	82,5	93,1
19. % Pontos NP / Pontos entregues	28,9	11,3	25,3	37,3	35,9	29,2	35,3	34,6

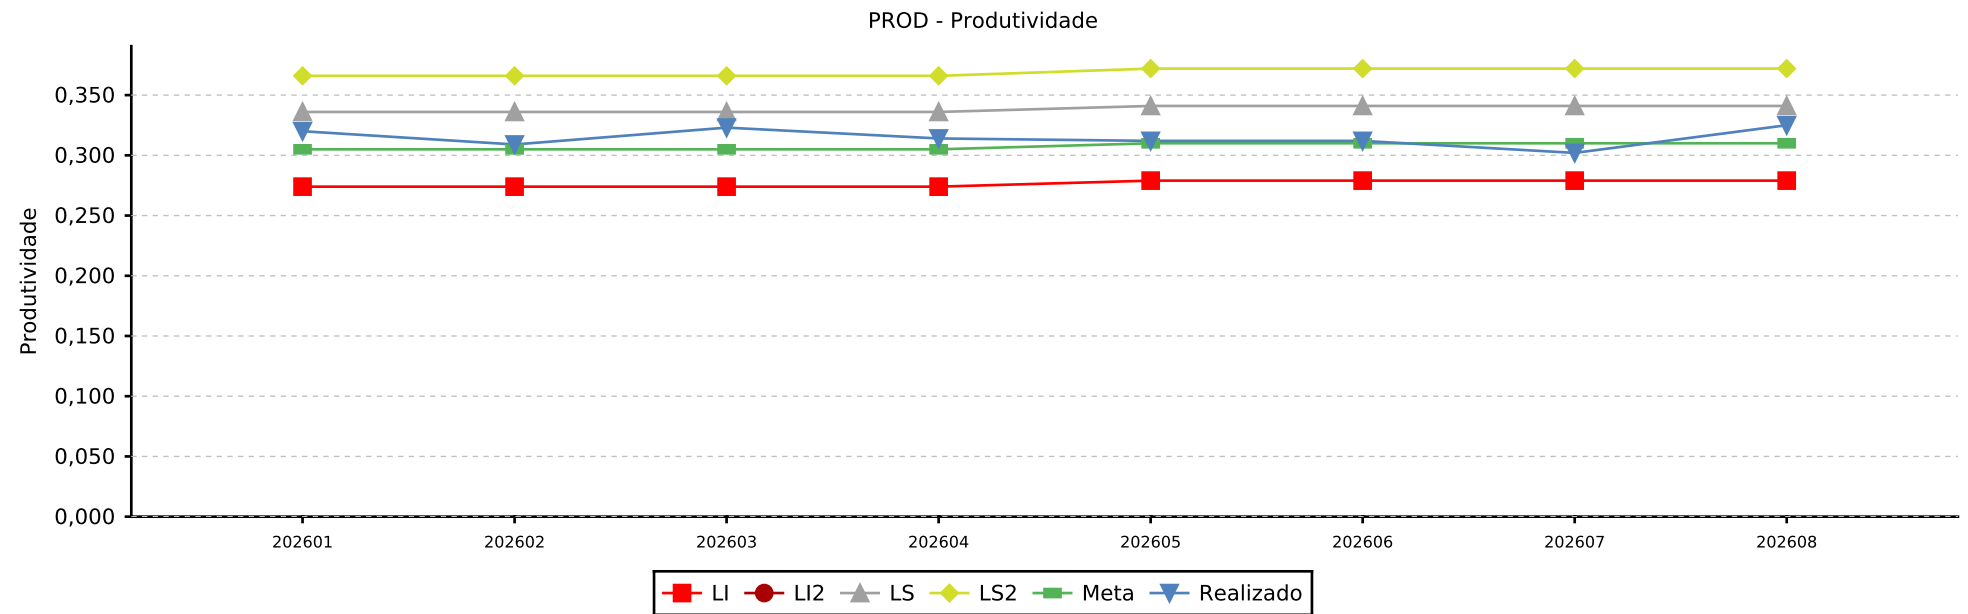


	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608
Realizado	0,320	0,309	0,323	0,314	0,312	0,312	0,302	0,325
Meta	0,305	0,305	0,305	0,305	0,310	0,310	0,310	0,310
LS2	0,366	0,366	0,366	0,366	0,372	0,372	0,372	0,372
LS	0,336	0,336	0,336	0,336	0,341	0,341	0,341	0,341
LI2								
LI	0,274	0,274	0,274	0,274	0,279	0,279	0,279	0,279

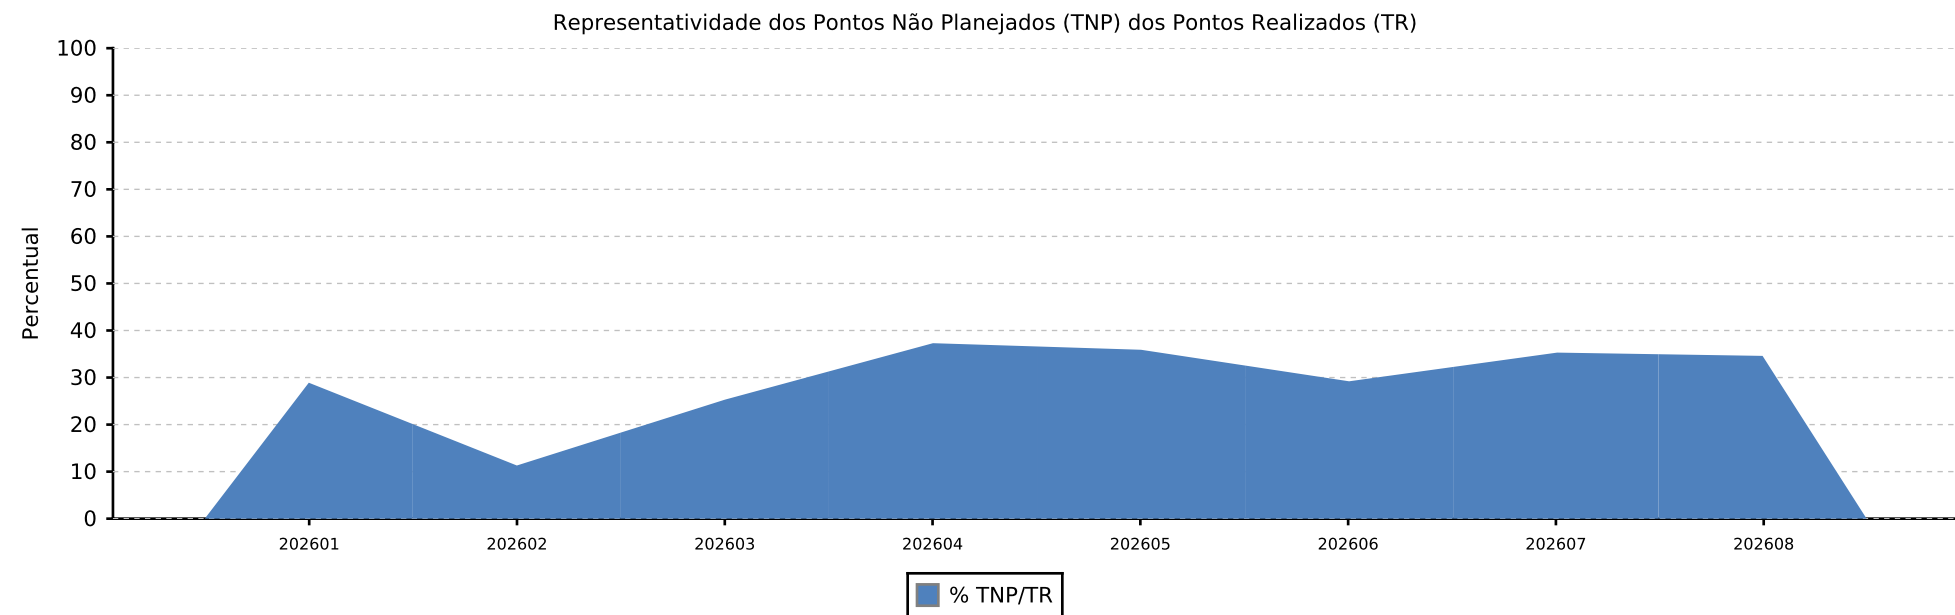


	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608
TR - Pontos Realizados	121.5	155	182	135.5	177	190.5	204.5	214
TNP - Pontos Não Planejados	35	17.5	46	50.5	63.5	55.5	72	74
% TNP/TR	28,9	11,3	25,3	37,3	35,9	29,2	35,3	34,6

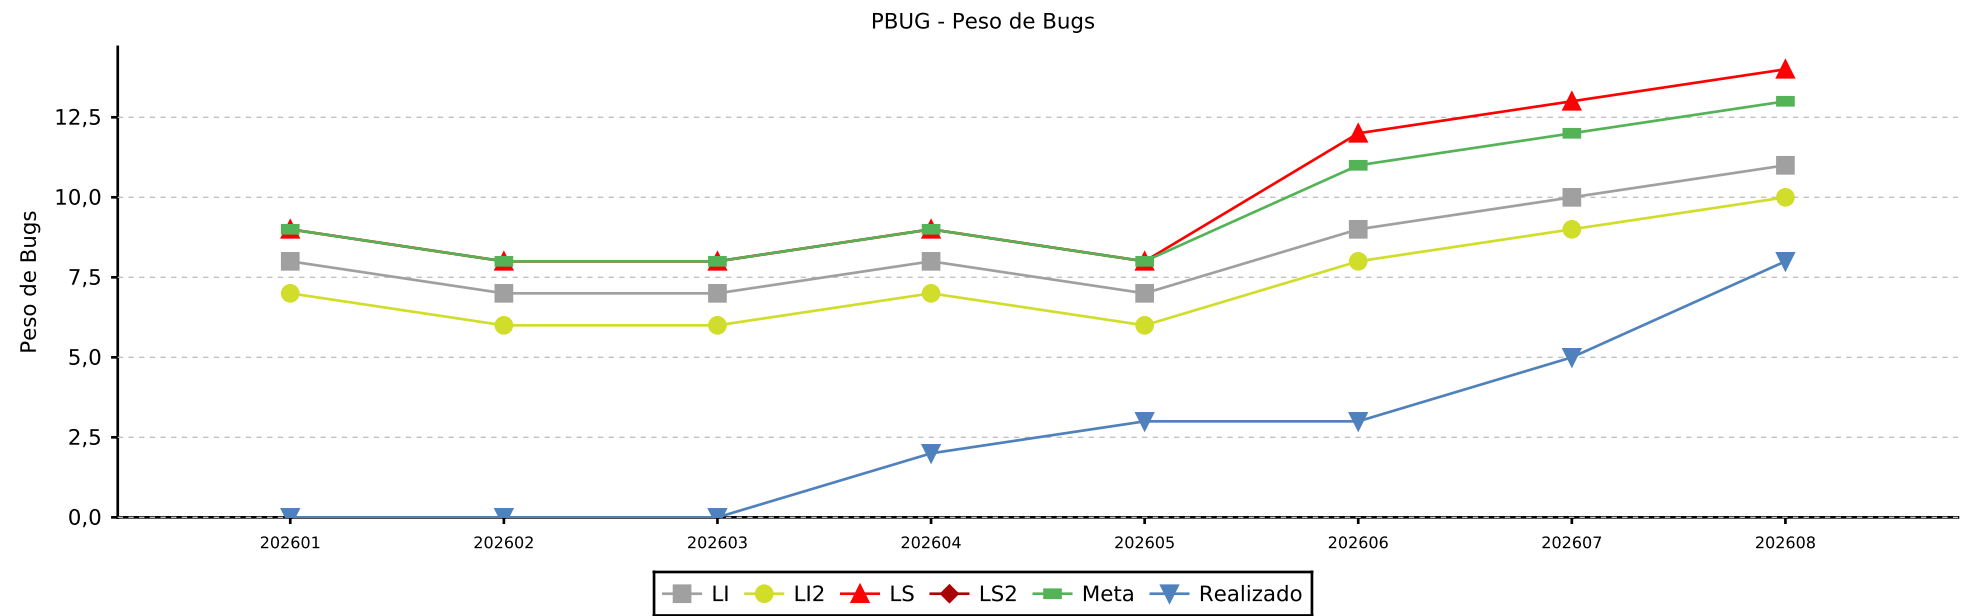


	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608
Realizado	0	0	0	2	3	3	5	8
Meta	9	8	8	9	8	11	12	13
LS2								
LS	9	8	8	9	8	12	13	14
LI2	7	6	6	7	6	8	9	10
LI	8	7	7	8	7	9	10	11
Pontos Entregues	121.5	155	182	135.5	177	190.5	204.5	214
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	1,48	1,70	1,58	2,45	3,74

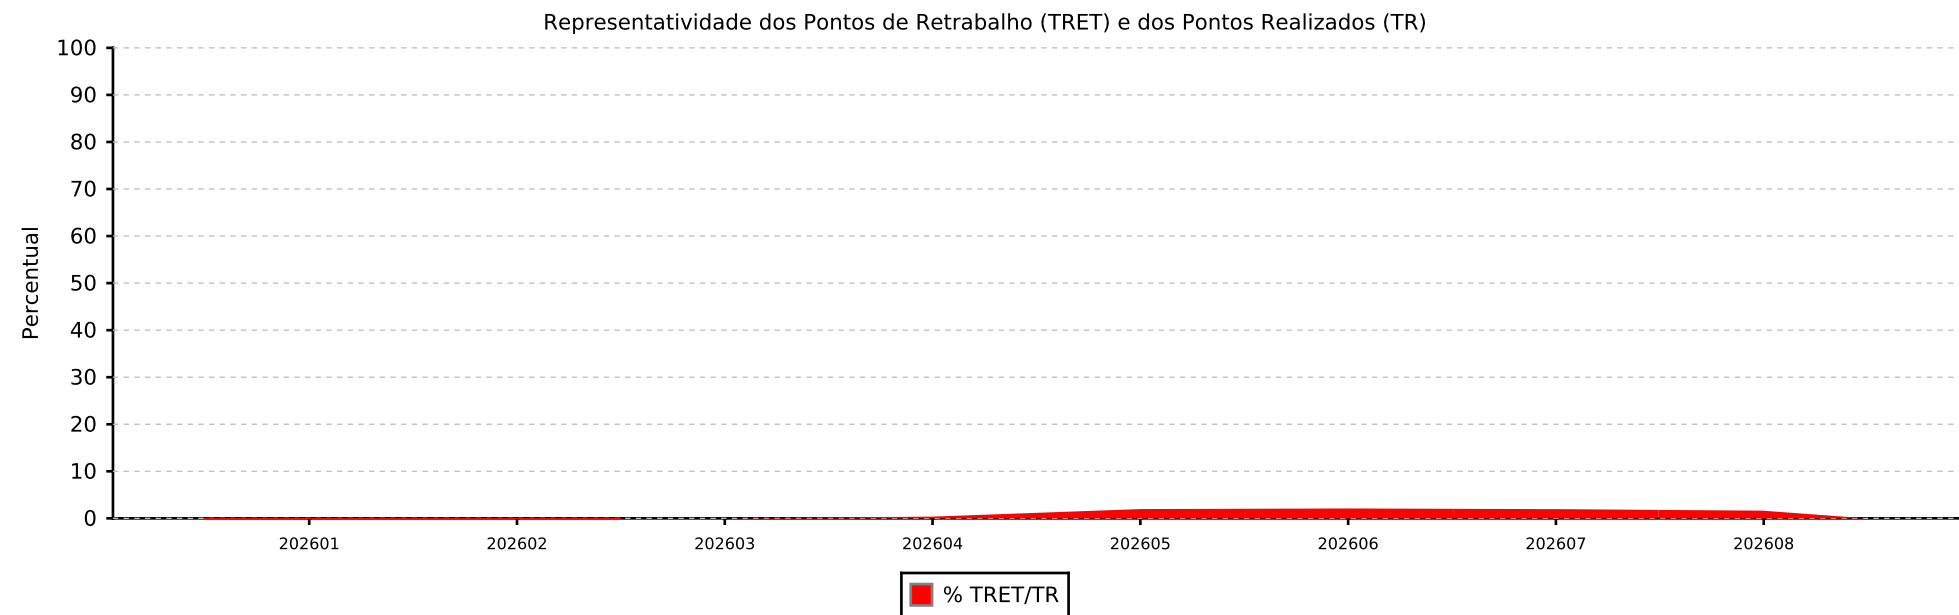

	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608
TR - Pontos Realizados	121.5	155	182	135.5	177	190.5	204.5	214
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0.5	3.5	4	4	3.5
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	0,4	2,0	2,1	2,0	1,6

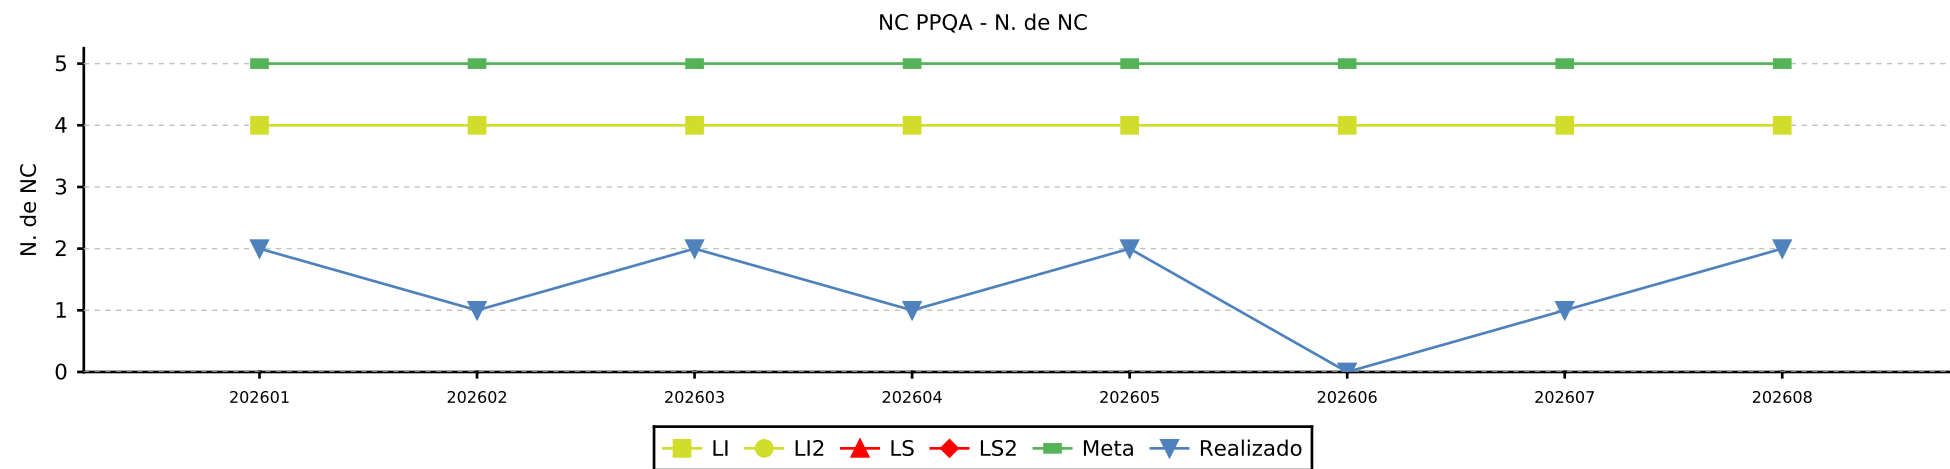


	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608
Realizado	2	1	2	1	2	0	1	2
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

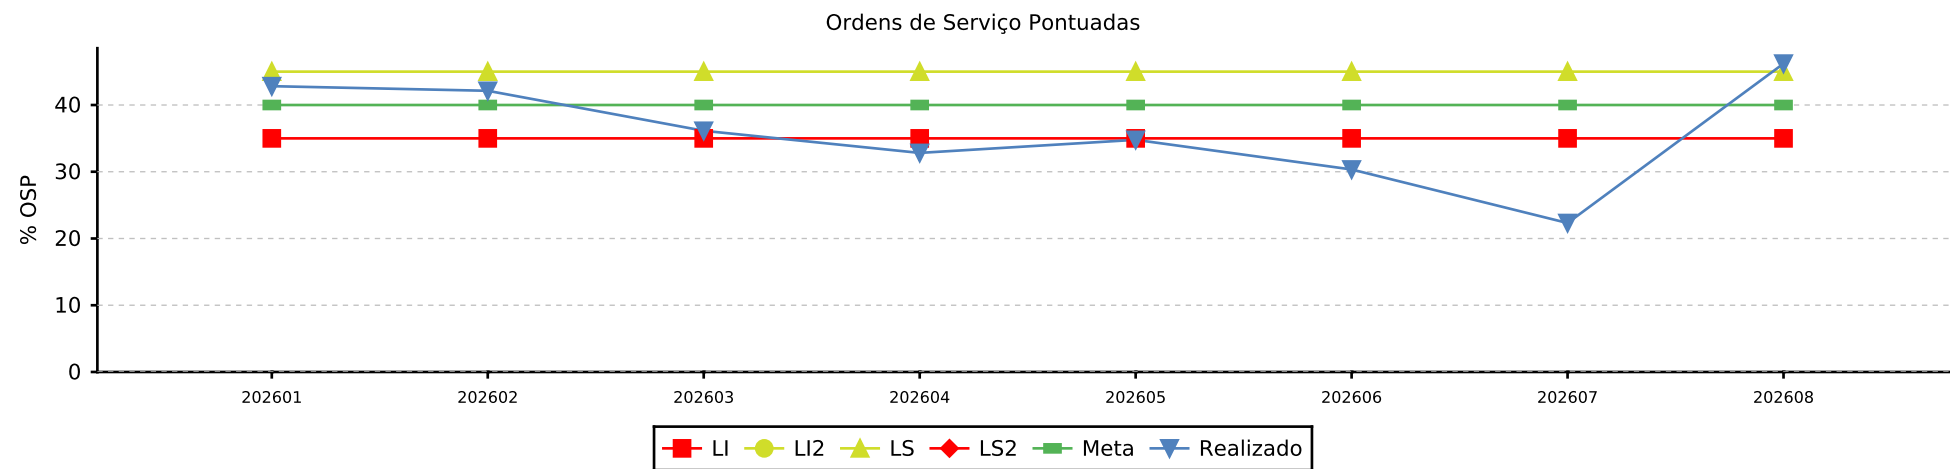

	202601	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608
Realizado	42.82	42.13	36.14	32.82	34.78	30.34	22.32	46.2
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

% de Horas por Atividade

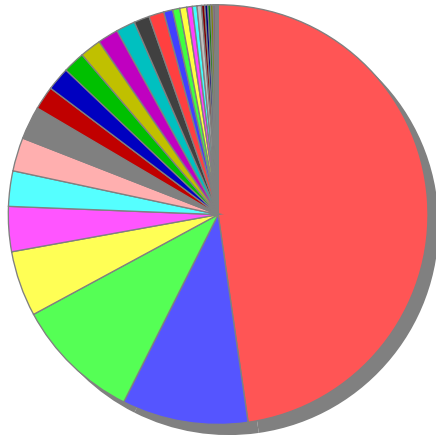

● Desenvolvimento [47.72%]	● Planejamento de Projeto [0.08%]
● Analise de Sistema [9.71%]	● Atividades Gerenciais [0.05%]
● Code Review [9.68%]	● Auxilio Review [0.02%]
● Sizing [5.05%]	
● Ausencia [3.46%]	
● Daily Scrum [2.72%]	
● Cafe [2.59%]	
● Outros [2.54%]	
● Compilacao de sistemas [1.81%]	
● Criacao de Ambiente de Desenv. [1.81%]	
● Sprint Planning 1 [1.68%]	
● Ginastica Laboral [1.64%]	
● Reuniao [1.59%]	
● Retrospectiva [1.47%]	
● Manutenção de Servidores [1.19%]	
● Sprint Planning 2 [1.16%]	
● Férias [0.69%]	
● Verificando apontamento [0.55%]	
● Analise Retorno O.S. [0.54%]	
● Auxilio ao Desenvolvimento [0.43%]	
● Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.35%]	
● Preparando ambiente [0.34%]	
● Clean Code [0.25%]	
● Atestado [0.24%]	
● Correção de Erros Interno [0.2%]	
● Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.2%]	
● Documentação [0.14%]	
● Particular [0.09%]	

% de Horas por Área do CMMI

