



INDICADORES DA SPRINT


	202608				202609			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	222h39m	264h46m	311h14m	310h48m	240h00m	264h00m	220h00m	224h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	239h46m	286h45m	321h06m	311h51m	234h46m	231h22m	188h46m	185h44m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	135h33m	180h28m	214h12m	219h19m	154h45m	182h29m	152h05m	153h06m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	111h42m	157h21m	199h07m	191h44m	147h40m	116h24m	106h17m	113h22m
05. Pontos planejados	45,0	49,5	54,0	71,0	51,0	72,0	30,0	50,5
06. Pontos entregues	37	45,5	69	62,5	24,5	62	27	42
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	19,50	28,50	41,00	51,00	13,00	60,00	19,00	36,50
08. Pontos entregues (apenas NP)	17,50	17,00	28,00	11,50	11,50	2,00	8,00	5,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	6	2	0	0	0	4	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	11	10	10	10	7	12	10	10
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	22	16	25	12	14	4	6	5
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	2	1	0	0	0	2	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	2,5	0,5	0,5	0	0	2	0
15. Produtividade planejada	0,332	0,275	0,253	0,324	0,330	0,395	0,198	0,330
16. Produtividade realizada	0,332	0,290	0,347	0,326	0,166	0,533	0,255	0,371
17. % Pontos NP / Pontos entregues	47,3	37,4	40,6	18,4	47	3,3	29,7	13,1

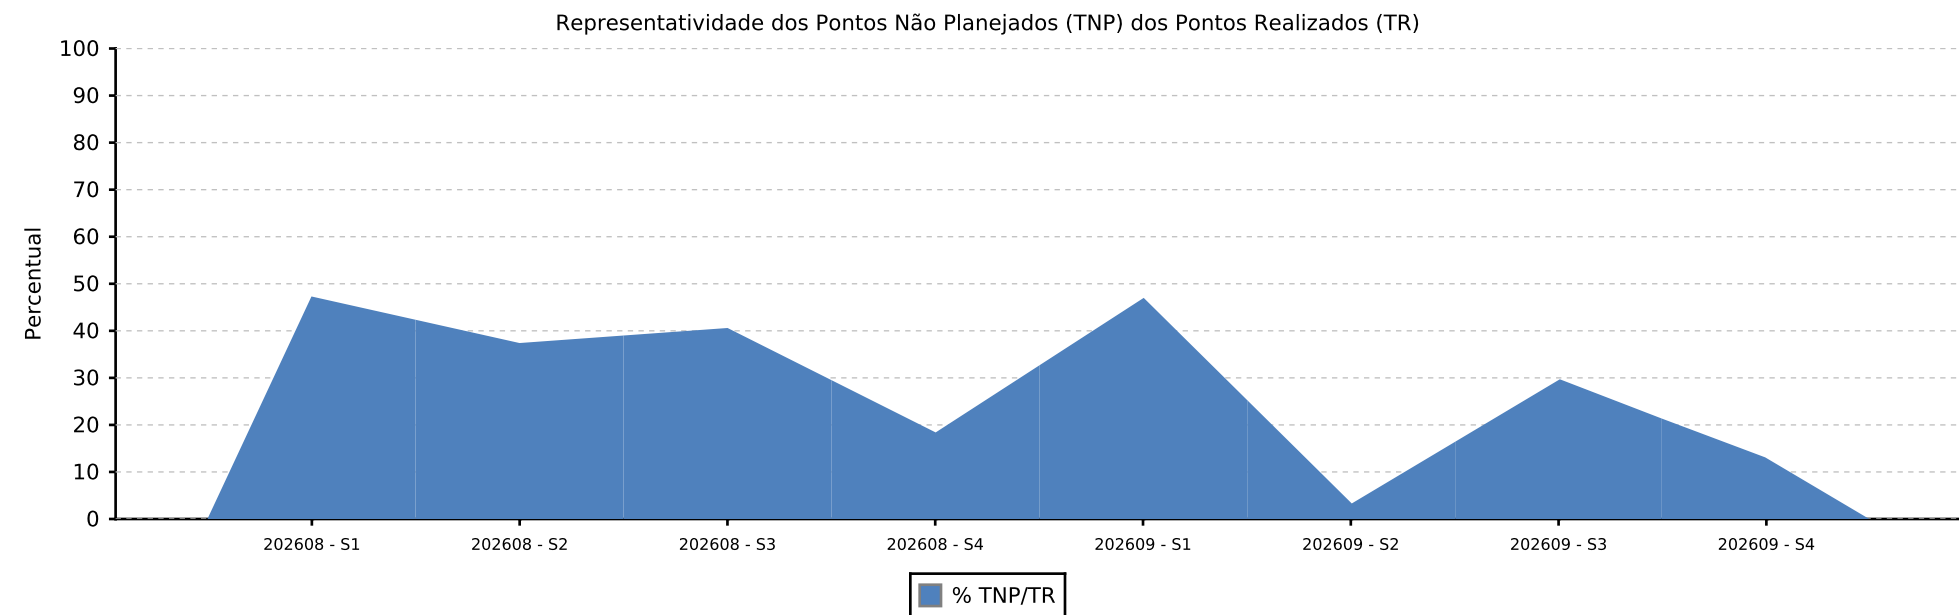

	202608				202609			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	37	45.5	69	62.5	24.5	62	27	42
TNP - Pontos Não Planejados	17.5	17	28	11.5	11.5	2	8	5.5
% TNP/TR	47,3	37,4	40,6	18,4	47,0	3,3	29,7	13,1

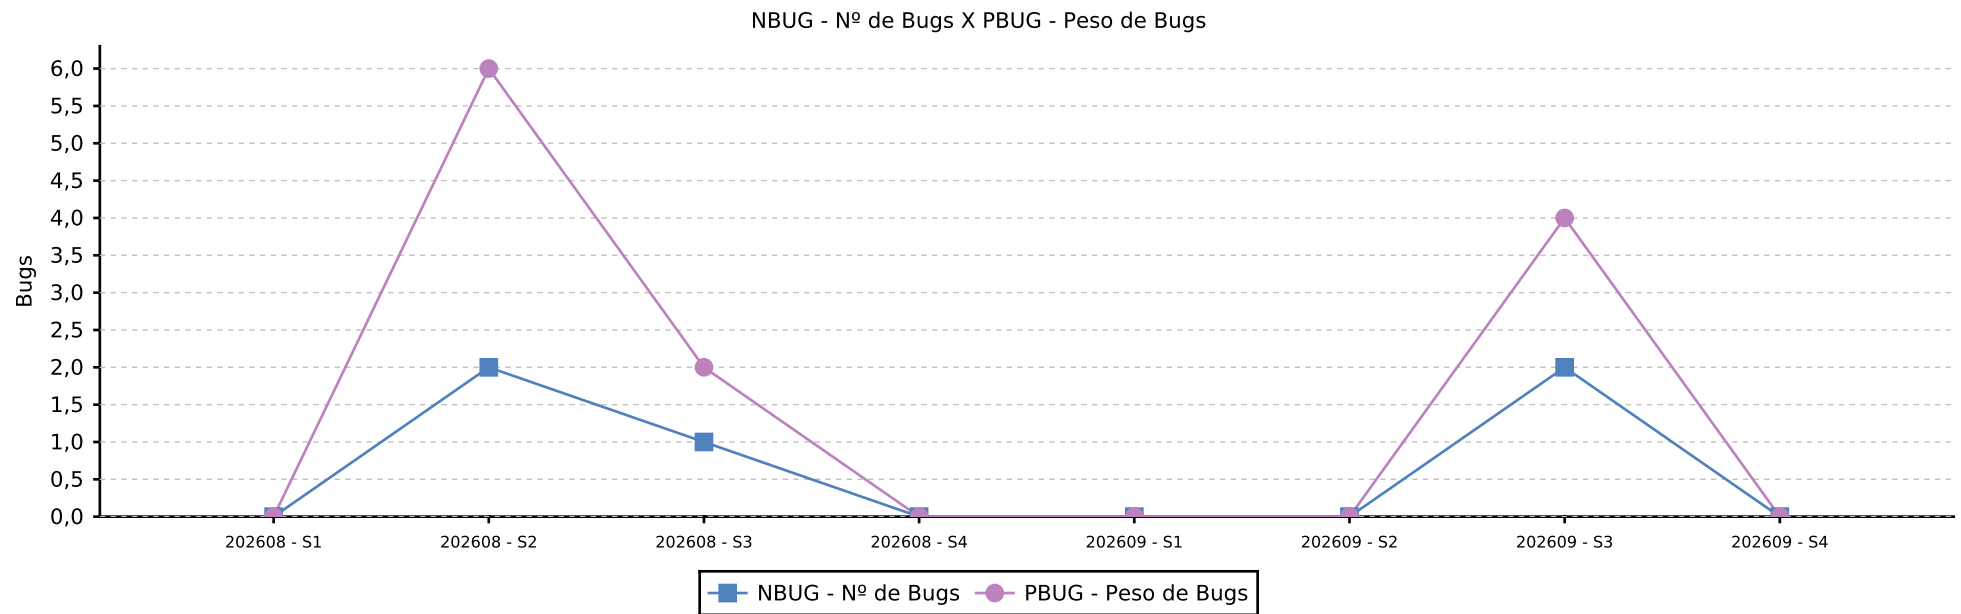

	202608				202609			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	2	1	0	0	0	2	0
PBUG - Peso de Bugs	0	6	2	0	0	0	4	0
Pontos Entregues	37	45.5	69	62.5	24.5	62	27	42
% PBUG / TR	0,00	13,19	2,90	0,00	0,00	0,00	14,82	0,00

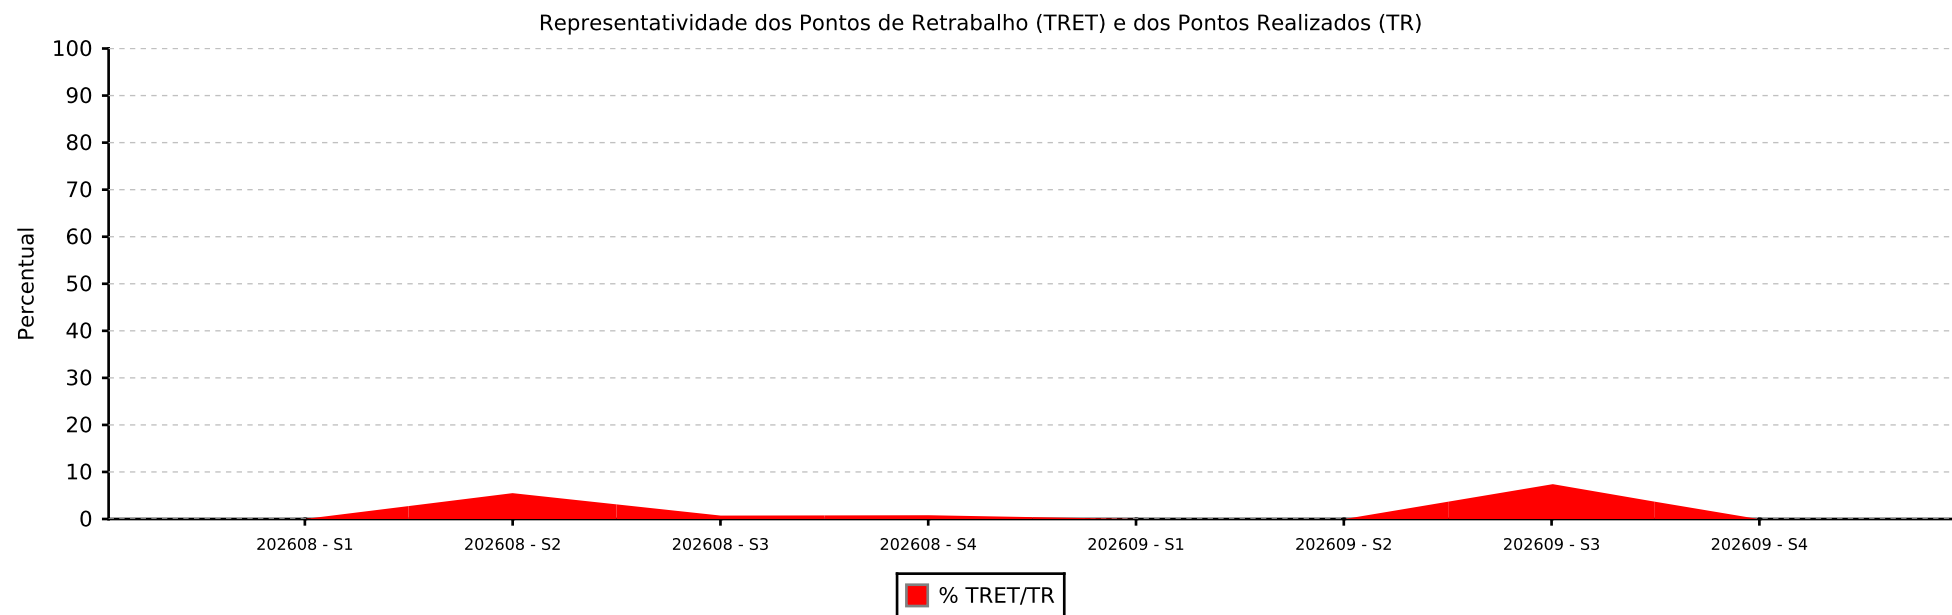


	202608				202609			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	37	45.5	69	62.5	24.5	62	27	42
TRET - Pontos de Retrabalho	0	2.5	0.5	0.5	0	0	2	0
% TRET/TR	0,0	5,5	0,7	0,8	0,0	0,0	7,4	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

[illegible]

Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Correção do Code Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Sizing	6	3,25	6	1,67	6	2,58	6	0	24	7,5	31,2 %	
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Férias	0	0	0	16	0	0	0	0	0	16	0,0 %	
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Geração de Atas	0,25	0,25	0,25	0,17	0,25	0	0,25	0	1	0,42	42,0 %	
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Organização sala / equipamento	0,62	0,62	0	0	0	0	0	0	0,62	0,62	100,0 %	
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Treinamento	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %	
Analise Retorno O.S.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0,23	0	0	0	0,23	0,0 %	
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Criacao de Ambiente de Desenv.	2,58	0,33	2,58	2,58	1,58	0,33	2,33	0	9,07	3,24	35,7 %	
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	0,25	0	1	0	0	0	0	0	1,25	0,0 %	
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Correcao de Erros Externo	0,25	0	0,25	0	0	0	0	0	0,5	0	0,0 %	
Auxilio ao Desenvolvimento	1	0,38	1	0,42	1	0	1	0	4	0,8	20,0 %	
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	
Total Geral		240	234,78	263,99	231,36	220	188,76	223,99	185,74	947,98	840,64	88,7 %


% de Horas por Atividade

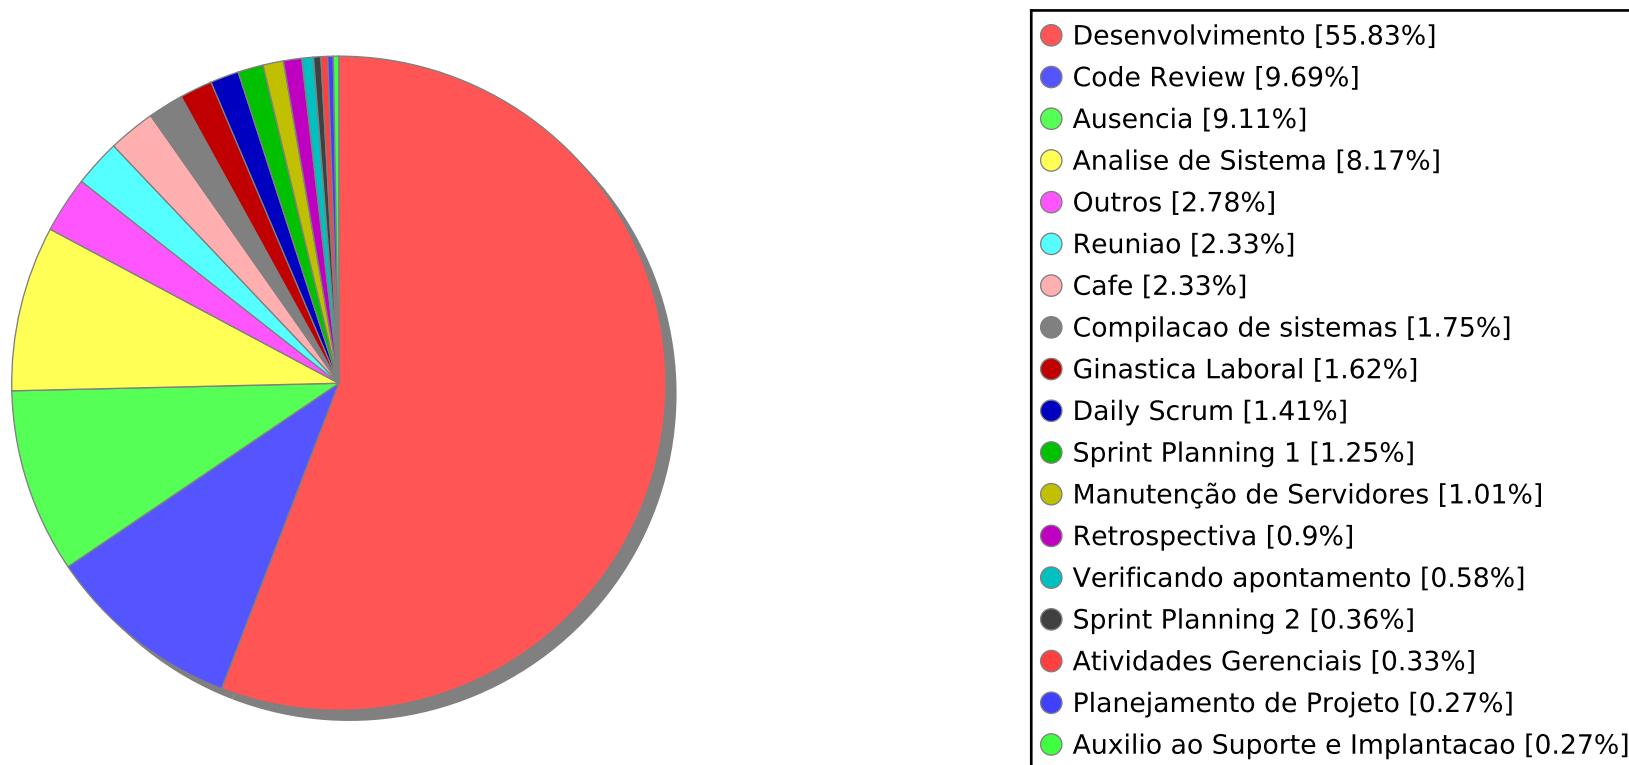

HORAS POR ÁREA DO CMMI


		Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Area CMMI		Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos		133,98	130,28	162,82	106,97	135,17	98,7	134,37	103,7	566,34	439,65	77,6 %
DIV - Diversos*		20,5	40,3	22,82	41,48	20,08	29,97	18,42	34,87	81,82	146,62	179,2 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto		39,35	28,23	33,83	39,73	29	34,8	29,9	22,28	132,08	125,04	94,7 %
REQM - Gestao de Requisitos		36,97	28,18	36,25	22,5	29,33	17,83	33,4	18,18	135,95	86,69	63,8 %
CM - Gerencia de Configuracao		5,5	4,88	5,5	2	4	4,35	4	3,25	19	14,48	76,2 %
PP - Planejamento de Projeto		0	0,5	0	0	0	0	1,75	0,5	1,75	1	57,1 %
PI - Integracao de Produto		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
	Total Geral	236,3	232,37	261,22	212,68	217,58	185,65	221,84	182,78	936,94	813,48	86,8 %

% de Horas por Área do CMMI

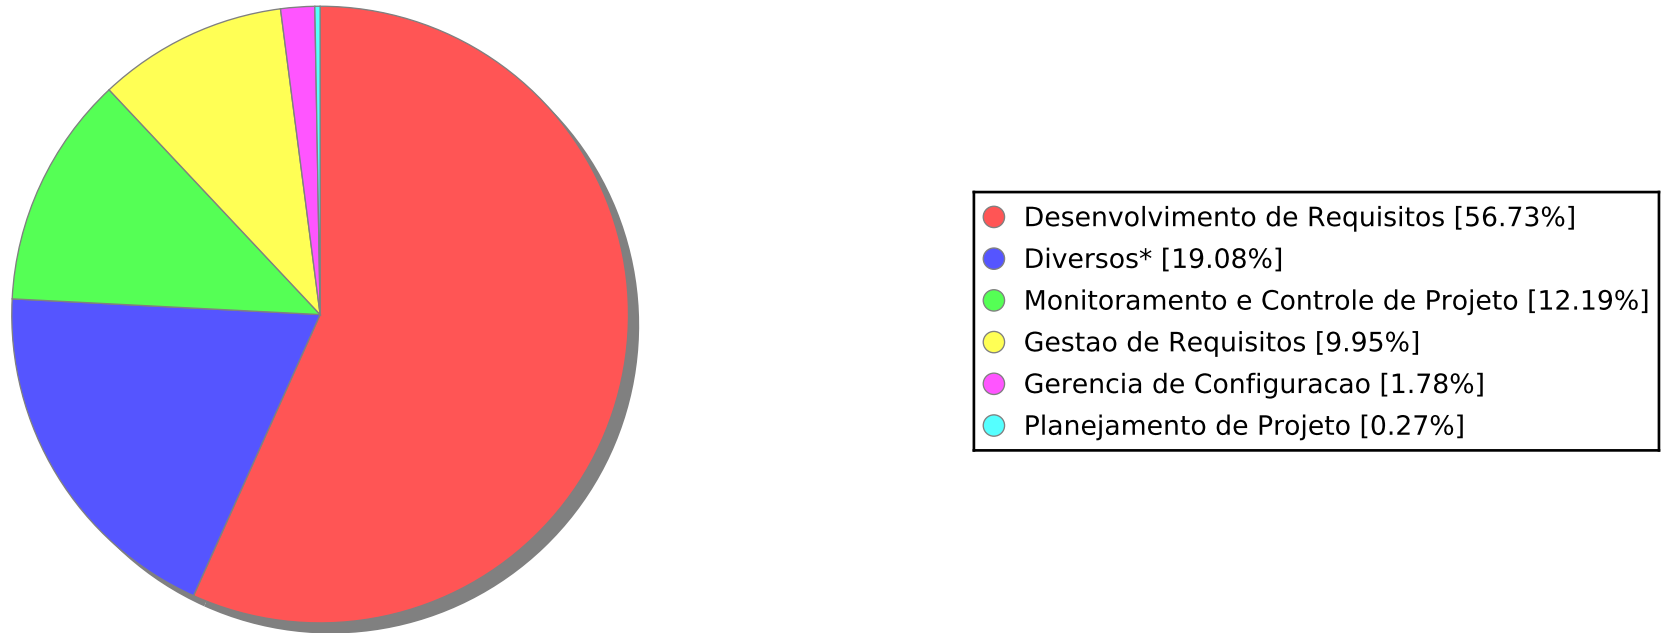


INDICADORES DO PROJETO


	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609
01. Horas planejadas de todas atividades	760h00m	880h00m	716h00m	840h00m	980h00m	1092h32m	1109h27m	948h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	772h50m	937h16m	746h03m	939h50m	1039h55m	1161h40m	1159h28m	840h38m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	562h08m	645h10m	527h37m	565h10m	663h54m	776h51m	749h32m	642h25m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	503h09m	563h33m	431h51m	569h05m	610h47m	677h36m	659h54m	483h43m
05. Pontos planejados para o projeto	171,0	4,0	160,8	4,0	205,0	248,0	230,0	195,0
06. Pontos planejados	228,5	293,0	111,0	221,5	203,0	183,0	219,5	203,5
07. Pontos entregues	155	182	135,5	177	190,5	204,5	214	155,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	137,50	136,00	85,00	113,50	135,00	132,50	140,00	128,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	17,50	46,00	50,50	63,50	55,50	72,00	74,00	27,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	2	3	3	5	8	4
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	49	25	42	33	47	52	41	39
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	22	46	43	55	61	72	75	29
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	1	1	1	2	3	2
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0	0	0,5	3,5	4	4	3,5	2
16. Produtividade planejada	0,407	0,455	0,211	0,392	0,306	0,236	0,293	0,317
17. Produtividade realizada	0,309	0,323	0,314	0,312	0,312	0,302	0,325	0,322
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	90,7	4550	84,3	4425	93	82,5	93,1	79,8
19. % Pontos NP / Pontos entregues	11,3	25,3	37,3	35,9	29,2	35,3	34,6	17,4

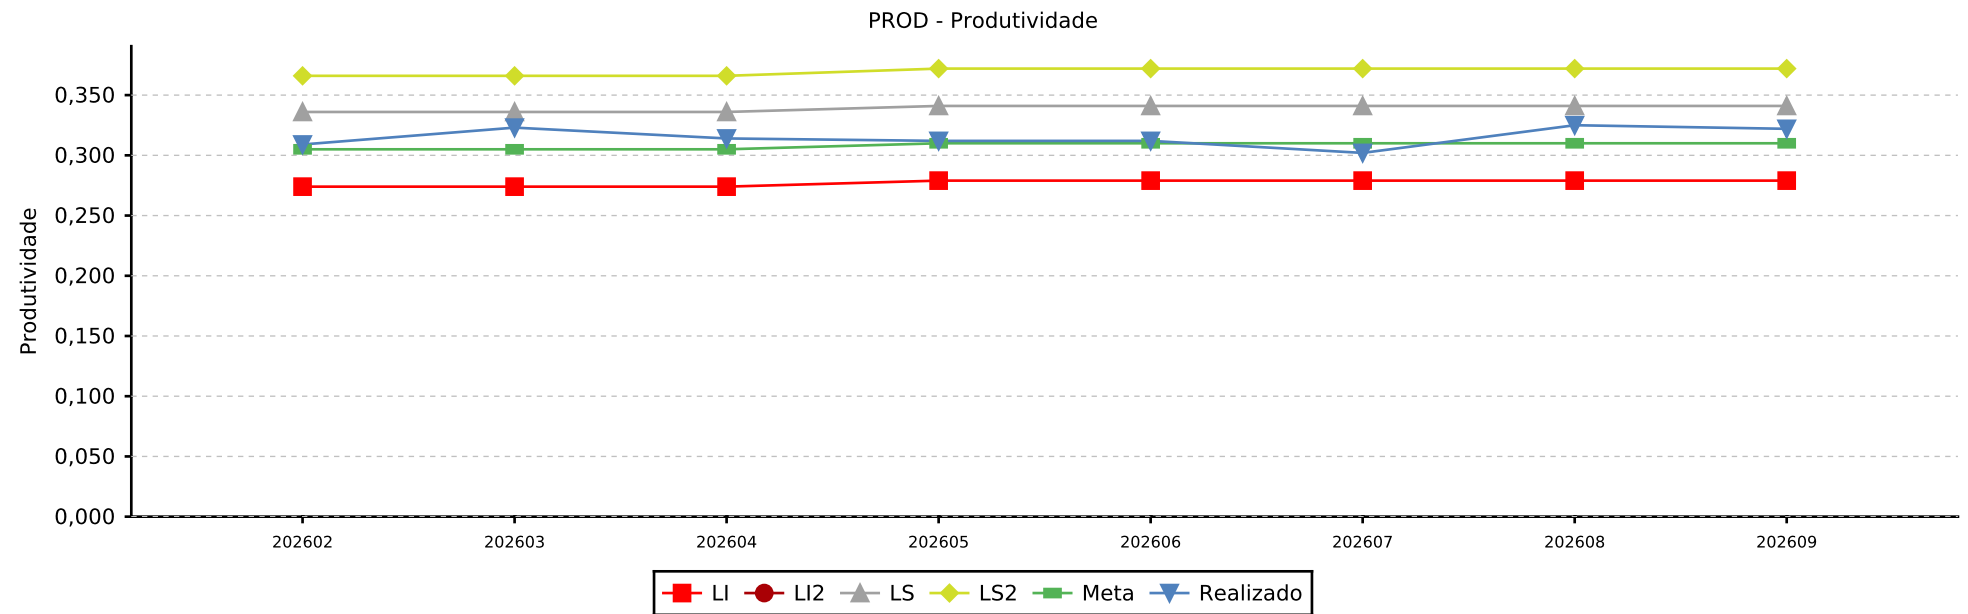


	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609
Realizado	0,309	0,323	0,314	0,312	0,312	0,302	0,325	0,322
Meta	0,305	0,305	0,305	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310
LS2	0,366	0,366	0,366	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372
LS	0,336	0,336	0,336	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341
LI2								
LI	0,274	0,274	0,274	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279

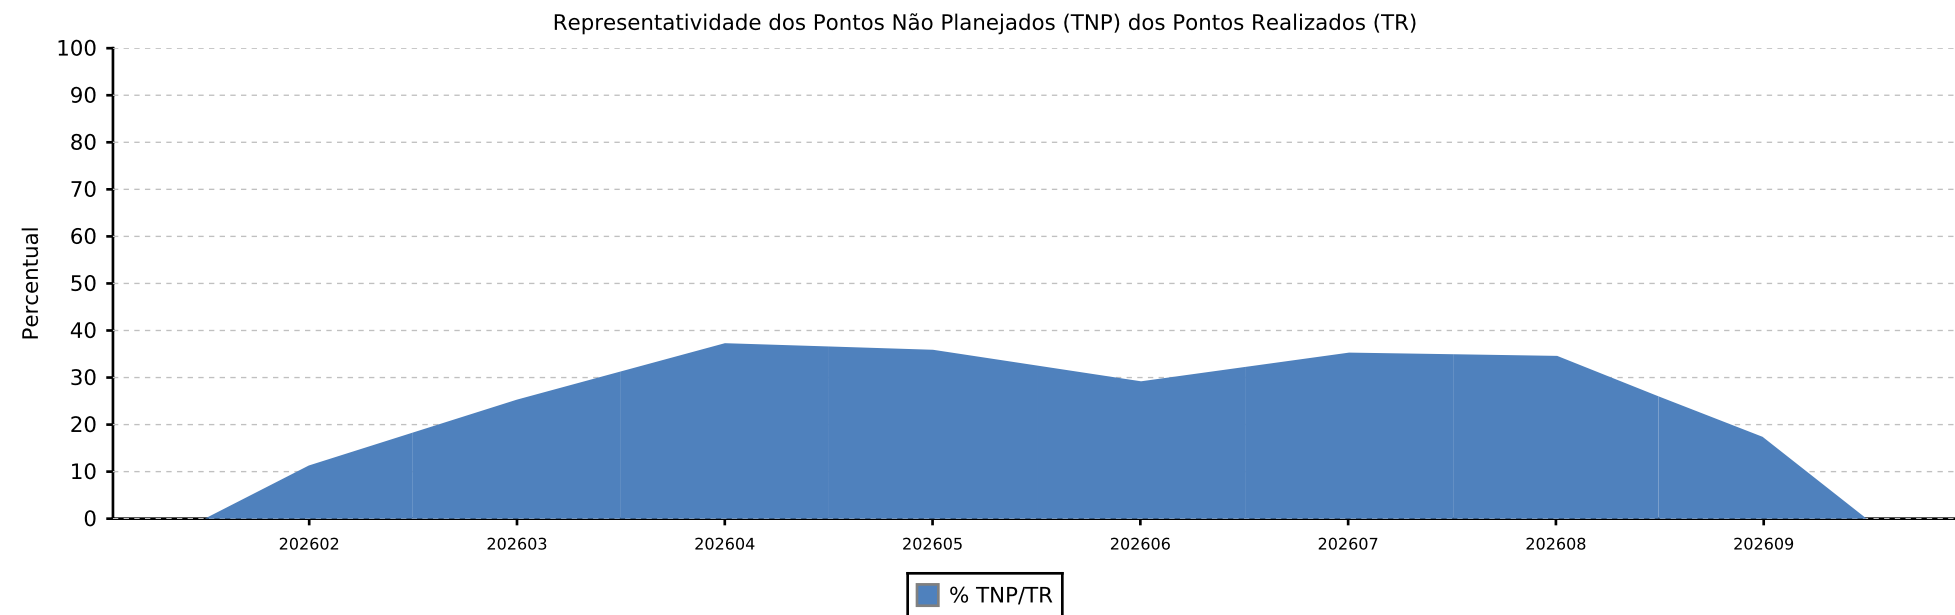


	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609
TR - Pontos Realizados	155	182	135.5	177	190.5	204.5	214	155.5
TNP - Pontos Não Planejados	17.5	46	50.5	63.5	55.5	72	74	27
% TNP/TR	11,3	25,3	37,3	35,9	29,2	35,3	34,6	17,4

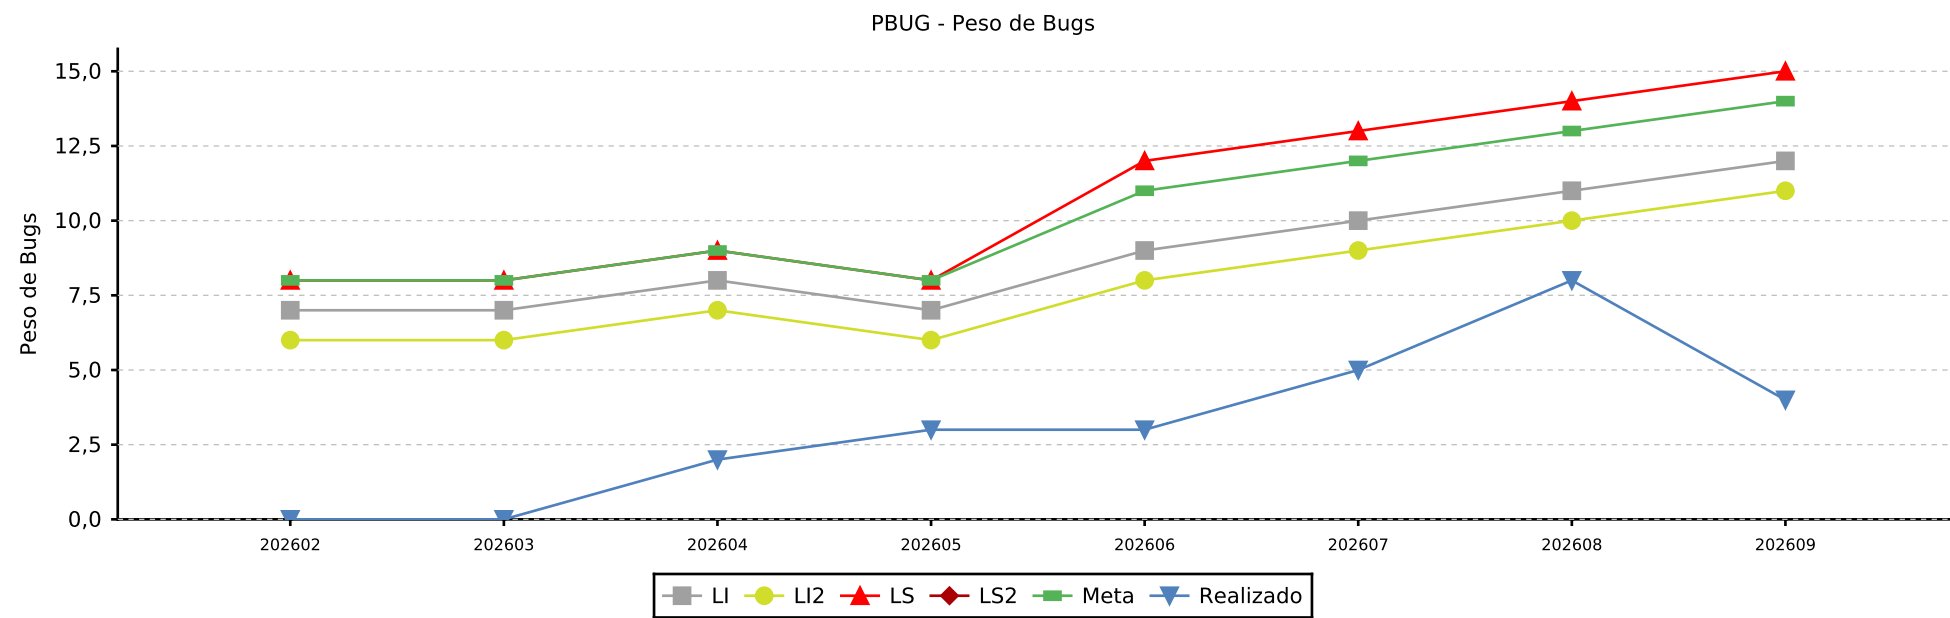


	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609
Realizado	0	0	2	3	3	5	8	4
Meta	8	8	9	8	11	12	13	14
LS2								
LS	8	8	9	8	12	13	14	15
LI2	6	6	7	6	8	9	10	11
LI	7	7	8	7	9	10	11	12
Pontos Entregues	155	182	135.5	177	190.5	204.5	214	155.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	1,48	1,70	1,58	2,45	3,74	2,58

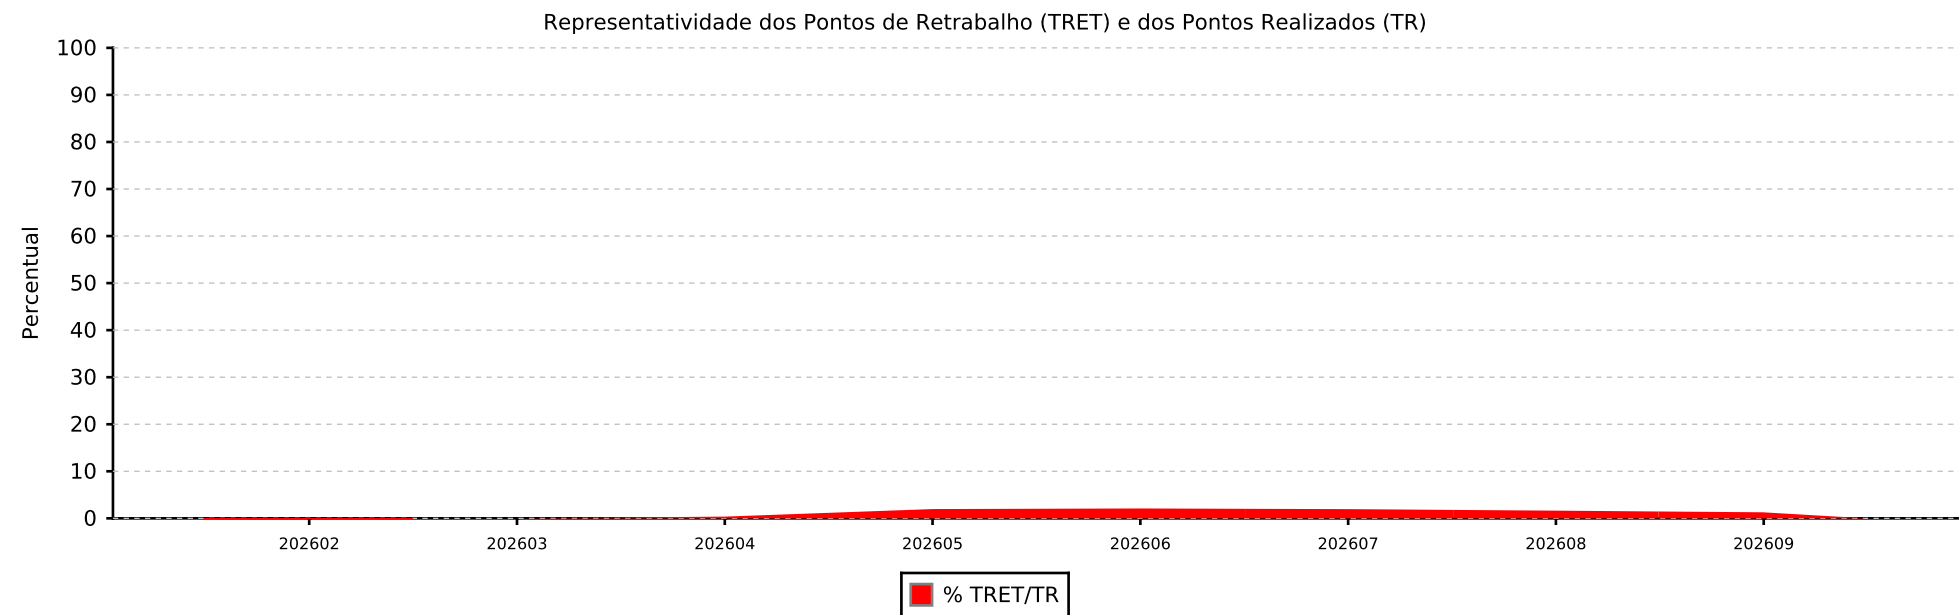


	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609
TR - Pontos Realizados	155	182	135.5	177	190.5	204.5	214	155.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0.5	3.5	4	4	3.5	2
% TRET/TR	0,0	0,0	0,4	2,0	2,1	2,0	1,6	1,3

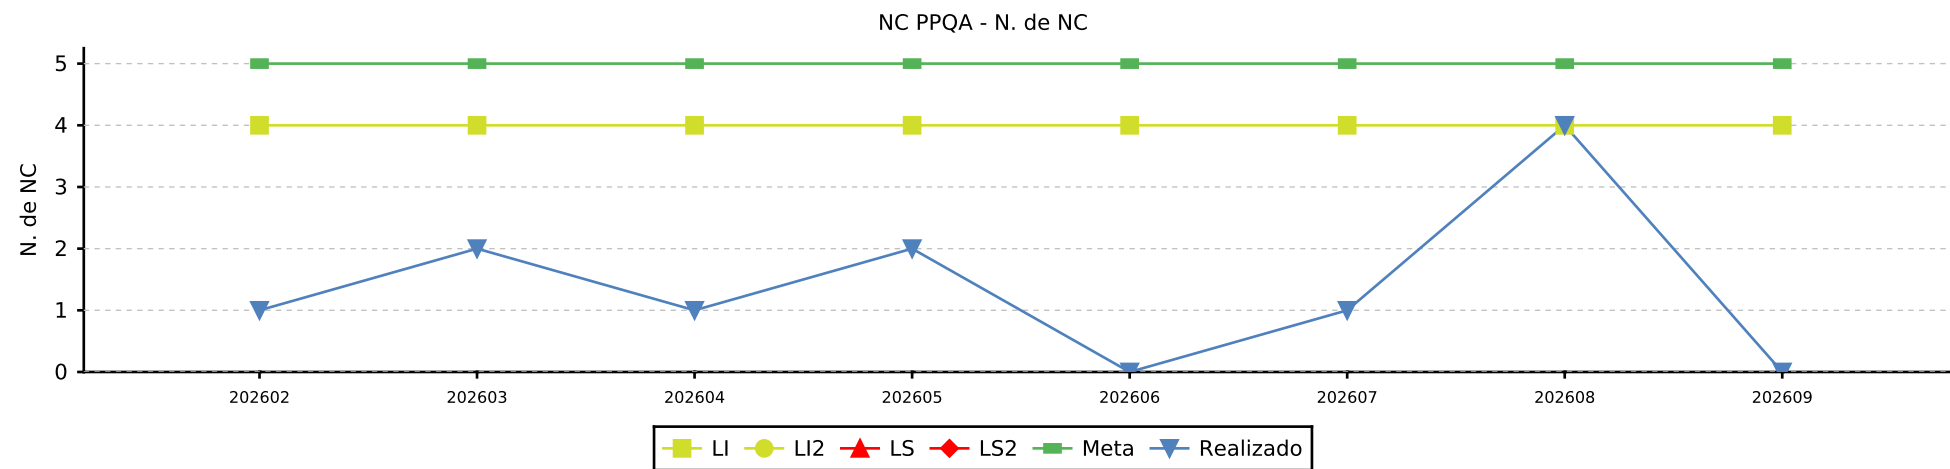

	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609
Realizado	1	2	1	2	0	1	4	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

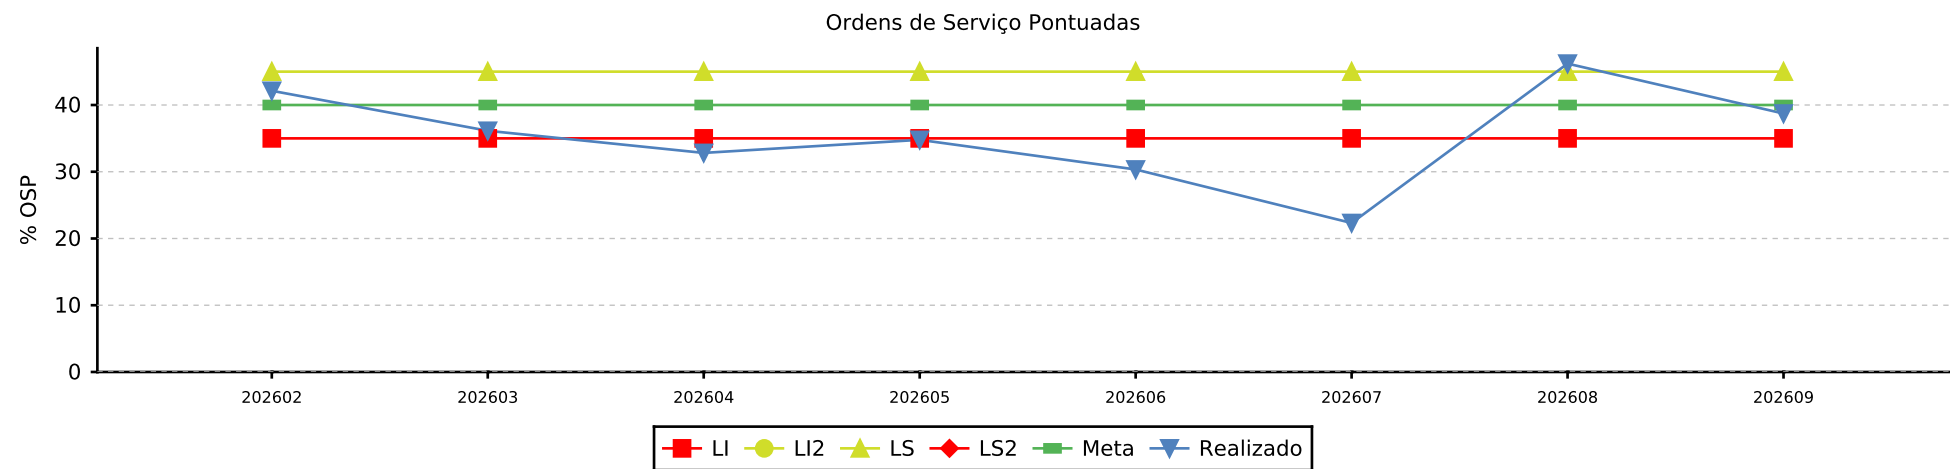

	202602	202603	202604	202605	202606	202607	202608	202609
Realizado	42.13	36.14	32.82	34.78	30.34	22.32	46.2	38.72
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

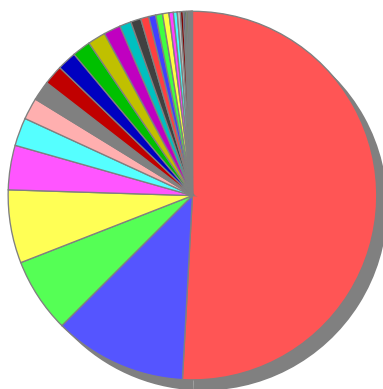

% de Horas por Atividade

● Desenvolvimento [50.87%]	● Organização sala / equipamento [0.07%]
● Code Review [11.67%]	● Geração de Atas [0.05%]
● Analise de Sistema [6.54%]	● Analise de O.S [0.03%]
● Ausencia [6.42%]	
● Reuniao [3.9%]	
● Cafe [2.47%]	
● Férias [1.9%]	
● Daily Scrum [1.72%]	
● Compilacao de sistemas [1.72%]	
● Ginastica Laboral [1.69%]	
● Outros [1.61%]	
● Sprint Planning 1 [1.57%]	
● Retrospectiva [1.49%]	
● Auxilio ao Suporte e Implantacao [1.01%]	
● Sizing [0.89%]	
● Preparando ambiente [0.71%]	
● Verificando apontamento [0.62%]	
● Sprint Planning 2 [0.6%]	
● Correção de Erros Interno [0.56%]	
● Criacao de Ambiente de Desenv. [0.39%]	
● Atividades Gerenciais [0.34%]	
● Manutenção de Servidores [0.28%]	
● Clean Code [0.25%]	
● Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.15%]	
● Atestado [0.14%]	
● Documentação [0.14%]	
● Planejamento de Projeto [0.12%]	
● Auxilio ao Desenvolvimento [0.1%]	

% de Horas por Área do CMMI

