

Filtros do Relatório: Equipe: 15 | Projeto: 940 | Sprint: 4

INDICADORES DA SPRINT


	202610				202611			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	180h00m	220h00m	220h00m	220h00m	176h00m	180h00m	220h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	191h12m	241h54m	238h31m	249h28m	170h04m	189h31m	236h57m	234h42m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	110h50m	138h14m	144h28m	144h21m	109h35m	106h14m	144h43m	144h36m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	96h48m	146h05m	132h47m	137h13m	80h00m	99h52m	125h50m	123h07m
05. Pontos planejados	41,0	41,5	41,5	62,0	31,0	58,5	51,5	26,0
06. Pontos entregues	33	43,5	29	58	24	36,5	42	37,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	21,00	18,50	26,50	53,00	17,00	35,50	30,00	19,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	12,00	25,00	2,50	5,00	7,00	1,00	12,00	18,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	4	2	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	10	8	8	15	13	11	9	7
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	12	15	4	1	5	2	11	6
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	2	1	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0,5	1	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,370	0,301	0,288	0,430	0,283	0,551	0,356	0,180
16. Produtividade realizada	0,341	0,298	0,219	0,423	0,300	0,366	0,334	0,305
17. % Pontos NP / Pontos entregues	36,4	57,5	8,7	8,7	29,2	2,8	28,6	49,4

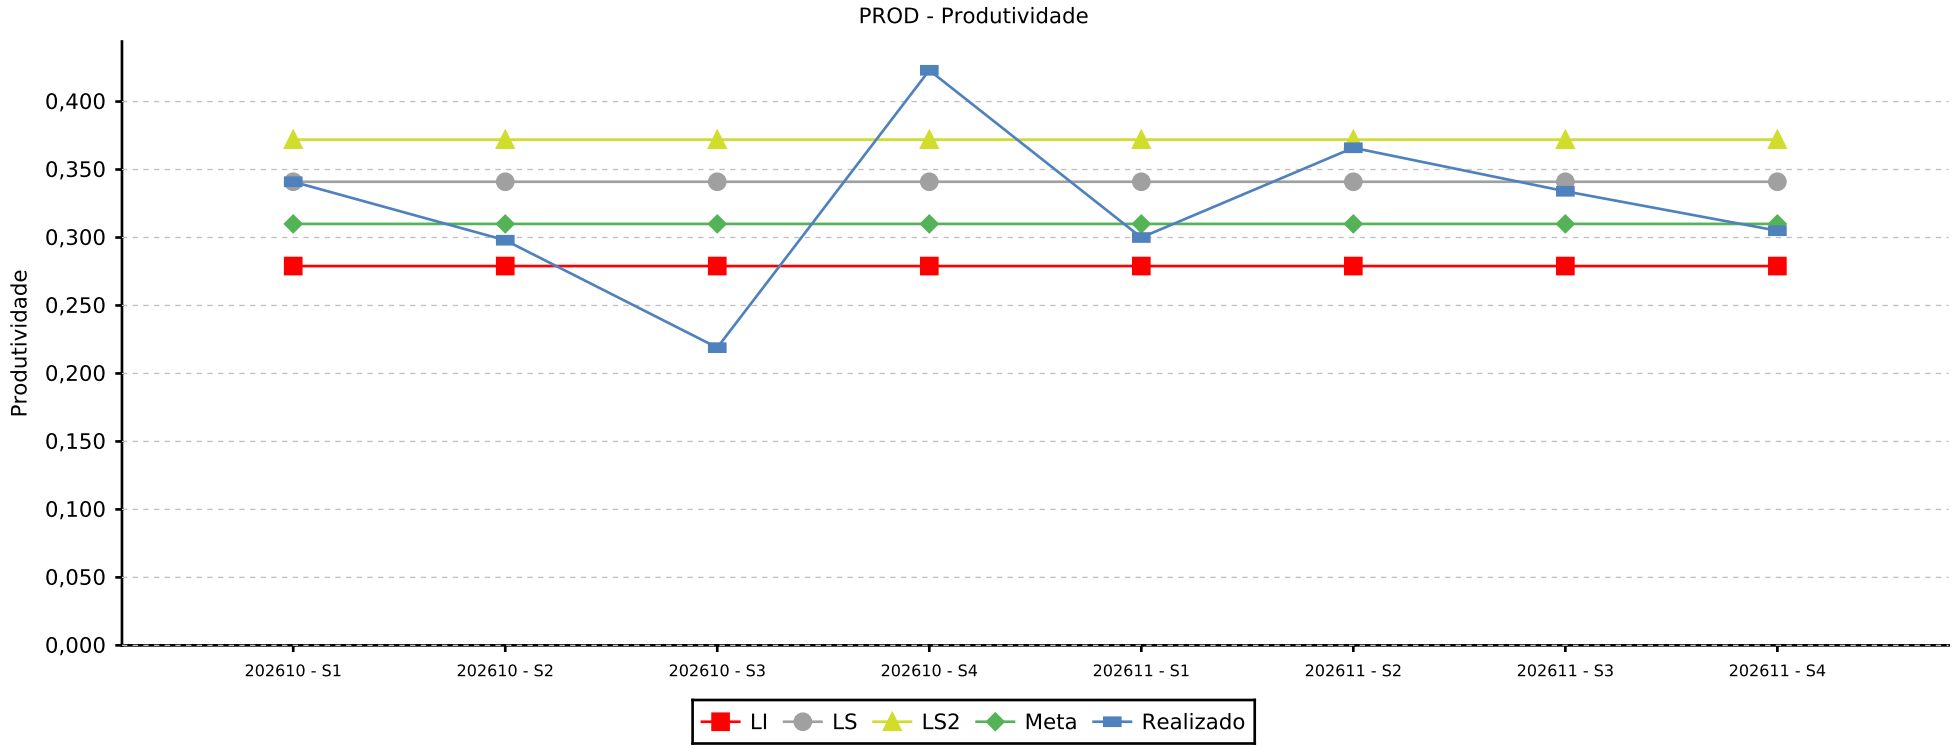


	202610				202611			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,341	0,298	0,219	0,423	0,300	0,366	0,334	0,305
Meta	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310
LS2	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372
LS	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341
LI	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279

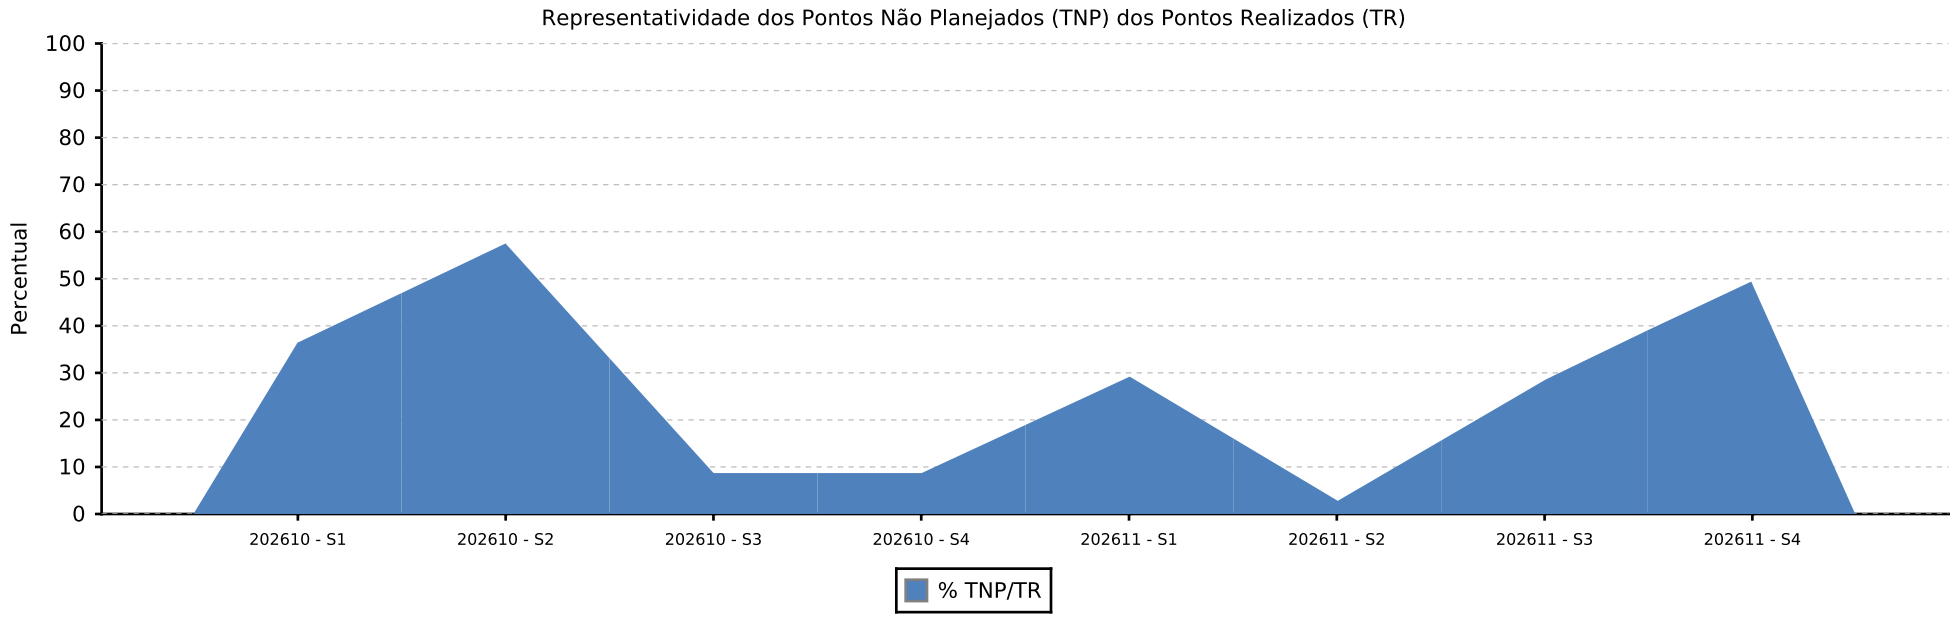

	202610				202611			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	33	43.5	29	58	24	36.5	42	37.5
TNP - Pontos Não Planejados	12	25	2.5	5	7	1	12	18.5
% TNP/TR	36,4	57,5	8,7	8,7	29,2	2,8	28,6	49,4

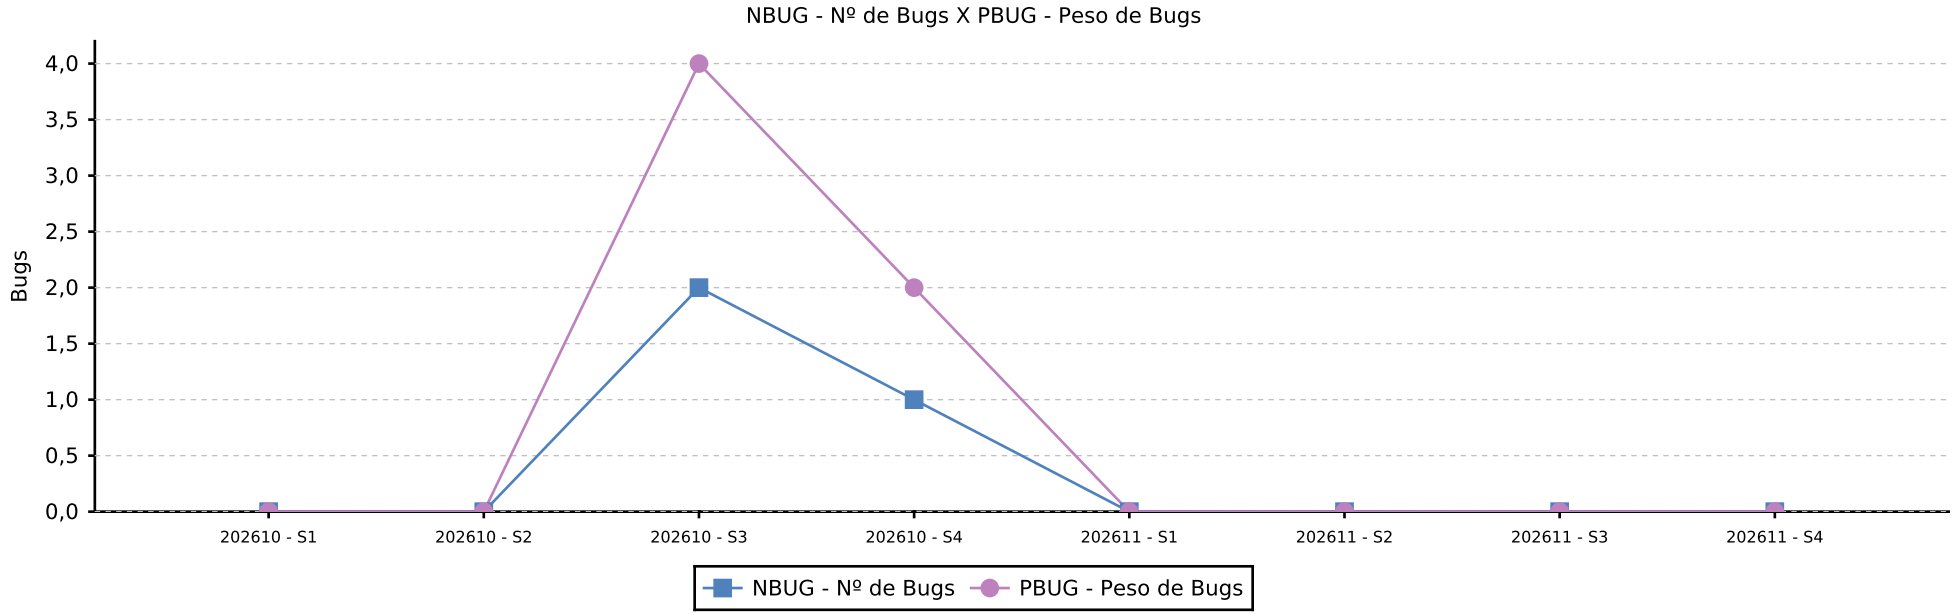

	202610				202611			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	2	1	0	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	4	2	0	0	0	0
Pontos Entregues	33	43.5	29	58	24	36.5	42	37.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	13,80	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00

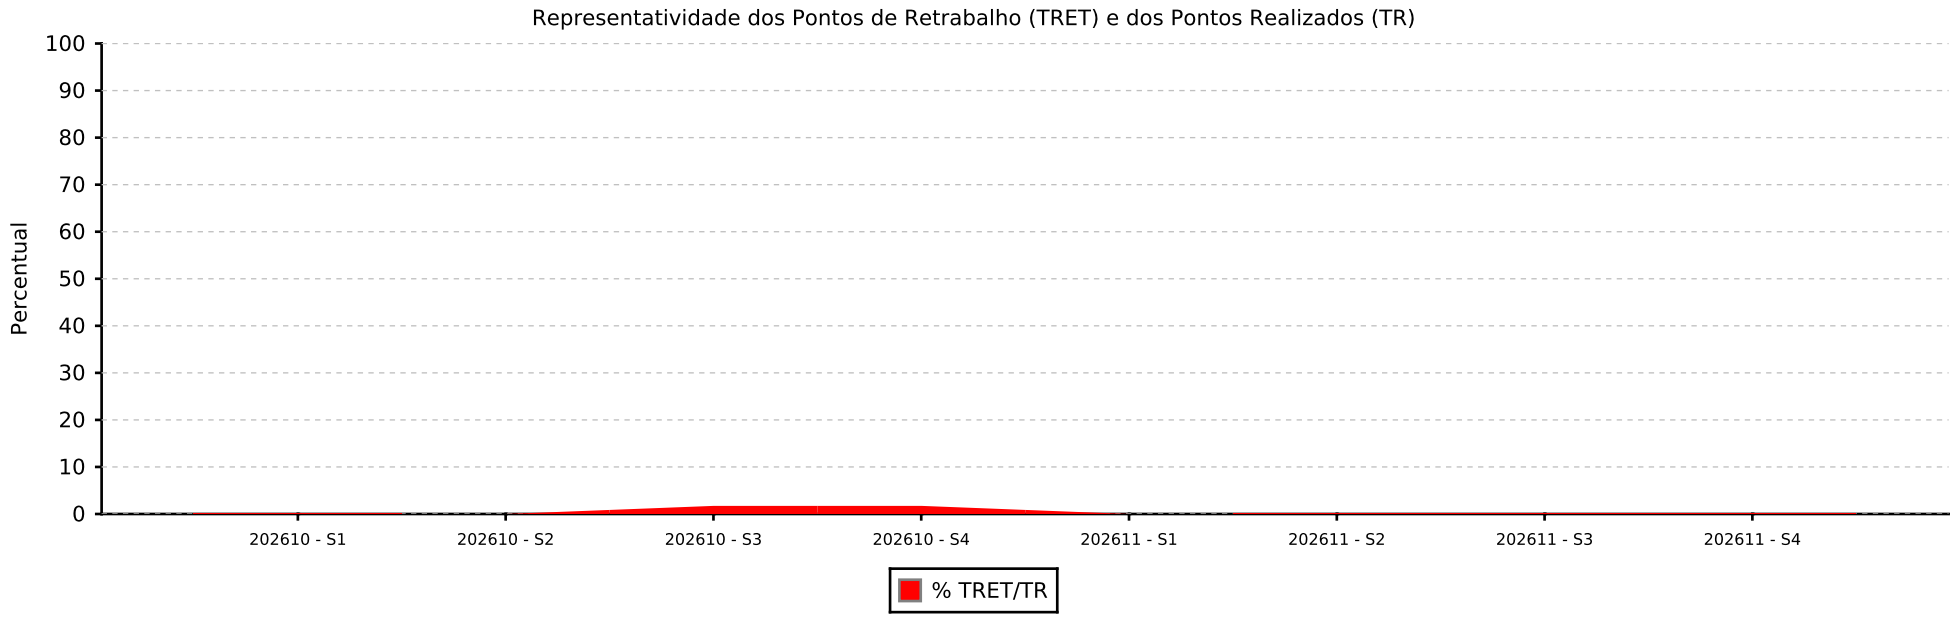


	202610				202611			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	33	43.5	29	58	24	36.5	42	37.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0.5	1	0	0	0	0
% TRET/TR	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
Desenvolvimento	92,42	68,7	83,82	81,62	121,88	100,72	119,7	101,2	417,82	352,24	84,3 %
Code Review	18	23,5	21	25,27	21	38,47	21	30,63	81	117,87	145,5 %
Outros	0	6,8	0	16,68	0	4,83	0	17,68	0	45,99	0,0 %
Analise de Sistema	17	10,92	21,5	11,07	18,12	18,28	20,15	15,92	76,77	56,19	73,2 %
Ausencia	0,33	24,67	1,98	12,67	2	22,93	0,33	15,6	4,64	75,87	1.635,1
Manutenção de Servidores	0	0	0	2,98	0	8,95	0	8,63	0	20,56	0,0 %
Daily Scrum	5	2,17	4,83	4,58	6	7,42	5,82	6,18	21,65	20,35	94,0 %
Compilacao de sistemas	5,5	6,93	5,5	0,7	5,5	0,9	5,5	6,1	22	14,63	66,5 %
Cafe	4,75	3,25	5,5	4,25	6,25	5,83	6,25	5,92	22,75	19,25	84,6 %
Atestado	0	0	0	1,8	0	0	0	4	0	5,8	0,0 %
Ginastica Laboral	3,33	2,5	3,5	3,43	4,17	3,57	4,17	3,92	15,17	13,42	88,5 %
Retrospectiva	3,67	2,33	4,83	1,25	4,5	2	4,58	3,33	17,58	8,91	50,7 %
Reuniao	4	5	4,25	0,83	4,25	3,12	4,25	3,25	16,75	12,2	72,8 %
Documentação	0	0	0	0	0	1,17	0	2,67	0	3,84	0,0 %
Verificando apontamento	2,25	1,52	1,95	1,03	2,42	1,98	2,17	1,82	8,79	6,35	72,2 %
Sprint Planning 1	3,67	1,33	5	7,5	4,75	2,67	4,83	1,75	18,25	13,25	72,6 %
Sizing	6	1,67	3	0	6	1,33	6	1,58	21	4,58	21,8 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	0,42	1	0	1	2,12	1	1,33	4	3,87	96,8 %
Auxilio ao Desenvolvimento	0,5	0	0,5	0,27	0,5	0,5	0,5	0,77	2	1,54	77,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0,75	0	0,75	0,0 %
Clean Code	2	4,8	3	0	3	0	3	0,5	11	5,3	48,2 %
Sprint Planning 2	1,83	0,67	2,42	1,67	2,25	1	3,08	0,42	9,58	3,76	39,2 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,25	0,33	1,25	0,33	26,4 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0	1,17	0	0,17	0	0	0	0,25	0	1,59	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0	0	2	0	0	0	0,17	0	2,17	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0,25	25,0 %
Atividades Gerenciais	1	1,48	1	0	1	0	1	0	4	1,48	37,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %

Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0,25	0	0,25	4,38	0,25	2,5	0,25	0	1	6,88	688,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	3,42	0	1,17	0	0	0	4,59	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	2,25	0	2,58	0	2,58	0,75	2,58	0	9,99	0,75	7,5 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,25	0	1,58	0	1,58	0	1,58	0	4,99	0	0,0 %
Particular	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0	2	0	0,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	1,95	0	2,17	0	0	0	4,12	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	0,25	0	0,25	0	0,25	2,58	0,25	0	1	2,58	258,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção do Code Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	176	170,08	179,99	189,52	220	236,96	219,99	234,7	795,98	831,26	104,4 %

% de Horas por Atividade

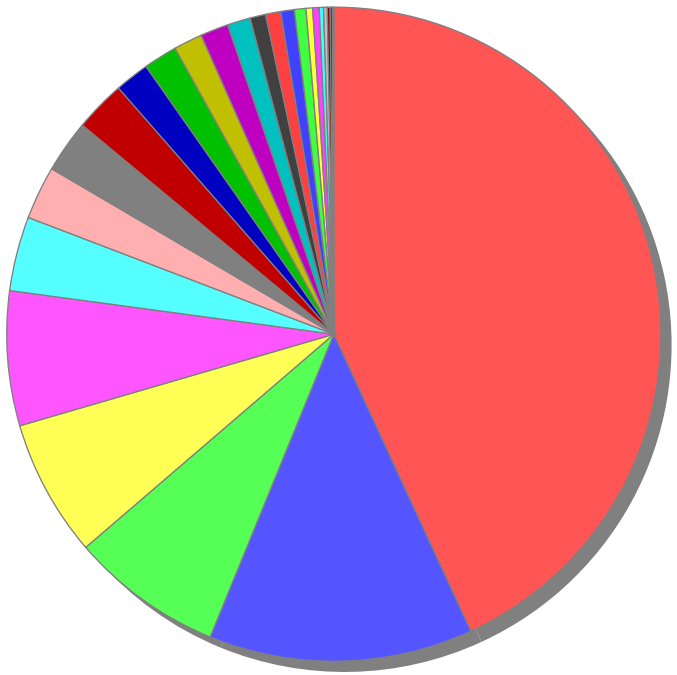


- Desenvolvimento [43.12%]
- Code Review [13.05%]
- Outros [7.53%]
- Analise de Sistema [6.78%]
- Ausencia [6.65%]
- Manutenção de Servidores [3.68%]
- Daily Scrum [2.63%]
- Compilacao de sistemas [2.6%]
- Cafe [2.52%]
- Atestado [1.7%]
- Ginastica Laboral [1.67%]
- Retrospectiva [1.42%]
- Reuniao [1.38%]
- Documentação [1.14%]
- Verificando apontamento [0.78%]
- Sprint Planning 1 [0.75%]
- Sizing [0.67%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.57%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.33%]
- Analise de O.S [0.32%]
- Clean Code [0.21%]
- Sprint Planning 2 [0.18%]
- Planejamento de Projeto [0.14%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.11%]
- Analise Retorno O.S. [0.07%]

HORAS POR ÁREA DO CMMI


	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Area CMMI	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos	97,67	74,67	91,73	82,05	129,8	104,55	127,62	102,72	446,82	363,99	81,5 %
DIV - Diversos*	14,92	44,12	17,73	37,87	19,17	42,4	17,5	47,7	69,32	172,09	248,3 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	26,67	28	30,67	31,1	31,5	47,88	31,4	40,15	120,24	147,13	122,4 %
REQM - Gestao de Requisitos	28,5	14,58	31,92	24,18	31,12	25,45	34,07	19,83	125,61	84,04	66,9 %
CM - Gerencia de Configuracao	5,5	6,93	5,5	0,7	5,5	0,9	5,5	6,1	22	14,63	66,5 %
PP - Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,25	0,33	1,25	0,33	26,4 %
OT - Treinamento na Organizacao	0	0	0	3,42	0	1,17	0	0	0	4,59	0,0 %
PI - Integracao de Produto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	173,26	168,3	177,55	179,32	217,09	222,35	217,34	216,83	785,24	786,8	100,2 %

% de Horas por Área do CMMI

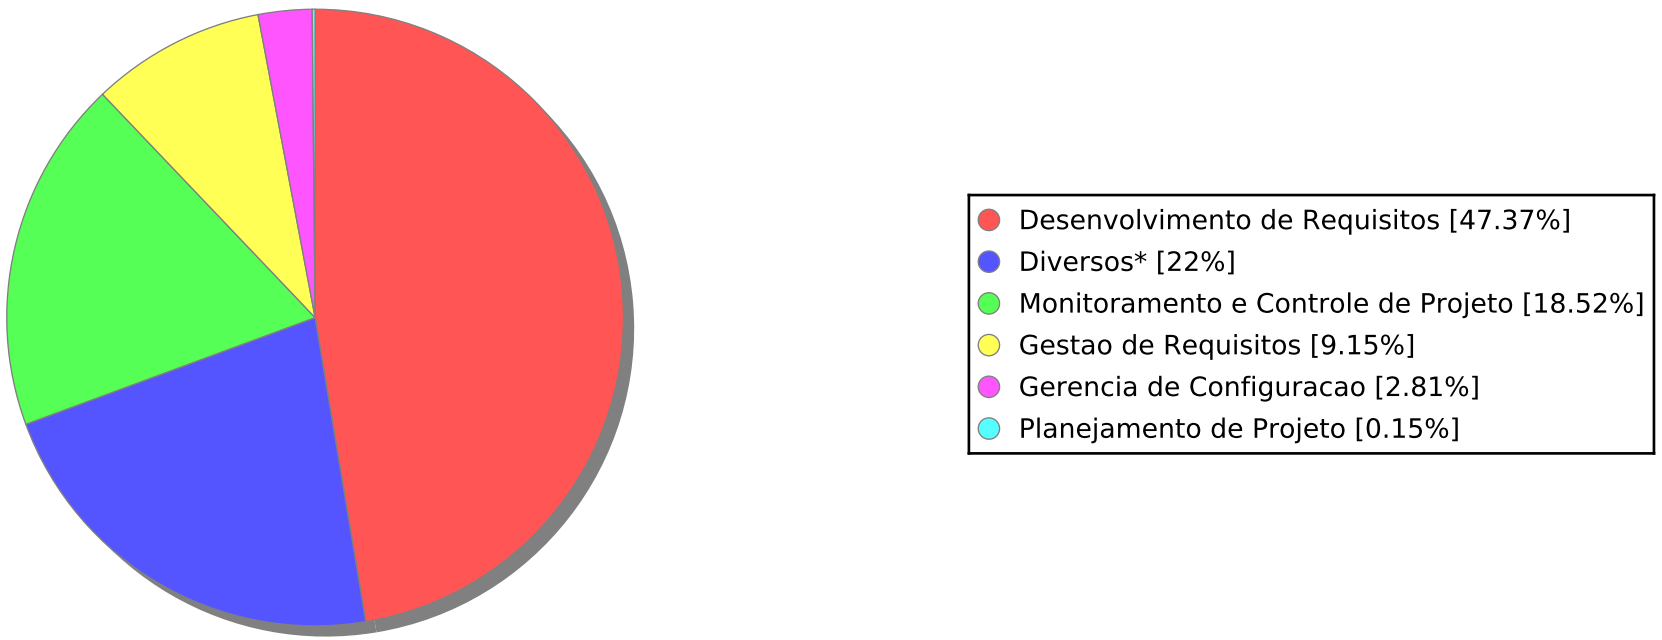


INDICADORES DO PROJETO


	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610	202611
01. Horas planejadas de todas atividades	716h00m	840h00m	980h00m	1092h32m	1109h27m	948h00m	840h00m	796h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	746h03m	939h50m	1039h55m	1161h40m	1159h28m	840h38m	921h05m	831h14m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	527h37m	565h10m	663h54m	776h51m	749h32m	642h25m	537h53m	505h08m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	431h51m	569h05m	610h47m	677h36m	659h54m	483h43m	512h53m	428h49m
05. Pontos planejados para o projeto	160,8	4,0	205,0	248,0	230,0	195,0	164,0	167,0
06. Pontos planejados	111,0	221,5	203,0	183,0	219,5	203,5	186,0	167,0
07. Pontos entregues	135,5	177	190,5	204,5	213,5	155,5	163,5	140
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	85,00	113,50	135,00	132,50	140,00	128,50	119,00	101,50
09. Pontos entregues (apenas NP)	50,50	63,50	55,50	72,00	73,50	27,00	44,50	38,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	2	3	3	5	8	4	6	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	42	33	47	52	41	39	41	40
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	43	55	61	72	74	29	32	24
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	1	1	1	2	3	2	3	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0,5	3,5	4	4	3,5	2	1,5	0
16. Produtividade planejada	0,211	0,392	0,306	0,236	0,293	0,317	0,346	0,331
17. Produtividade realizada	0,314	0,312	0,312	0,302	0,324	0,322	0,319	0,327
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	84,3	4425	93	82,5	92,9	79,8	99,7	83,9
19. % Pontos NP / Pontos entregues	37,3	35,9	29,2	35,3	34,5	17,4	27,3	27,5

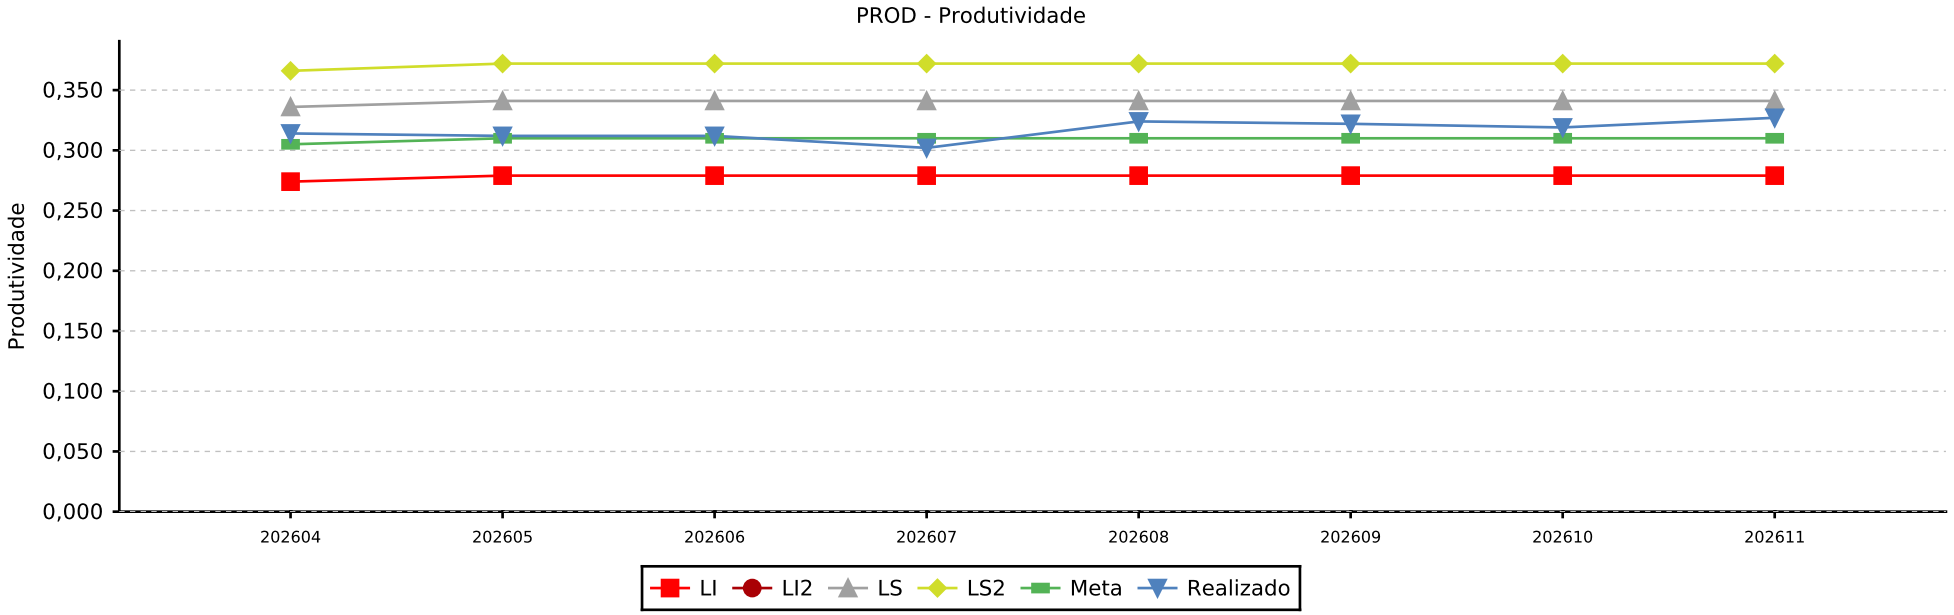


	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610	202611
Realizado	0,314	0,312	0,312	0,302	0,324	0,322	0,319	0,327
Meta	0,305	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310
LS2	0,366	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372	0,372
LS	0,336	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341	0,341
LI2								
LI	0,274	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279	0,279

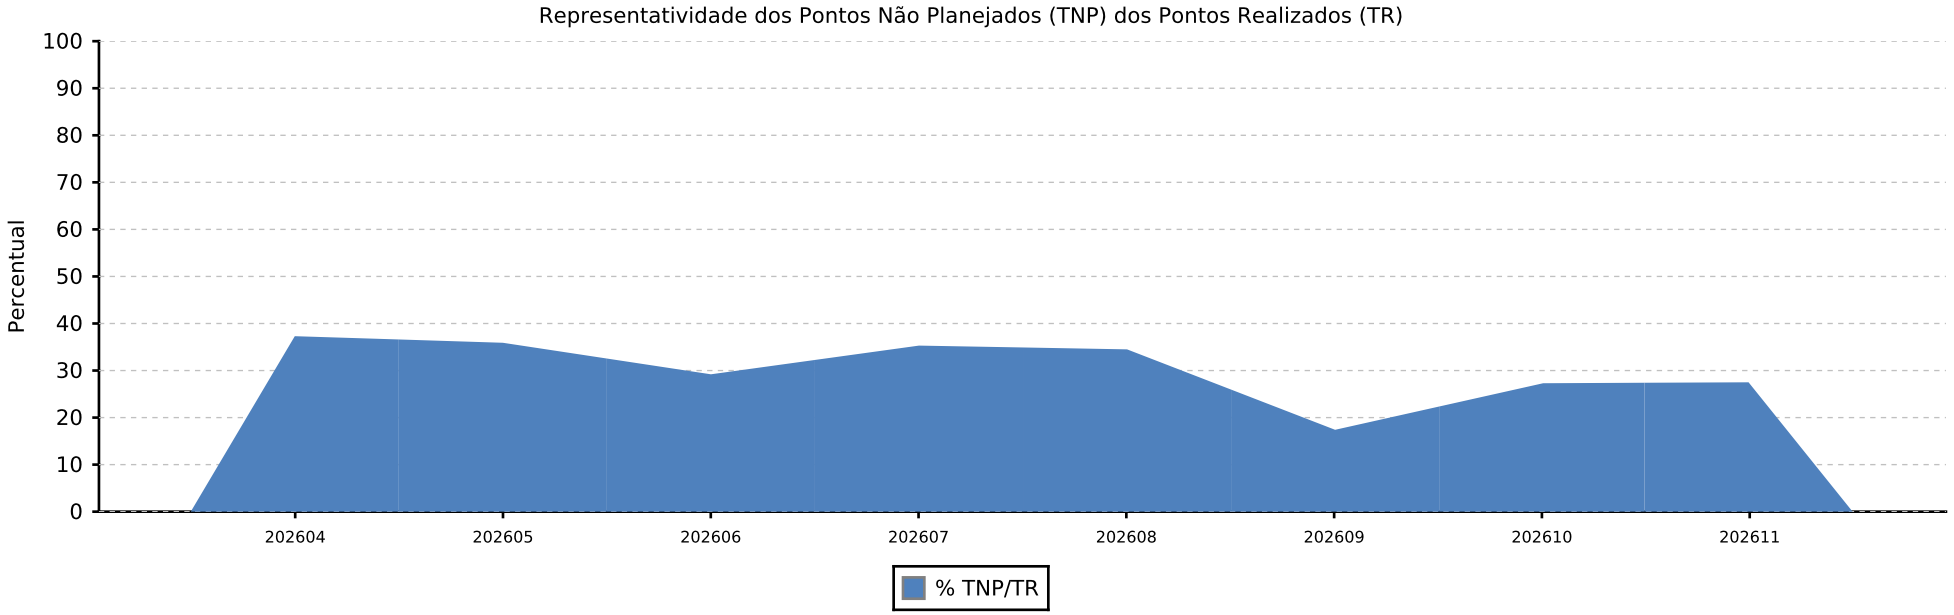


	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610	202611
TR - Pontos Realizados	135.5	177	190.5	204.5	213.5	155.5	163.5	140
TNP - Pontos Não Planejados	50.5	63.5	55.5	72	73.5	27	44.5	38.5
% TNP/TR	37,3	35,9	29,2	35,3	34,5	17,4	27,3	27,5

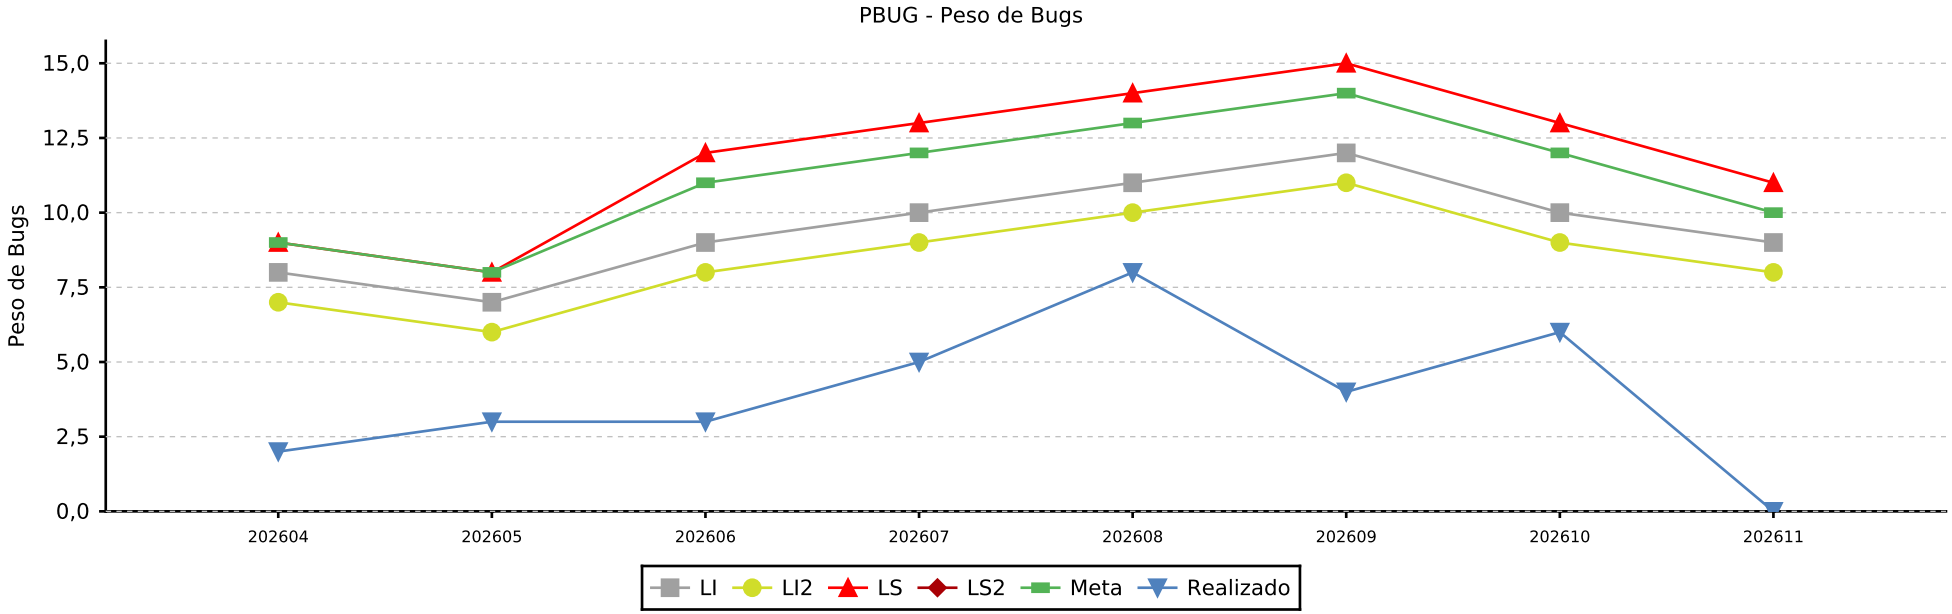


	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610	202611
Realizado	2	3	3	5	8	4	6	0
Meta	9	8	11	12	13	14	12	10
LS2								
LS	9	8	12	13	14	15	13	11
LI2	7	6	8	9	10	11	9	8
LI	8	7	9	10	11	12	10	9
Pontos Entregues	135.5	177	190.5	204.5	213.5	155.5	163.5	140
% PBUG / TR	1,48	1,70	1,58	2,45	3,75	2,58	3,67	0,00

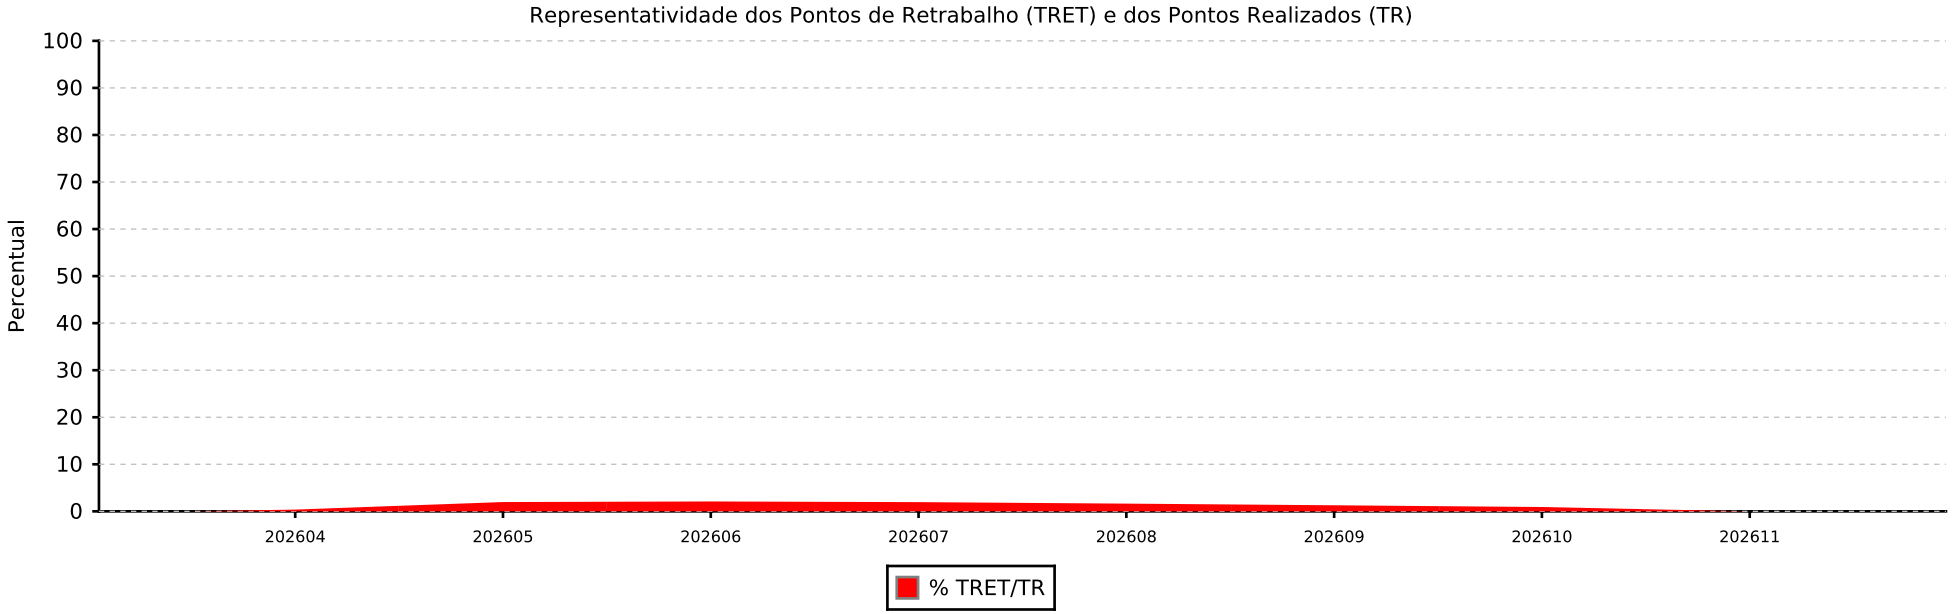


	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610	202611
TR - Pontos Realizados	135.5	177	190.5	204.5	213.5	155.5	163.5	140
TRET - Pontos de Retrabalho	0.5	3.5	4	4	3.5	2	1.5	0
% TRET/TR	0,4	2,0	2,1	2,0	1,6	1,3	0,9	0,0

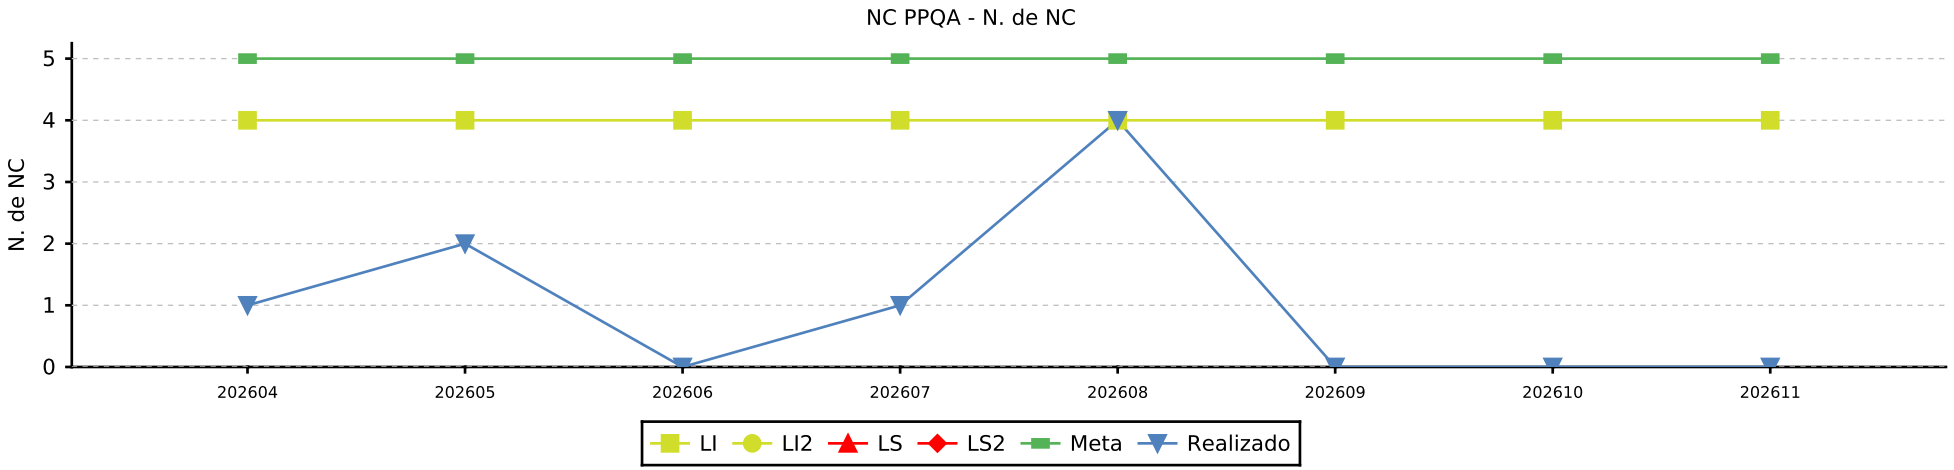

	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610	202611
Realizado	1	2	0	1	4	0	0	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

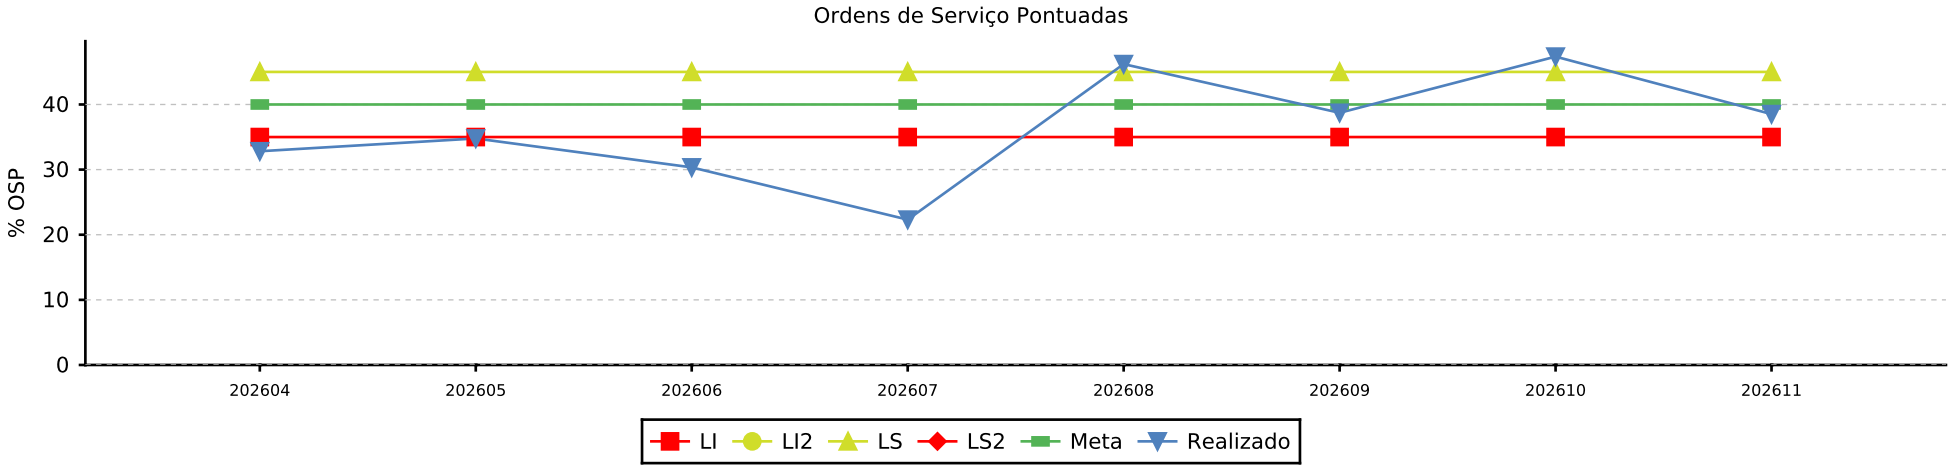

	202604	202605	202606	202607	202608	202609	202610	202611
Realizado	32.82	34.78	30.34	22.32	46.2	38.72	47.35	38.52
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35



% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [42.37%]
- Code Review [14.18%]
- Ausencia [9.13%]
- Analise de Sistema [6.76%]
- Outros [5.53%]
- Manutenção de Servidores [2.47%]
- Daily Scrum [2.45%]
- Cafe [2.32%]
- Compilacao de sistemas [1.76%]
- Ginastica Laboral [1.61%]
- Sprint Planning 1 [1.59%]
- Reuniao [1.47%]
- Retrospectiva [1.07%]
- Treinamento [0.83%]
- Verificando apontamento [0.76%]
- Atestado [0.7%]
- Clean Code [0.64%]
- Curso/Palestra [0.55%]
- Sizing [0.55%]
- Preparando ambiente [0.5%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.47%]
- Documentação [0.46%]
- Sprint Planning 2 [0.45%]
- Correção de Erros Interno [0.31%]
- Analise Retorno O.S. [0.26%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.19%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.18%]
- Atividades Gerenciais [0.18%]
- Analise de O.S [0.09%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [0.09%]
- Planejamento de Projeto [0.04%]
- Geração de Atas [0.03%]

% de Horas por Área do CMMI

