Filtros do Relatório: Equipe: 15 | Projeto: 896 | Sprint: 4

INDICADORES DA SPRINT

	202603				202604			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m	176h00m	144h00m	176h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	231h06m	233h48m	233h56m	238h26m	183h02m	144h15m	178h54m	239h52m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	159h10m	161h25m	163h55m	160h40m	138h00m	113h17m	120h10m	156h10m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	159h46m	130h34m	147h15m	125h58m	115h33m	82h08m	98h54m	135h16m
05. Pontos planejados	76,5	95,5	73,5	47,5	34,5	36,5	22,0	18,0
06. Pontos entregues	27	51,5	50,5	53	35	40	23	37,5
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	15,50	42,50	40,00	38,00	24,50	28,50	16,00	16,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	11,50	9,00	10,50	15,00	10,50	11,50	7,00	21,50
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	2	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	7	5	6	7	14	11	11	6
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	6	12	14	14	8	15	8	13
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	1	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	0,5	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,481	0,592	0,449	0,296	0,250	0,323	0,184	0,116
16. Produtividade realizada	0,169	0,395	0,343	0,421	0,303	0,488	0,233	0,278
17. % Pontos NP / Pontos entregues	42,6	17,5	20,8	28,4	30	28,8	30,5	57,4

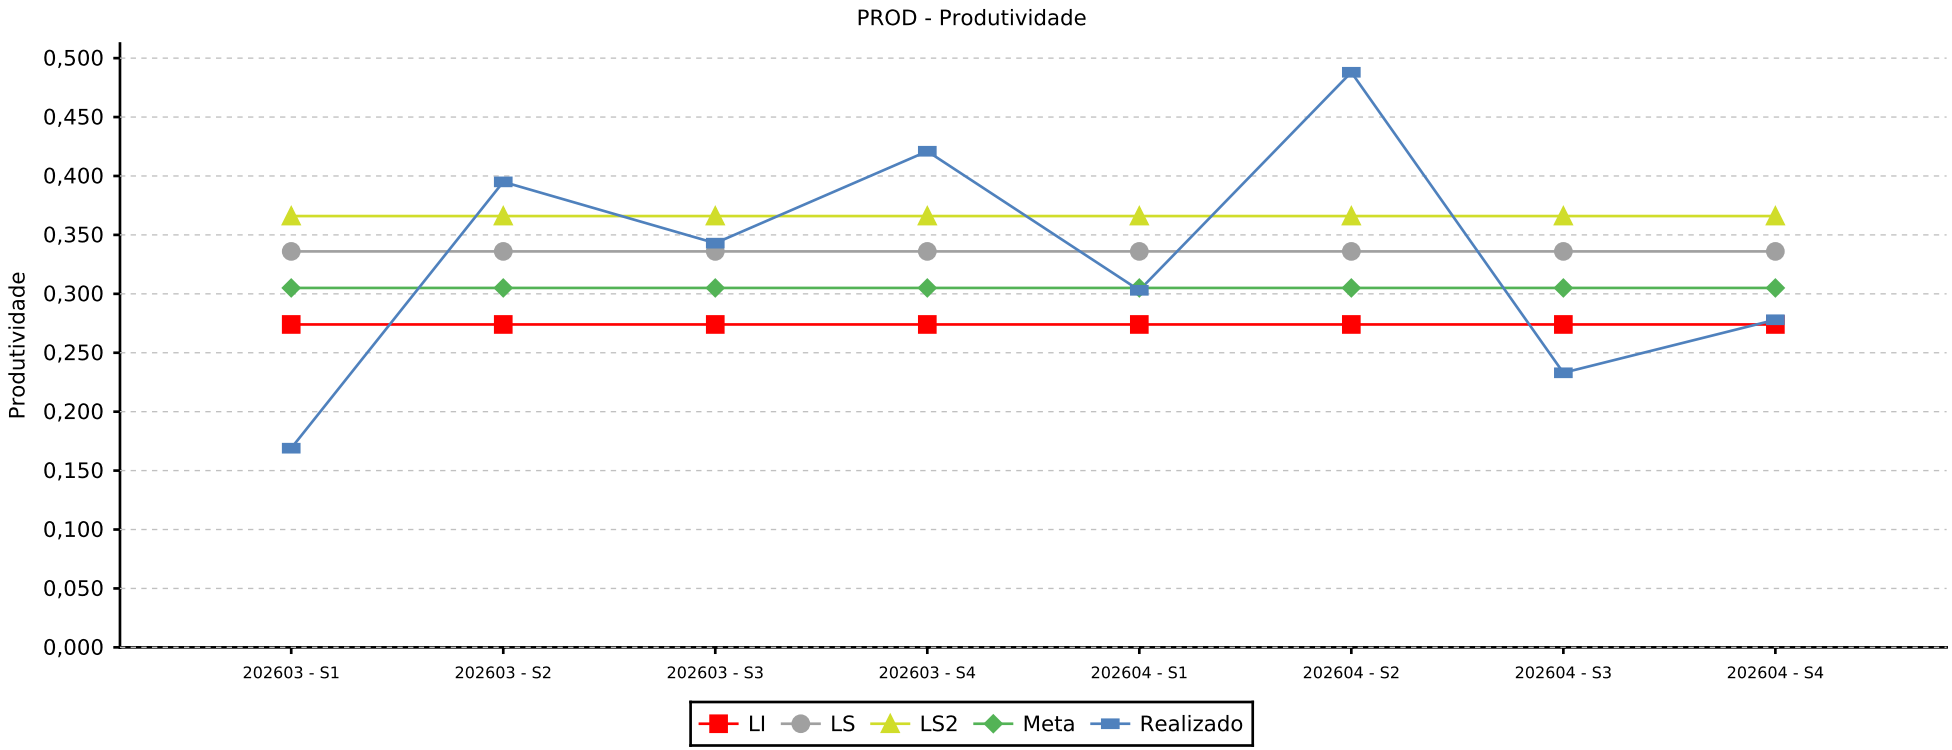

	202603				202604			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,169	0,395	0,343	0,421	0,303	0,488	0,233	0,278
Meta	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305
LS2	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366
LS	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
LI	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274

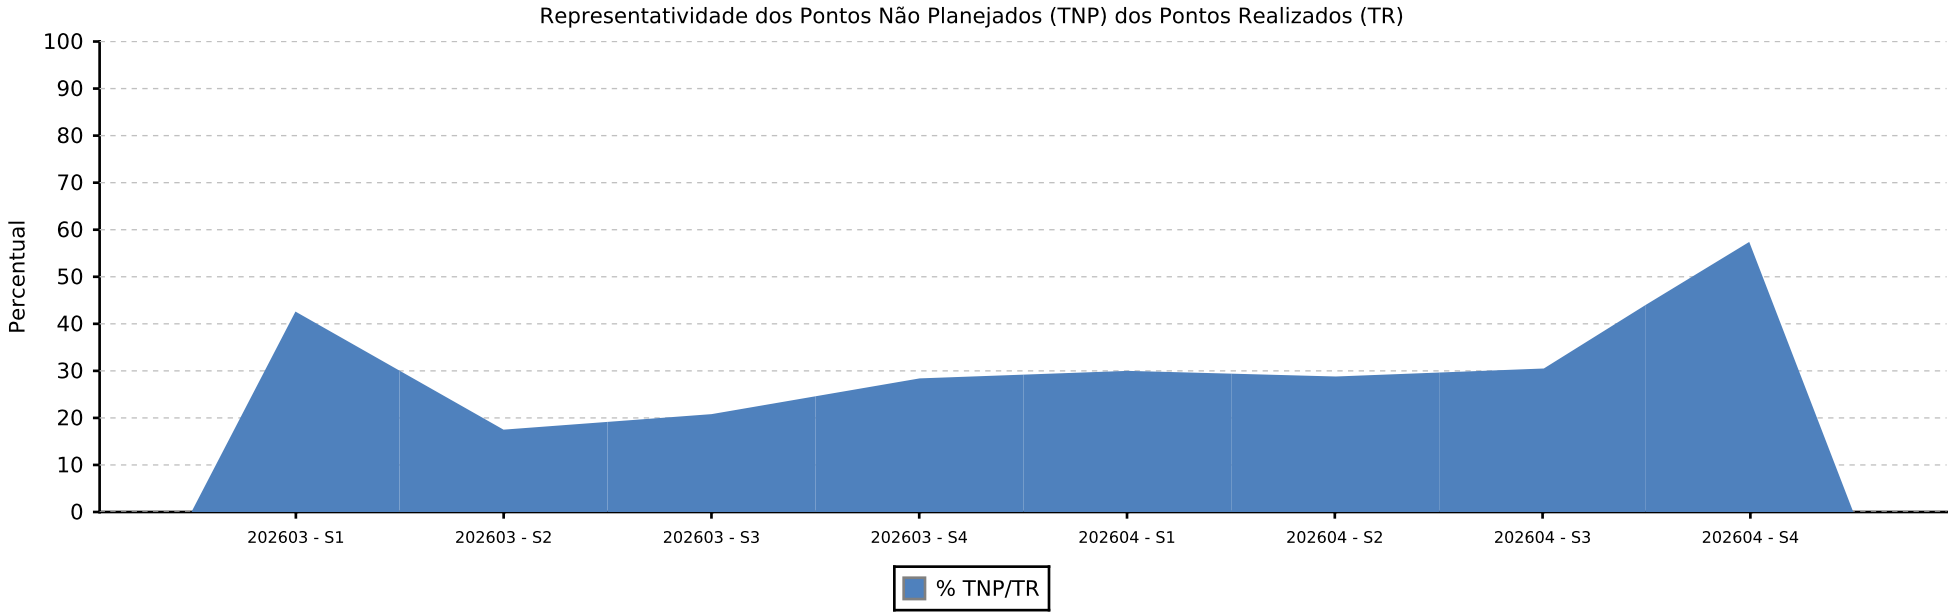

	202603				202604			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	27	51.5	50.5	53	35	40	23	37.5
TNP - Pontos Não Planejados	11.5	9	10.5	15	10.5	11.5	7	21.5
% TNP/TR	42,6	17,5	20,8	28,4	30,0	28,8	30,5	57,4

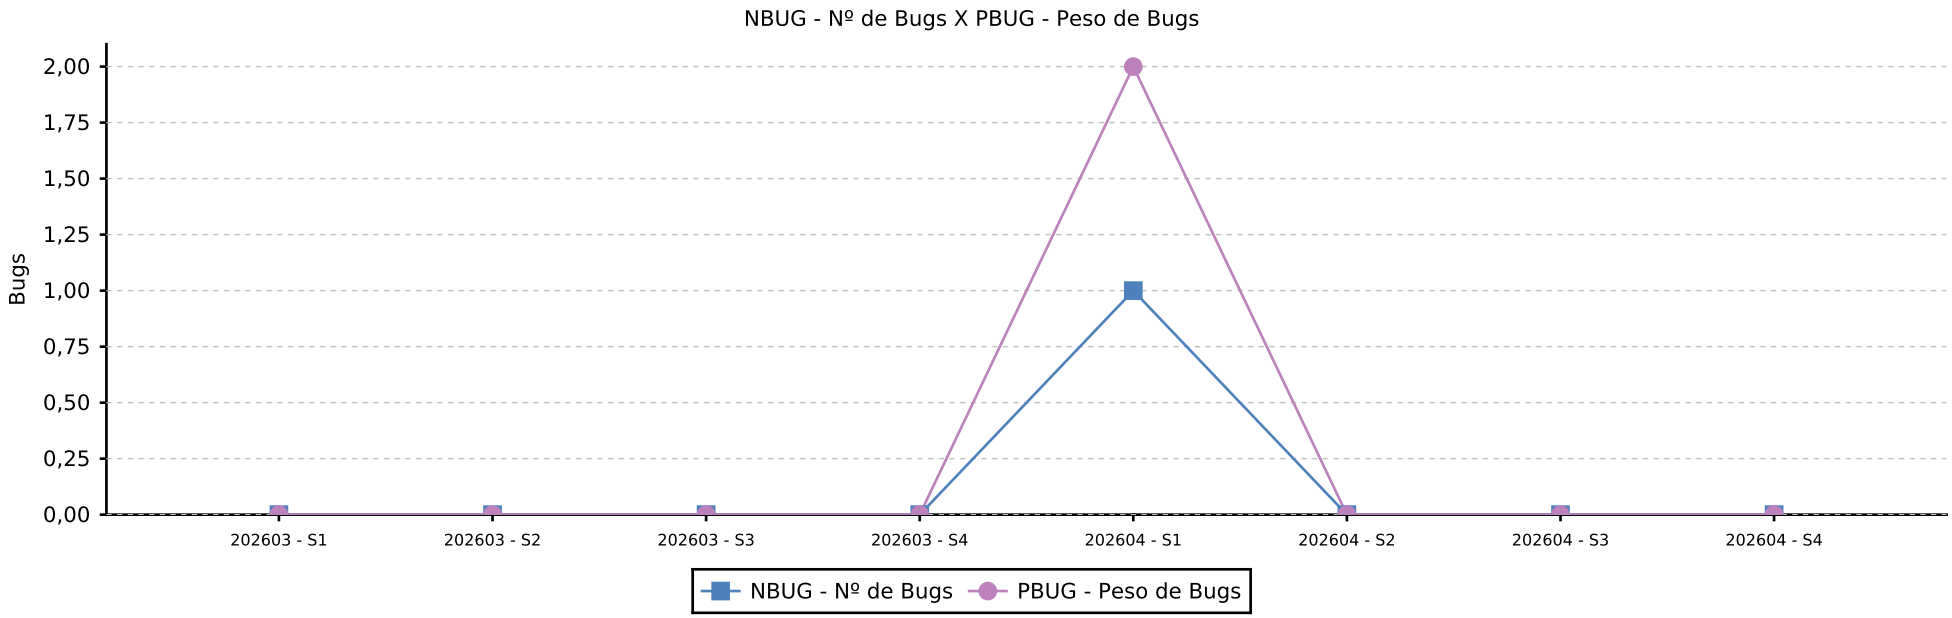

	202603				202604			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	1	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	2	0	0	0
Pontos Entregues	27	51.5	50.5	53	35	40	23	37.5
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00

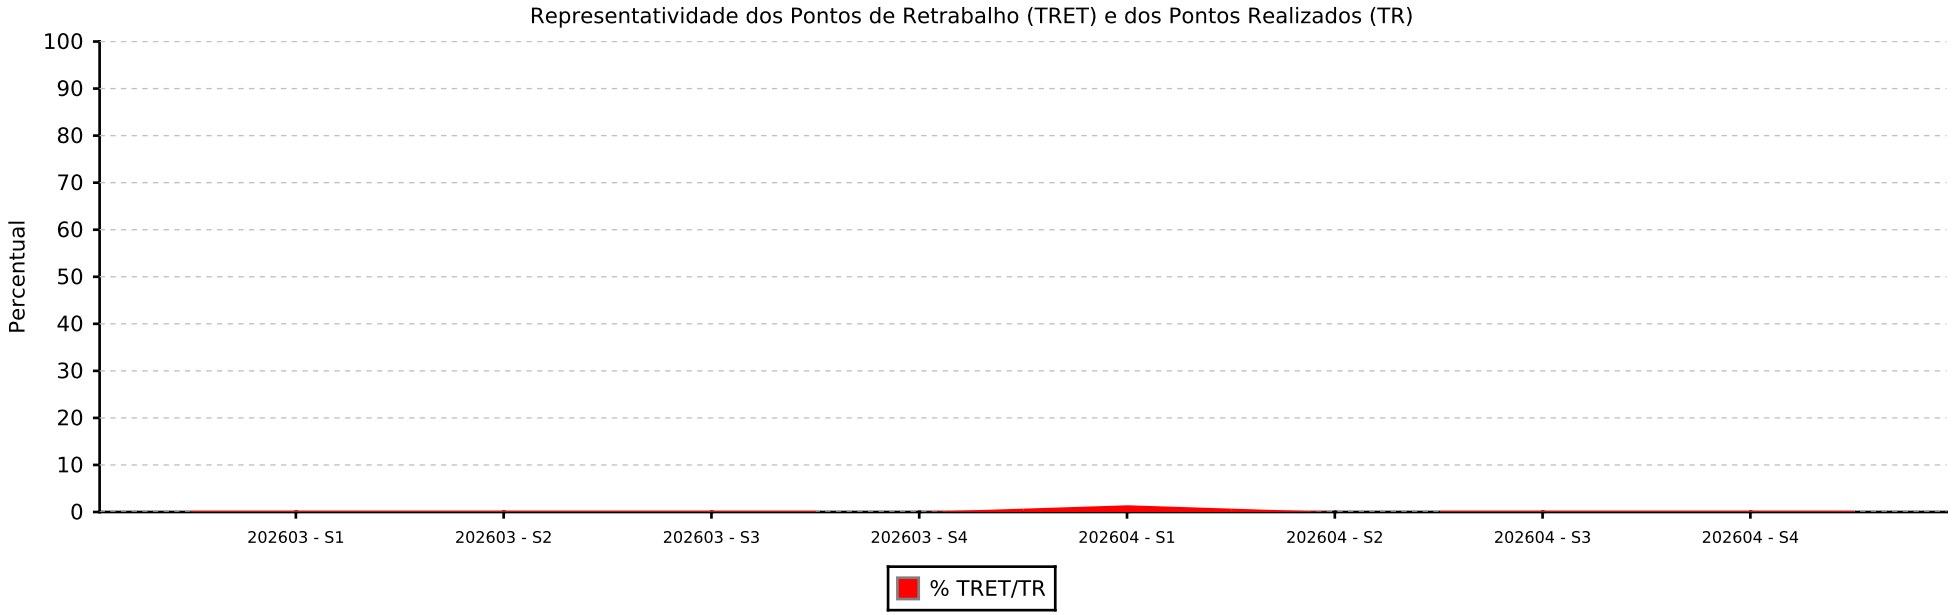

	202603				202604			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	27	51.5	50.5	53	35	40	23	37.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0	0.5	0	0	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
Desenvolvimento	117,42	98,28	94,23	71,98	97	82,7	127,17	112,22	435,82	365,18	83,8 %
Analise de Sistema	7,33	16,4	6,13	21,63	12,33	20,92	13,33	32,42	39,12	91,37	233,6 %
Code Review	14	13,62	11	20,83	18	16,05	21	30,1	64	80,6	125,9 %
Daily Scrum	5,08	5,28	4	3,07	5,17	4,98	5,75	8,85	20	22,18	110,9 %
Ausencia	0	5,57	0	3,42	0	1,38	0	7,53	0	17,9	0,0 %
Reuniao	1,25	0	1,25	3,6	4,25	13,45	5	7,42	11,75	24,47	208,3 %
Retrospectiva	4	4,33	4	3,33	4	2,25	5	6,25	17	16,16	95,1 %
Cafe	5	4,75	4	3,67	5	4,5	6,25	6	20,25	18,92	93,4 %
Compilacao de sistemas	3	4,17	2	2,5	1	9,68	1	5,68	7	22,03	314,7 %
Ginastica Laboral	3,33	3,17	2,67	2,5	3,33	3,32	4,17	5,25	13,5	14,24	105,5 %
Sprint Planning 1	4	4,67	4	2,67	4	3	5	3,33	17	13,67	80,4 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	0	0	0	0,88	1	2,85	1	2,33	2	6,06	303,0 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	1,67	6,08	1,42	1,58	1,58	3,73	2,42	2,1	7,09	13,49	190,3 %
Atividades Gerenciais	0	0,5	0	0	1	0	1	1,97	2	2,47	123,5 %
Sprint Planning 2	2	2	2	1	2	1,67	2,5	1,67	8,5	6,34	74,6 %
Outros	0	1,88	0	0	0	1,27	0	1,5	0	4,65	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,33	0	0,33	0	0,33	0	0,33	1,43	1,32	1,43	108,3 %
Clean Code	4	0,45	3,55	0	3	0,88	4	1,25	14,55	2,58	17,7 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,25	0,92	1,25	0,92	73,6 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1	0,53	1	0	0,5	0,83	1	0,78	3,5	2,14	61,1 %
Verificando apontamento	1,17	0,17	1	0,42	1,33	0,5	1,33	0,78	4,83	1,87	38,7 %
Geração de Atas	0,42	0,5	0,42	0,17	0,25	0	0,25	0,08	1,34	0,75	56,0 %
Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0,08	0	0	0	0	0	0,08	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atestado	0	9,37	0	0	0	0	0	0	0	9,37	0,0 %
Correção de Erros Interno	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %

Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Sizing	0	0	0	0	6	0	6	0	12	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	0	0	0	0	4	0,83	4	0	8	0,83	10,4 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0	0	0	0	0,25	0,67	0,25	0	0,5	0,67	134,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0	0	1,75	0	0	0	1,75	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0,92	0	0	0	1	0	0	0	1,92	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0,25	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Particular	0	0,4	0	0,67	0	0,68	0	0	0	1,75	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0,5	0	0,5	0	0,17	0	0,5	0	1,67	0	0,0 %
Total Geral	176	183,04	144	144,25	175,99	178,89	220	239,86	715,99	746,04	104,2 %

% de Horas por Atividade

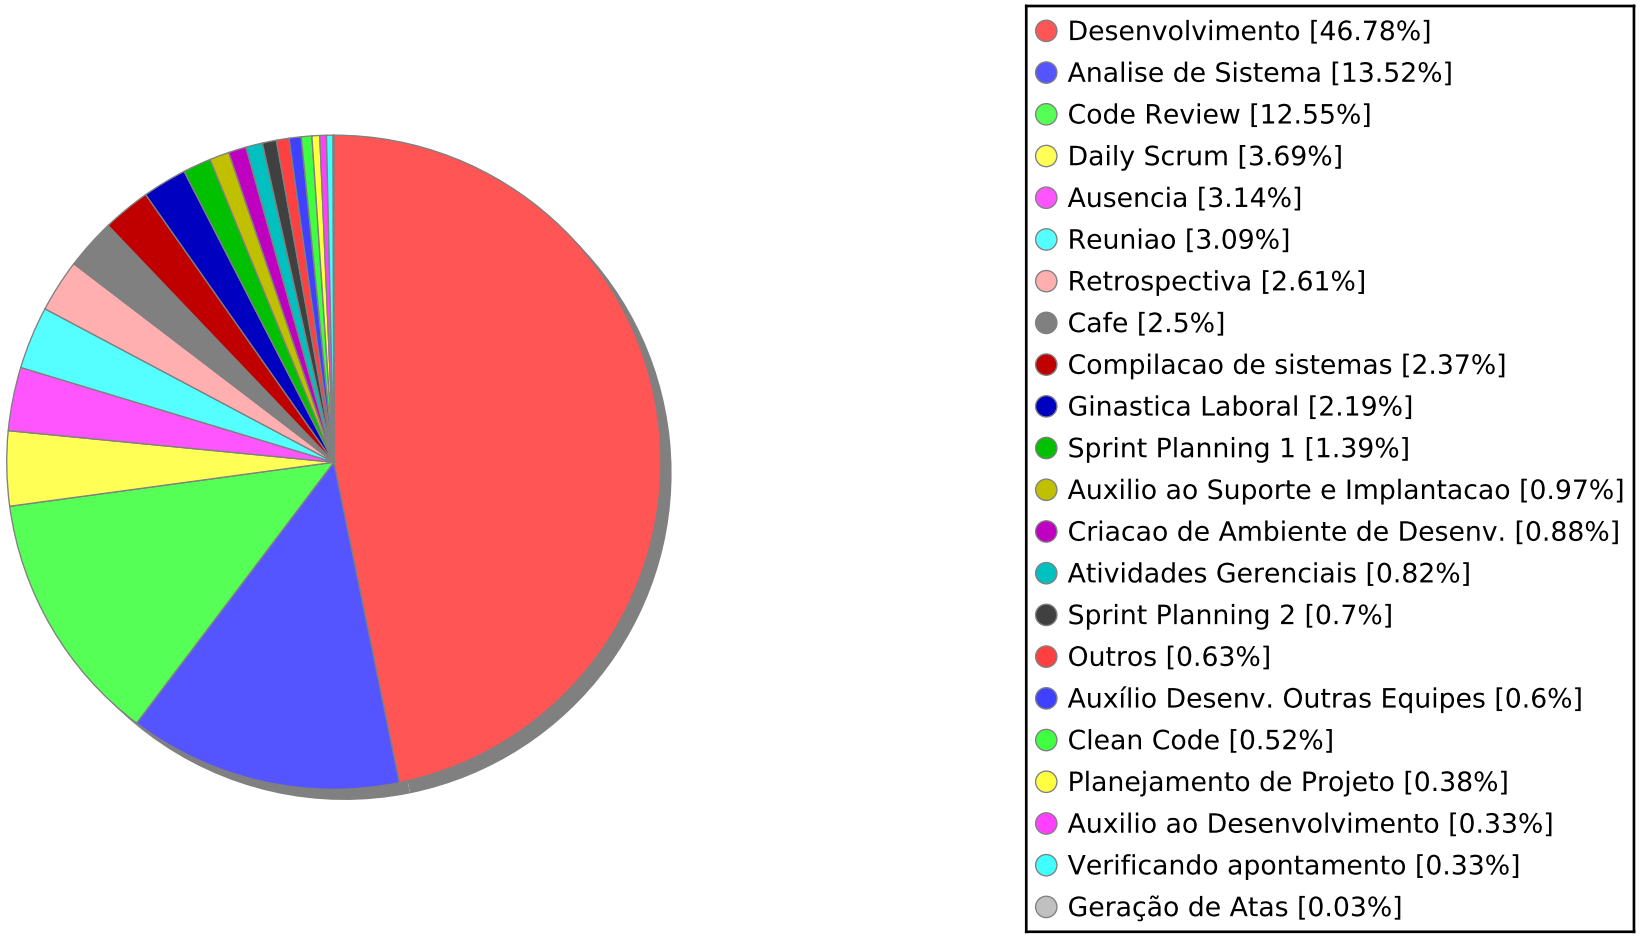

HORAS POR ÁREA DO CMMI

	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Area CMMI	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos	124,92	105,35	101,03	73,57	102,92	88,15	135,42	117,78	464,29	384,85	82,9 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	23,08	23,23	19	27,23	27,17	23,28	31,75	45,2	101	118,94	117,8 %
REQM - Gestao de Requisitos	13,33	23,98	12,13	25,3	24,33	26,58	26,83	37,42	76,62	113,28	147,8 %
DIV - Diversos*	10,08	15,87	8,42	14,07	14,75	26,77	17,92	32	51,17	88,71	173,4 %
CM - Gerencia de Configuracao	3	4,17	2	2,5	1	9,68	1	5,68	7	22,03	314,7 %
PP - Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,25	0,92	1,25	0,92	73,6 %
OT - Treinamento na Organizacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
PI - Integracao de Produto	0	0	0	0	4	0,83	4	0	8	0,83	10,4 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	174,41	172,6	142,58	142,67	174,17	175,29	218,17	239	709,33	729,56	102,9 %

% de Horas por Área do CMMI

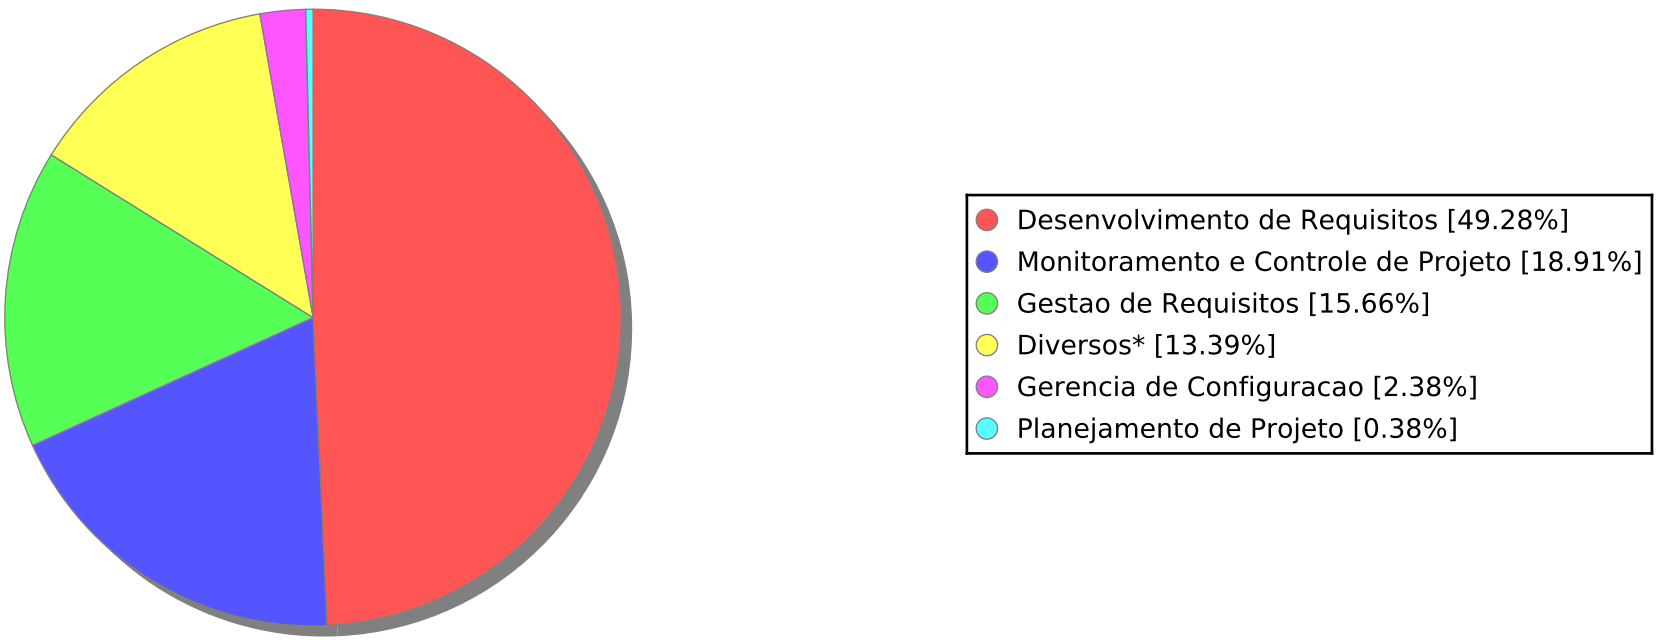

INDICADORES DO PROJETO

	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604
01. Horas planejadas de todas atividades	880h00m	880h00m	712h00m	531h00m	624h00m	760h00m	880h00m	716h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	977h42m	945h46m	774h53m	588h21m	642h30m	772h50m	937h16m	746h03m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	615h45m	610h47m	477h55m	362h10m	467h15m	562h08m	645h10m	527h37m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	602h21m	544h09m	397h01m	349h29m	379h56m	503h09m	563h33m	431h51m
05. Pontos planejados para o projeto	188,0	186,0	145,0	110,0	4,0	171,0	4,0	160,8
06. Pontos planejados	196,0	235,5	161,0	108,5	154,5	228,5	293,0	111,0
07. Pontos entregues	185	171,5	123,5	111,5	121,5	155	182	135,5
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	113,50	154,50	109,00	91,50	86,50	137,50	136,00	85,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	71,50	17,00	14,50	20,00	35,00	17,50	46,00	50,50
10. Pontos entregues (apenas Erro)	0	3	0	2	0	0	0	2
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	25	38	31	20	32	49	25	42
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	51	20	10	22	13	22	46	44
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	1	0	1	0	0	0	1
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	0	1	0	1	0	0	0	0,5
16. Produtividade planejada	0,319	0,386	0,337	0,300	0,331	0,407	0,455	0,211
17. Produtividade realizada	0,308	0,316	0,312	0,320	0,320	0,309	0,323	0,314
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	98,5	92,3	85,2	101,4	3037,5	90,7	4550	84,3
19. % Pontos NP / Pontos entregues	38,7	10	11,8	18	28,9	11,3	25,3	37,3

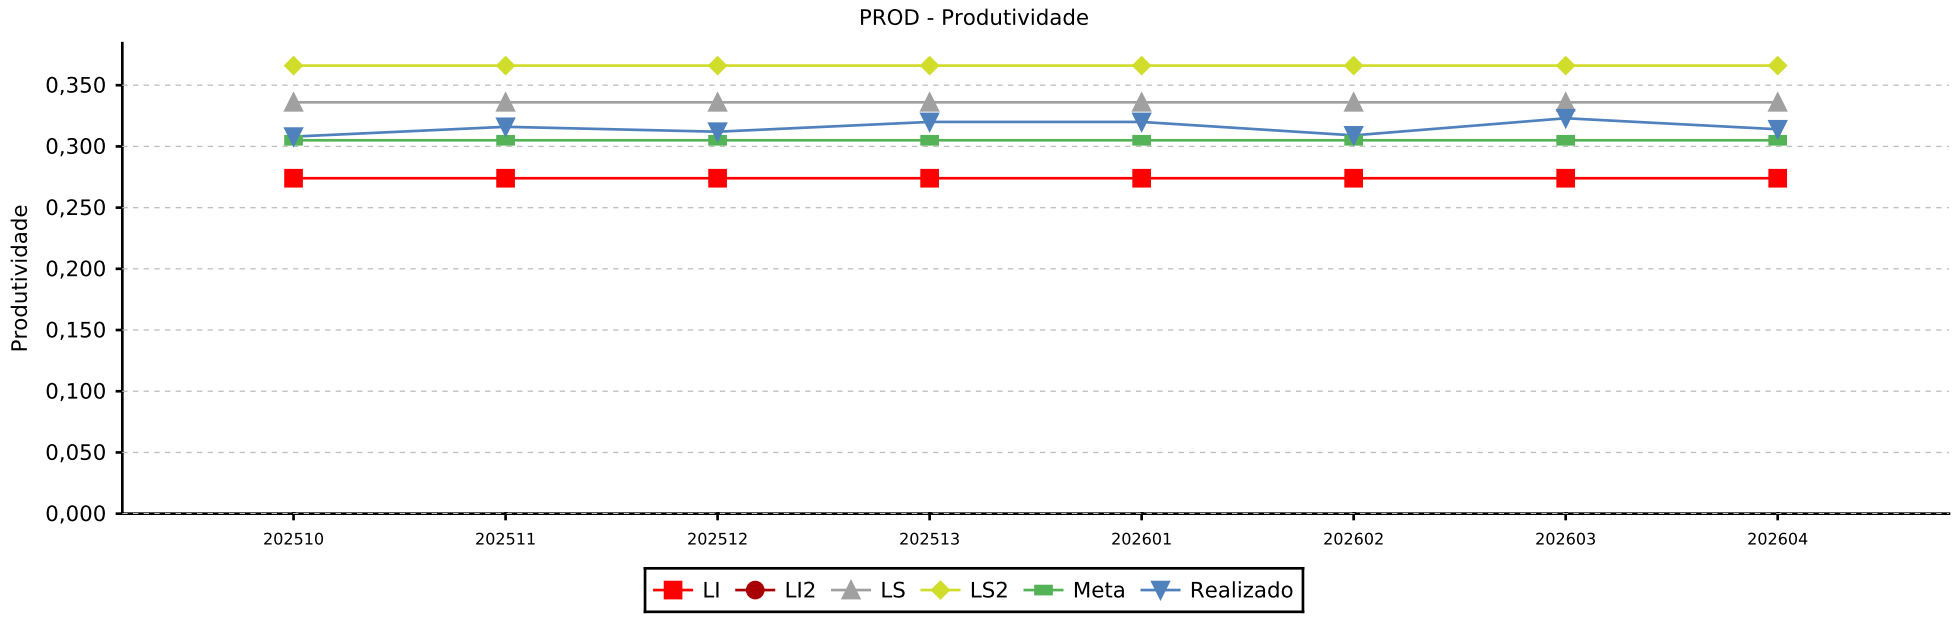

	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604
Realizado	0,308	0,316	0,312	0,320	0,320	0,309	0,323	0,314
Meta	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305
LS2	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366
LS	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
LI2								
LI	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274

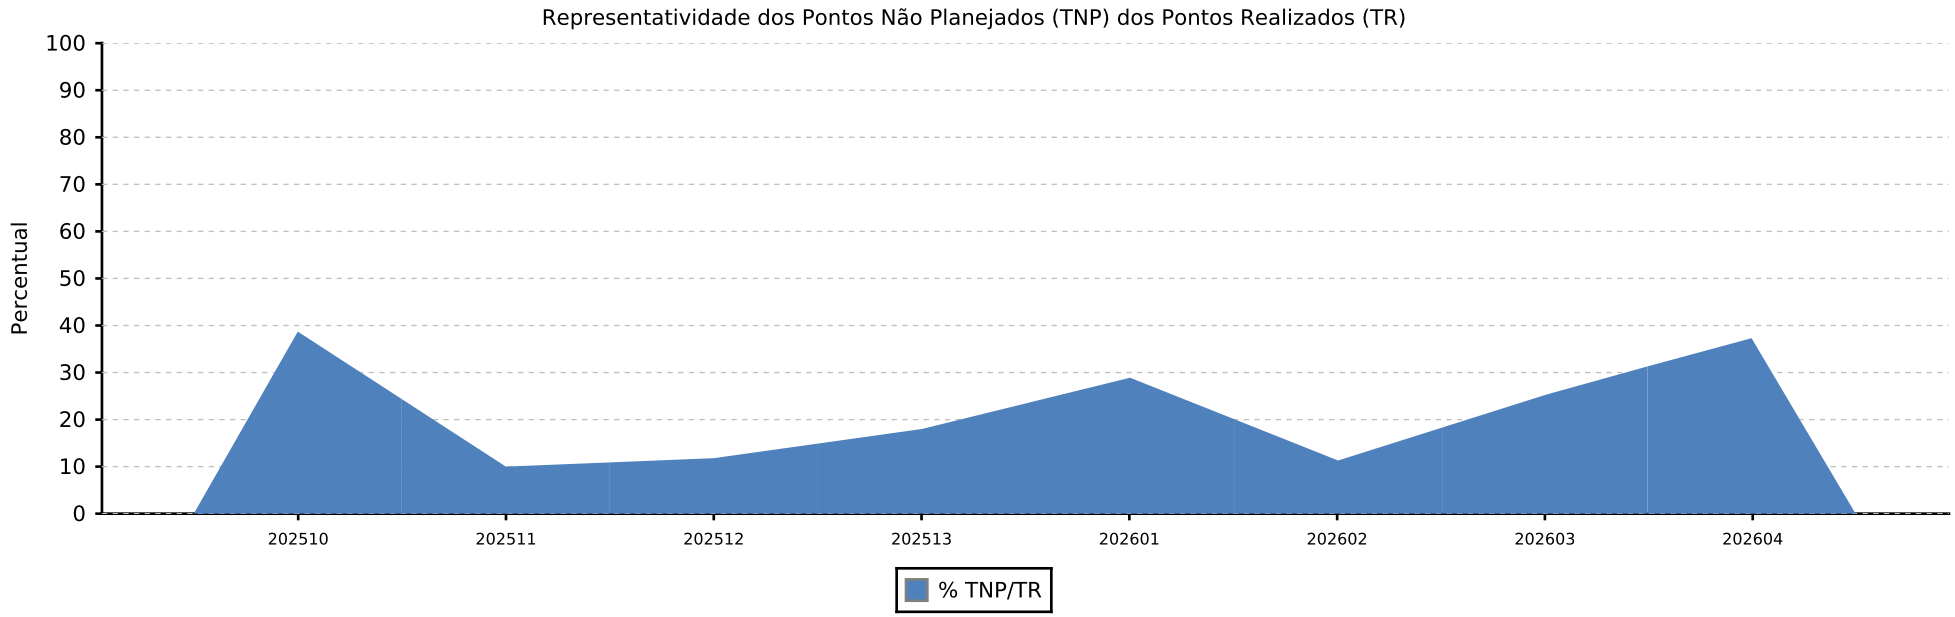

	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604
TR - Pontos Realizados	185	171.5	123.5	111.5	121.5	155	182	135.5
TNP - Pontos Não Planejados	71.5	17	14.5	20	35	17.5	46	50.5
% TNP/TR	38,7	10,0	11,8	18,0	28,9	11,3	25,3	37,3

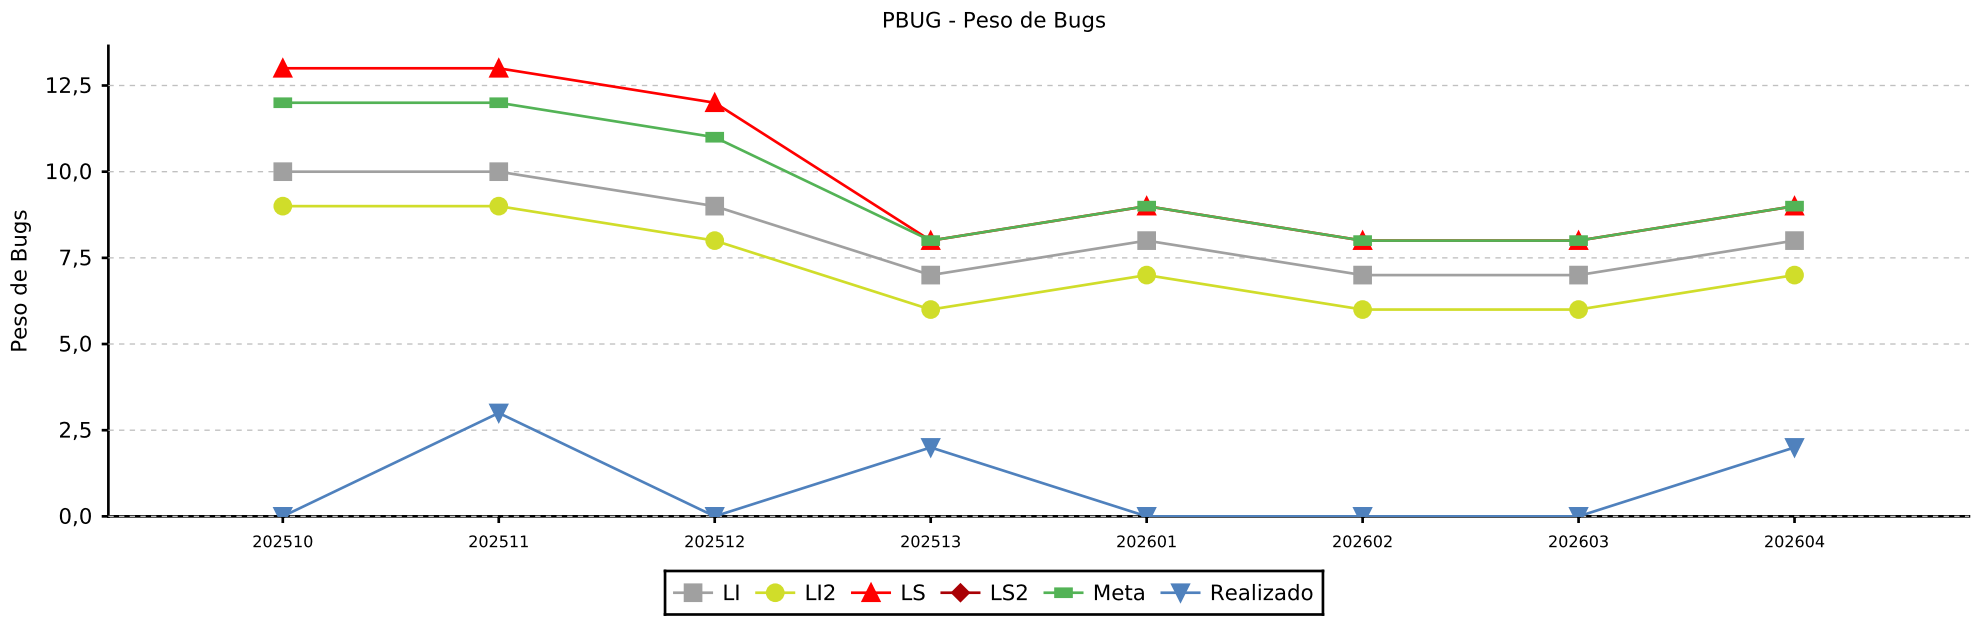

	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604
Realizado	0	3	0	2	0	0	0	2
Meta	12	12	11	8	9	8	8	9
LS2								
LS	13	13	12	8	9	8	8	9
LI2	9	9	8	6	7	6	6	7
LI	10	10	9	7	8	7	7	8
Pontos Entregues	185	171.5	123.5	111.5	121.5	155	182	135.5
% PBUG / TR	0,00	1,75	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	1,48

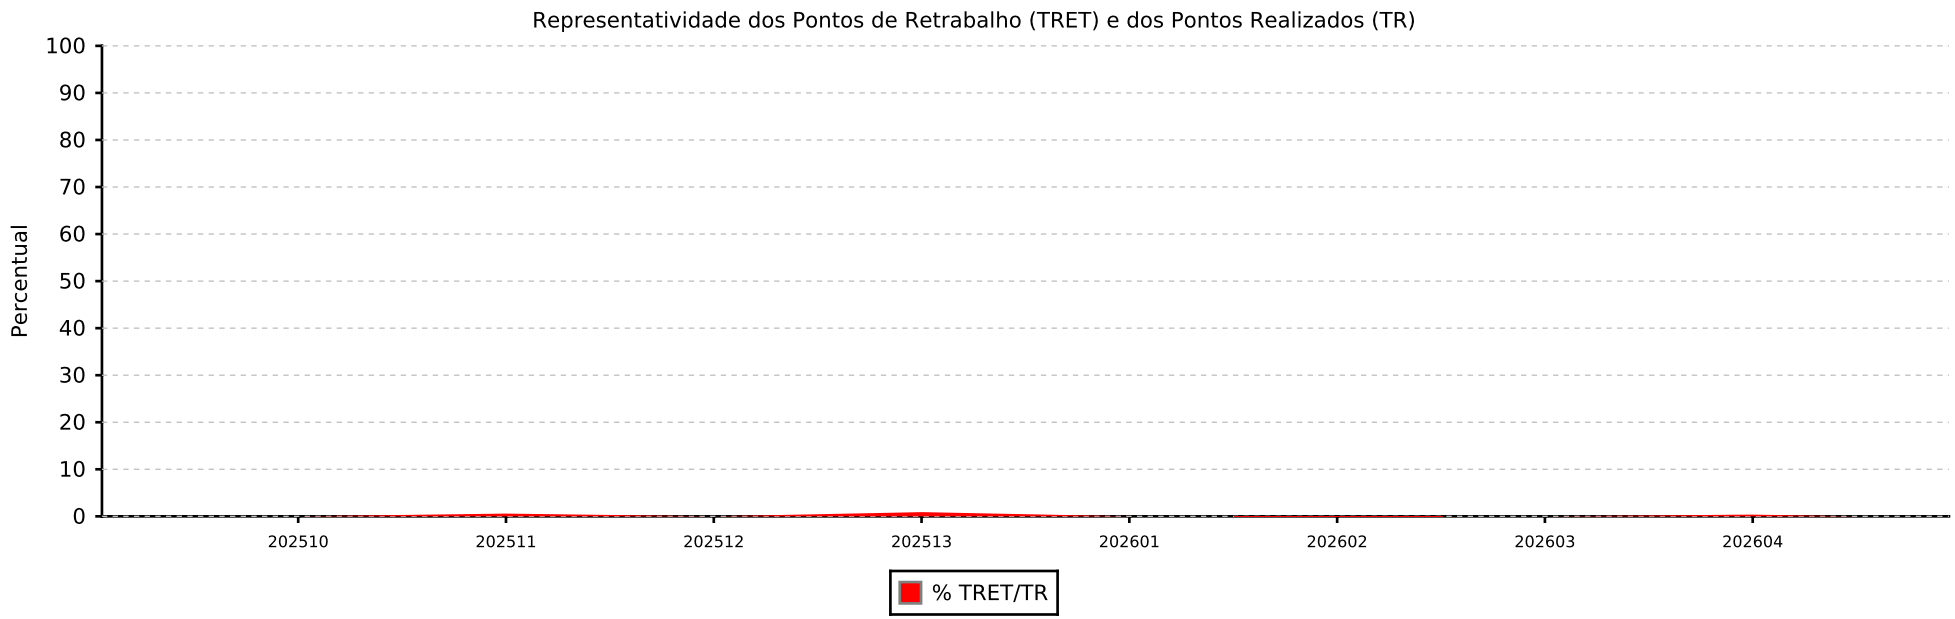

	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604
TR - Pontos Realizados	185	171.5	123.5	111.5	121.5	155	182	135.5
TRET - Pontos de Retrabalho	0	1	0	1	0	0	0	0.5
% TRET/TR	0,0	0,6	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,4

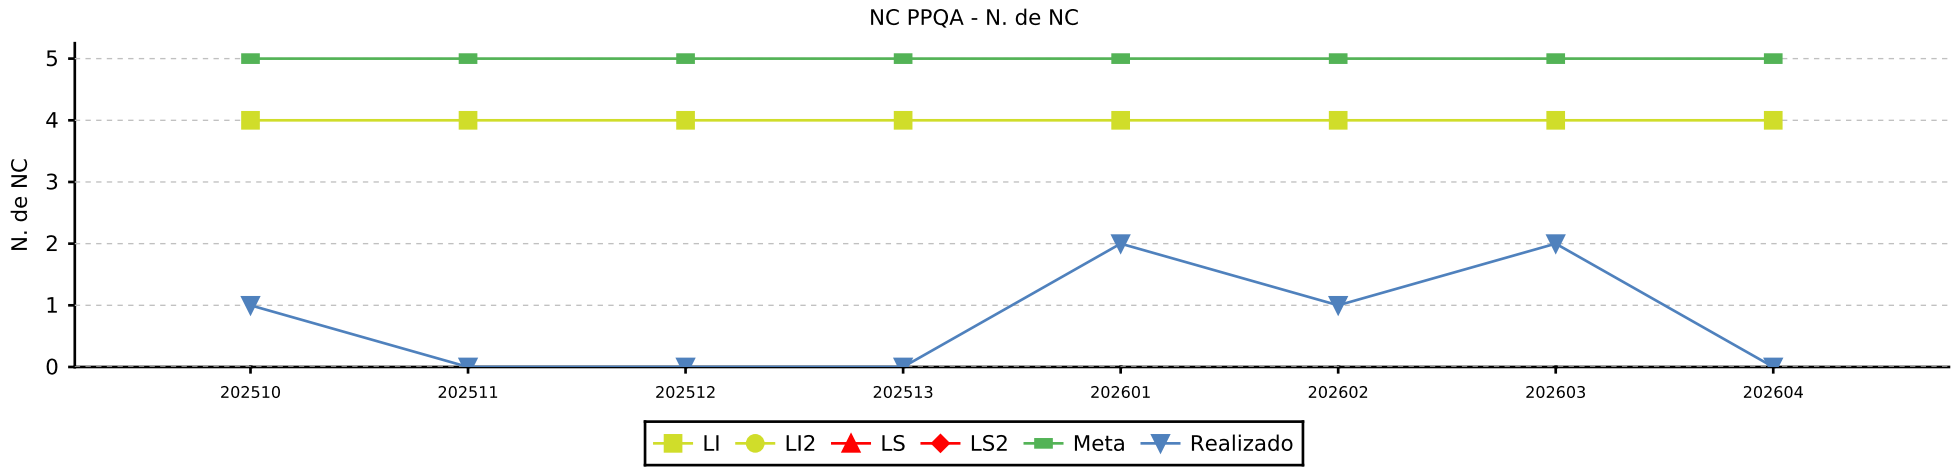

	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604
Realizado	1	0	0	0	2	1	2	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

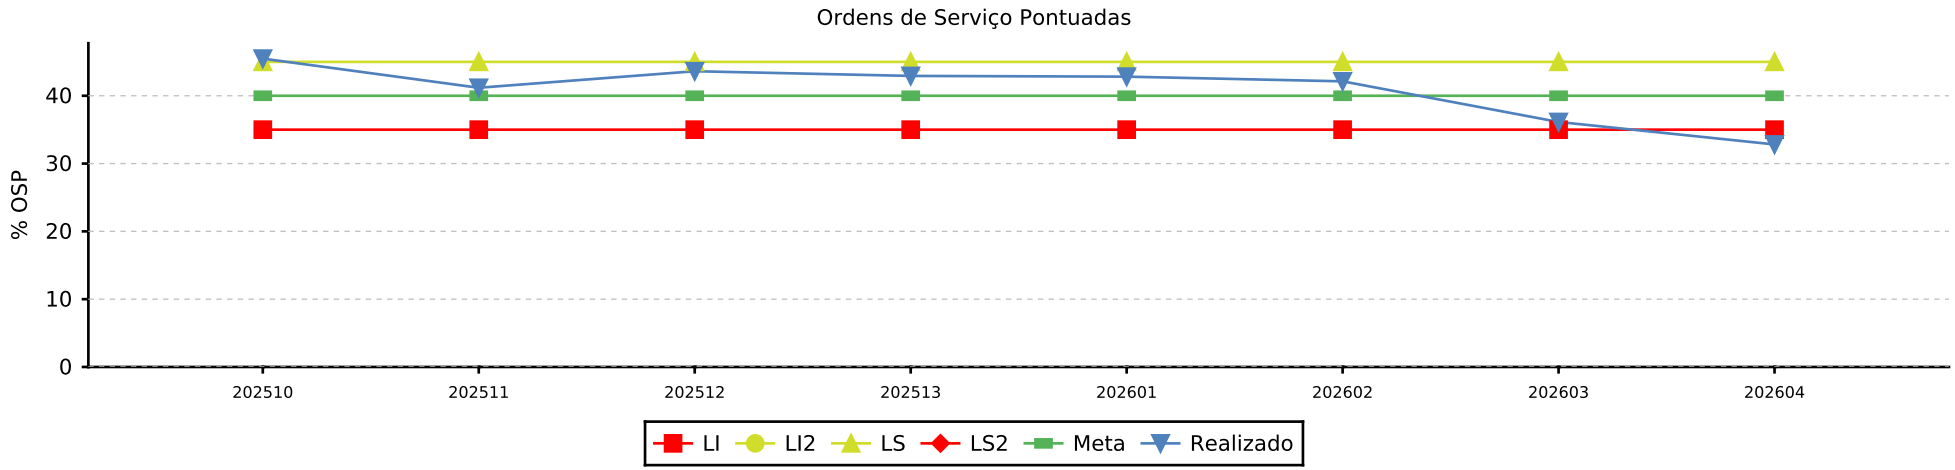

	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603	202604
Realizado	45.48	41.18	43.62	42.93	42.82	42.13	36.14	32.82
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

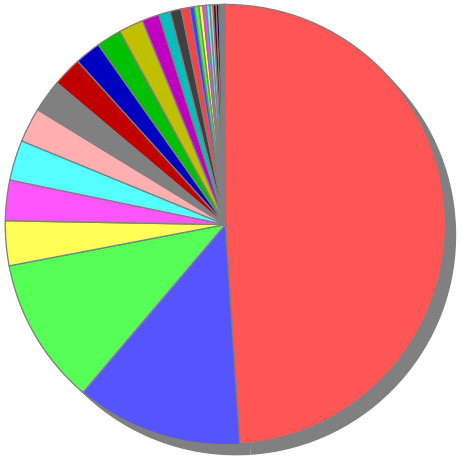

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [48.95%]
- Analise de Sistema [12.25%]
- Code Review [10.8%]
- Reuniao [3.28%]
- Daily Scrum [2.97%]
- Compilacao de sistemas [2.95%]
- Cafe [2.54%]
- Ausencia [2.4%]
- Retrospectiva [2.17%]
- Ginastica Laboral [1.91%]
- Sprint Planning 1 [1.83%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.81%]
- Atestado [1.26%]
- Sprint Planning 2 [0.85%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.81%]
- Outros [0.62%]
- Clean Code [0.35%]
- Atividades Gerenciais [0.33%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.29%]
- Analise Retorno O.S. [0.26%]
- Verificando apontamento [0.25%]
- Particular [0.23%]
- Manutenção de Servidores [0.23%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.19%]
- Planejamento de Projeto [0.12%]
- Atualizacao de Versao [0.11%]
- Geração de Atas [0.1%]
- Treinamento [0.09%]
- Banheiro [0.03%]
- Verificar o.s no nome [0.01%]
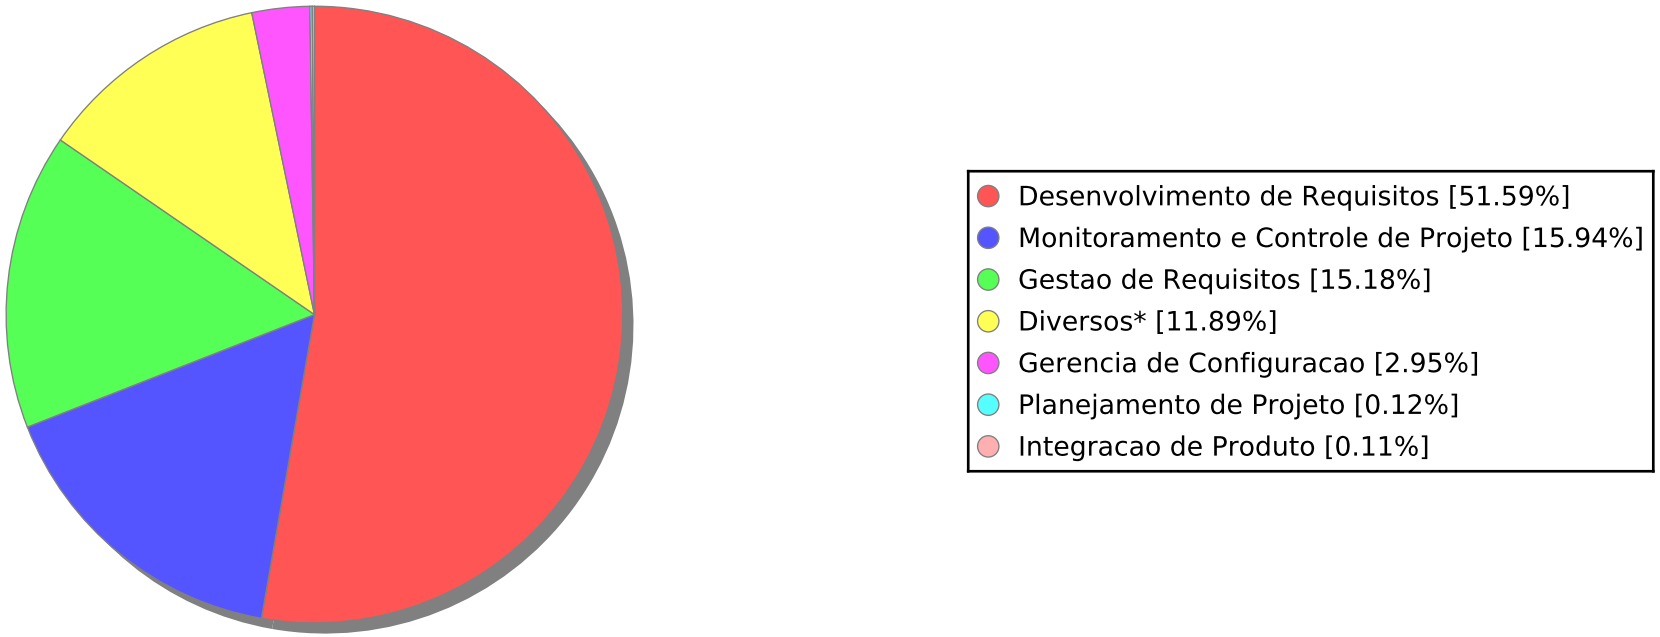
% de Horas por Área do CMMI
