Filtros do Relatório: Equipe: 15 | Projeto: 890 | Sprint: 4

INDICADORES DA SPRINT

	202602				202603			
	1	2	3	4	1	2	3	4
01. Horas planejadas de todas atividades	220h00m	220h00m	180h00m	140h00m	220h00m	220h00m	220h00m	220h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	230h16m	225h55m	180h41m	135h58m	231h06m	219h40m	233h56m	234h26m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	160h19m	162h35m	134h15m	104h59m	159h10m	161h25m	163h55m	160h40m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	143h52m	153h28m	115h34m	90h15m	159h46m	130h34m	147h15m	125h58m
05. Pontos planejados	57,5	64,0	58,0	49,0	76,5	95,5	73,5	47,5
06. Pontos entregues	38,5	53	27,5	36	27	51,5	50,5	53
07. Pontos entregues (apenas Tarefa)	31,50	48,00	26,00	32,00	15,50	42,50	40,00	38,00
08. Pontos entregues (apenas NP)	7,00	5,00	1,50	4,00	11,50	9,00	10,50	15,00
09. Pontos entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	16	13	12	8	7	5	6	7
11. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	6	8	3	5	6	12	14	14
12. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
14. Pontos de retrabalho	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Produtividade planejada	0,359	0,394	0,433	0,467	0,481	0,592	0,449	0,296
16. Produtividade realizada	0,268	0,346	0,238	0,399	0,169	0,395	0,343	0,421
17. % Pontos NP / Pontos entregues	18,2	9,5	5,5	11,2	42,6	17,5	20,8	28,4

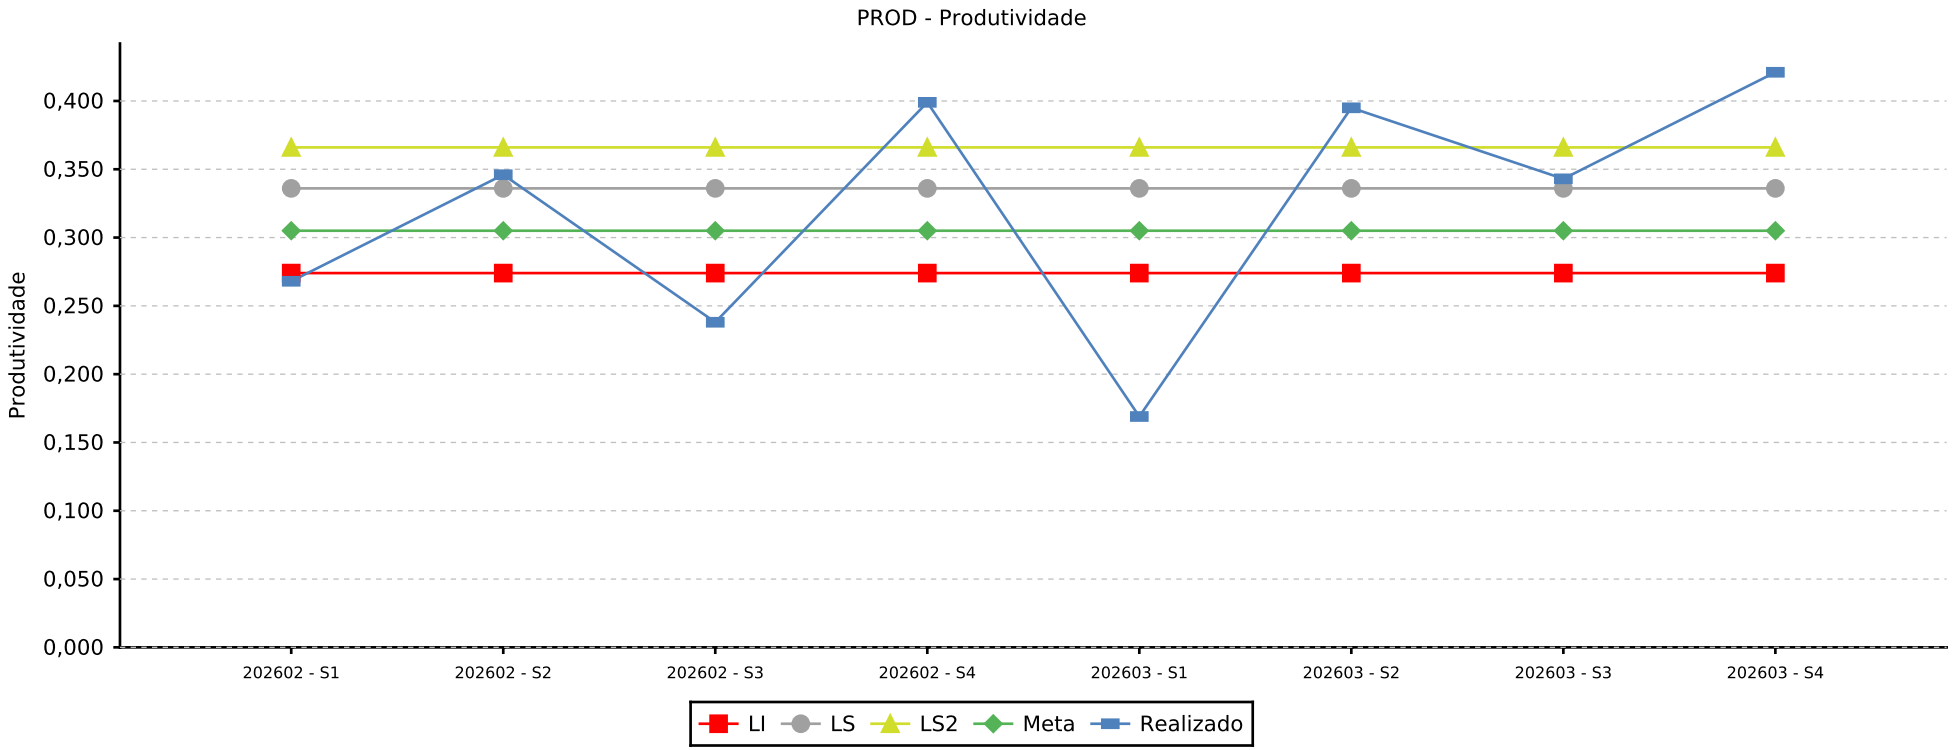

	202602				202603			
	1	2	3	4	1	2	3	4
Realizado	0,268	0,346	0,238	0,399	0,169	0,395	0,343	0,421
Meta	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305
LS2	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366
LS	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
LI	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274

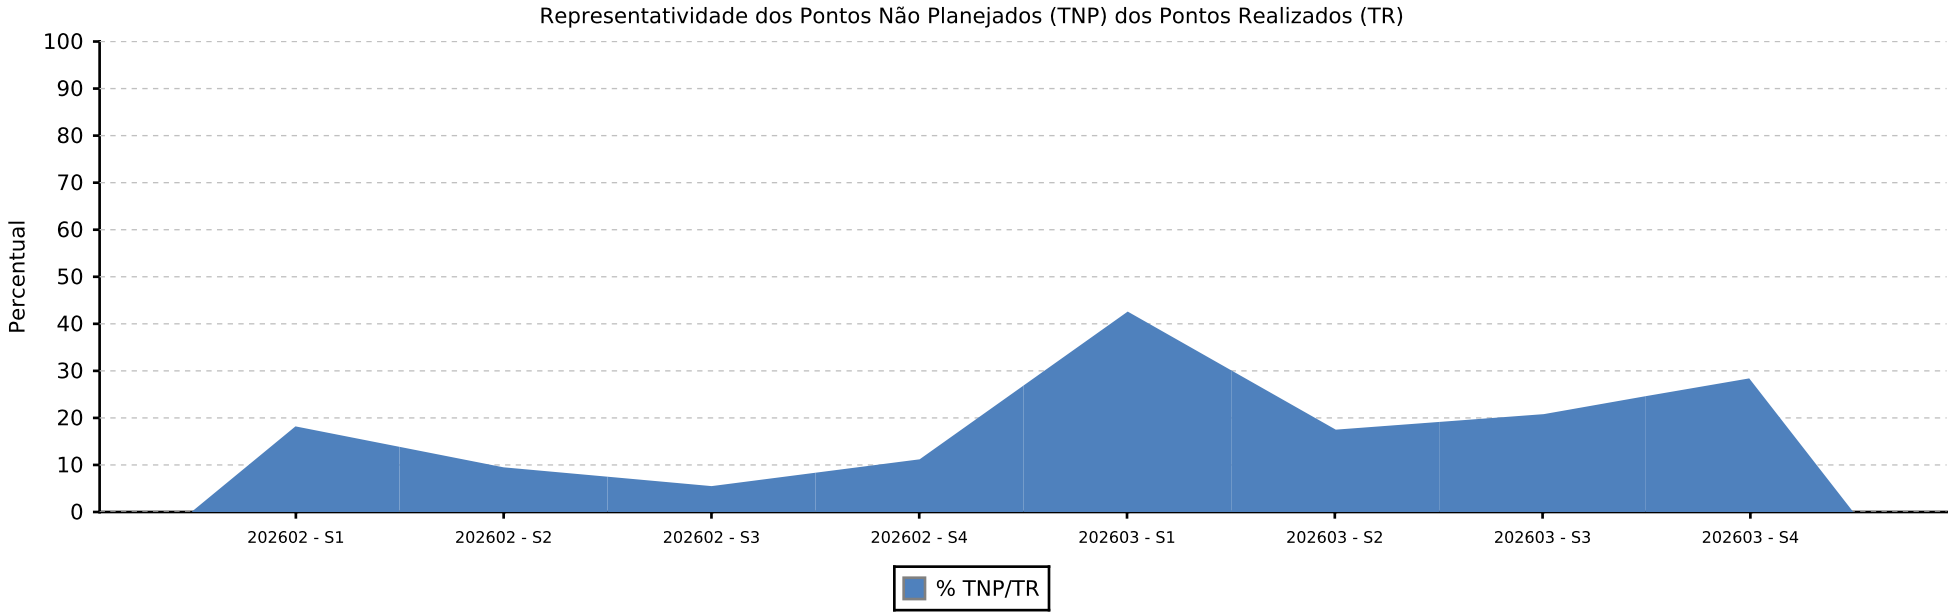

	202602				202603			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	38.5	53	27.5	36	27	51.5	50.5	53
TNP - Pontos Não Planejados	7	5	1.5	4	11.5	9	10.5	15
% TNP/TR	18,2	9,5	5,5	11,2	42,6	17,5	20,8	28,4

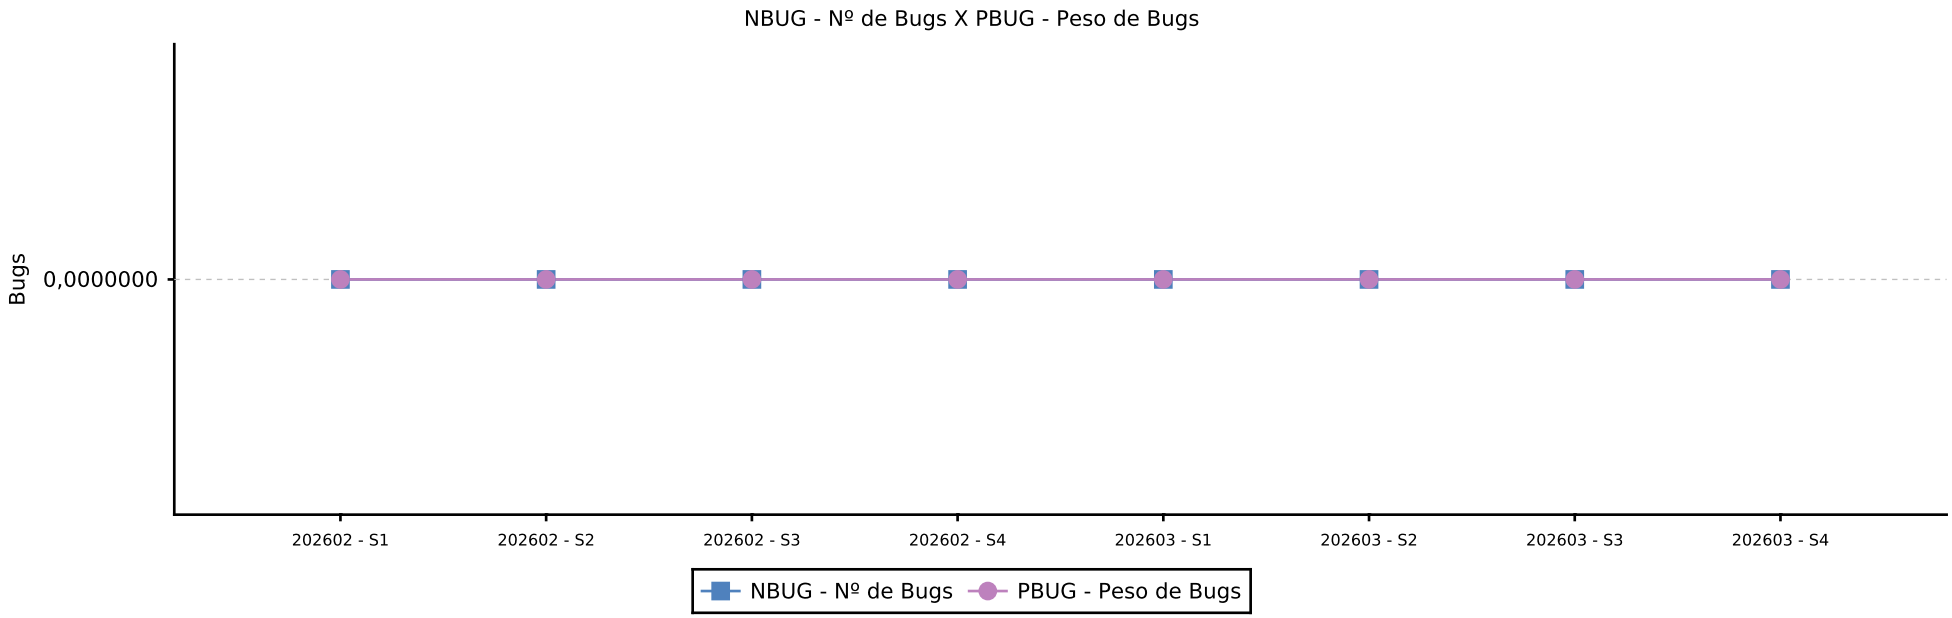

	202602				202603			
	1	2	3	4	1	2	3	4
NBUG - Nº de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	0
PBUG - Peso de Bugs	0	0	0	0	0	0	0	0
Pontos Entregues	38.5	53	27.5	36	27	51.5	50.5	53
% PBUG / TR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

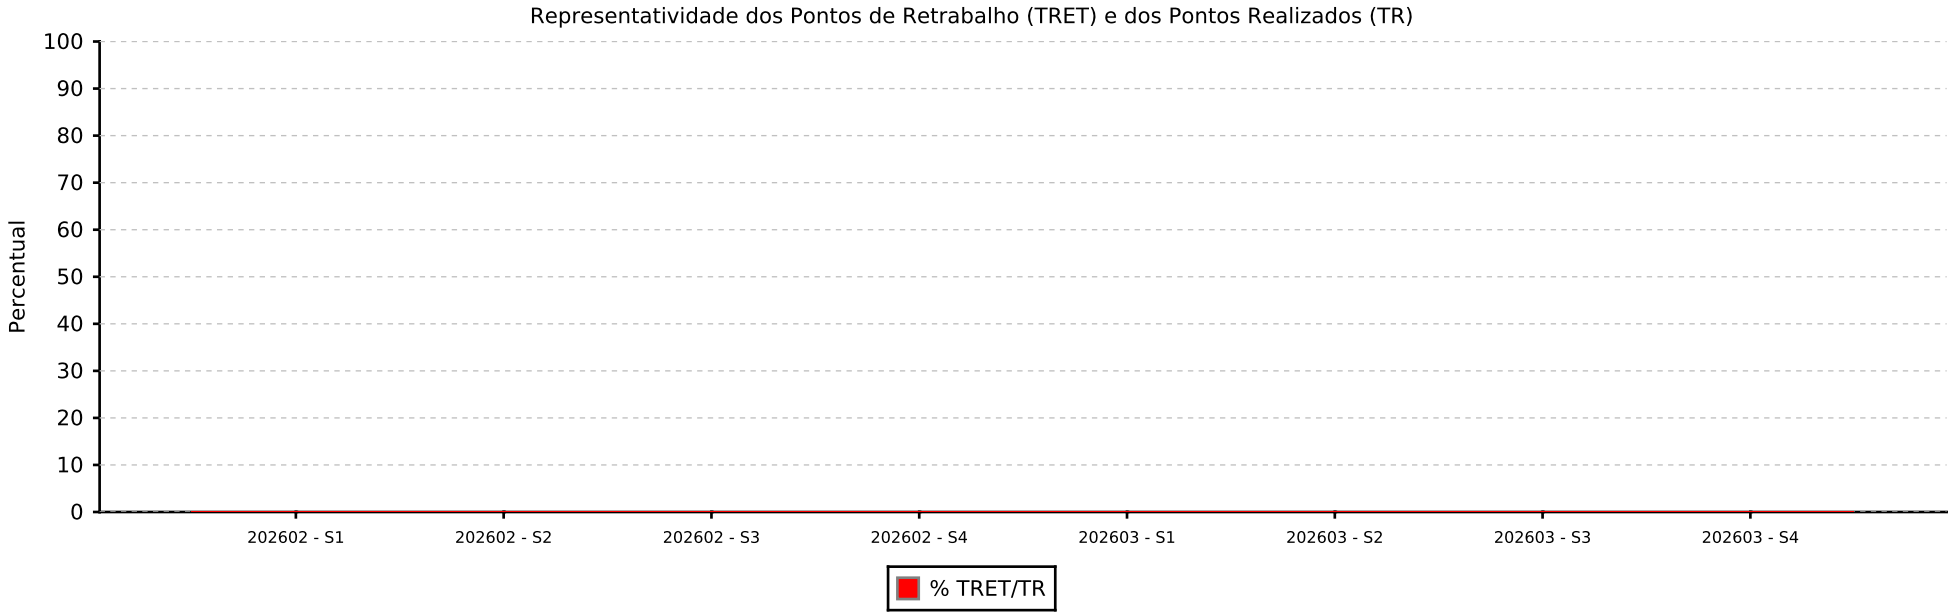

	202602				202603			
	1	2	3	4	1	2	3	4
TR - Pontos Realizados	38.5	53	27.5	36	27	51.5	50.5	53
TRET - Pontos de Retrabalho	0	0	0	0	0	0	0	0
% TRET/TR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

HORAS POR ATIVIDADE

	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Atividade	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
Desenvolvimento	130,75	136,18	133	112,82	135,5	120,33	131,17	104,95	530,42	474,28	89,4 %
Code Review	17	21,32	17	24,92	17	21,22	17	37,15	68	104,61	153,8 %
Analise de Sistema	13,33	14,13	13,33	23,25	10,83	30,97	13,33	16,42	50,82	84,77	166,8 %
Compilacao de sistemas	0,5	6,75	0,5	14,88	0,5	8,27	0,5	10,3	2	40,2	2.010,0
Ausencia	0	7,77	0	4,78	0	6,03	0	9,28	0	27,86	0,0 %
Auxilio ao Suporte e Implantacao	1	0	1	1	1	0,67	1	6,55	4	8,22	205,5 %
Atestado	0	1,75	0	0	0	0	0	5,78	0	7,53	0,0 %
Cafe	8,5	5,75	6,25	5,17	6,25	5,75	6,25	5,75	27,25	22,42	82,3 %
Sprint Planning 1	5	7,08	5	2,42	5	4,17	5	5,67	20	19,34	96,7 %
Daily Scrum	6,42	7,25	6,42	5,92	6,42	4,67	5,75	5,48	25,01	23,32	93,2 %
Ginastica Laboral	4,17	3,6	4,17	3,57	4,17	4,02	4,17	5,47	16,68	16,66	99,9 %
Sizing	6	0	6	0	6	0	6	4,75	24	4,75	19,8 %
Retrospectiva	5	5	5	4,58	5	7,92	5	4,37	20	21,87	109,4 %
Criacao de Ambiente de Desenv.	1,92	0,67	1,92	1,07	1,92	5,87	2,42	2,82	8,18	10,43	127,5 %
Sprint Planning 2	2,5	2,5	2,5	1,25	2,5	2,08	2,5	1,8	10	7,63	76,3 %
Reuniao	4,75	1,12	4,75	2,13	4,75	1,32	5	1,7	19,25	6,27	32,6 %
Clean Code	4	1,42	4	2	4	4,03	4	1,62	16	9,07	56,7 %
Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,75	1,48	1,75	1,48	84,6 %
Outros	0	4,5	0	2,33	0	1,3	0	0,83	0	8,96	0,0 %
Verificando apontamento	1,33	0,13	1,33	0,97	1,33	0,57	1,33	0,83	5,32	2,5	47,0 %
Atividades Gerenciais	1	1,35	1	0,67	1	0,47	1	0,83	4	3,32	83,0 %
Auxilio ao Desenvolvimento	1	0	1	0,25	1	0	1	0,6	4	0,85	21,2 %
Curso/Palestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Banheiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio Review	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria de Gerencia de Configuracao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxílio Desenv. Outras Equipes	0,33	1	0,33	3,37	0,33	0	0,33	0	1,32	4,37	331,1 %
Abrir o.s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correcao de Erros Externo	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Particular	0	0,92	0	0	0	0	0	0	0	0,92	0,0 %
Auxilio Comercial / Backoffice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Solicitar merge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Check List	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Merge O.S.	0,5	0	0,5	1	0,5	0	0,5	0	2	1	50,0 %

Auditoria de DD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Pre-teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Verificar o.s no nome	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Documentação	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Gerenciamento de Rede	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Preparando ambiente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Folga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Checklist dos Backups	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Recesso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Correção de Erros Interno	0,25	0	0,25	1	0,25	0	0,25	0	1	1	100,0 %
Teste Automatizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Zabbix	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auditoria da Garantia da Qualidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Manutenção Preventiva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geração de Atas	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Release Notes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atraso / Saida antecipada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Levantamento de Requisito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atualizacao de Versao	4	0,33	4	0	4	0	4	0	16	0,33	2,1 %
Feriado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Organização sala / equipamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Teste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Treinamento	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25	0	1	0	0,0 %
Manutenção de Servidores	0	0	0	0,33	0	4,05	0	0	0	4,38	0,0 %
Analise Retorno O.S.	0	0,58	0	0	0	0	0	0	0	0,58	0,0 %
Analise de O.S	0	0	0	0	0	0,25	0	0	0	0,25	0,0 %
Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Integrações de sistemas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Geracao de Baseline	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atividade Externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Auxilio suporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Análise de Sistemas H/FW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Instrutor Treinamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Atendimento GBS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Fazendo manual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	220	231,1	220	219,68	220	233,96	220	234,43	880	919,17	104,5 %

% de Horas por Atividade

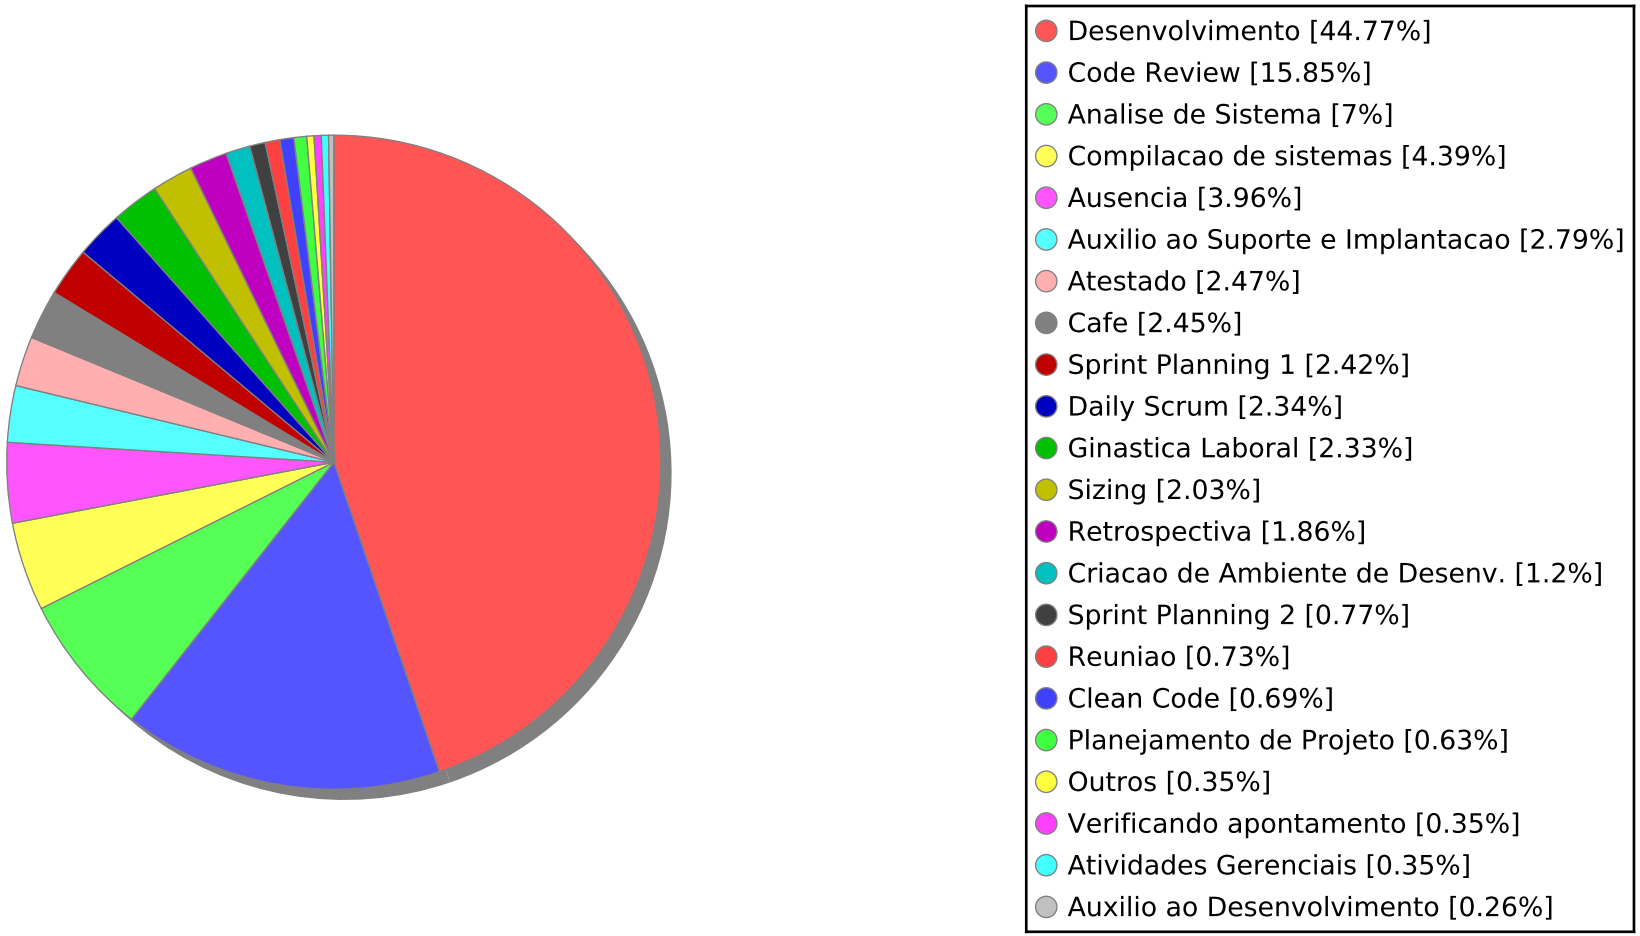

HORAS POR ÁREA DO CMMI

	Sprint 1		Sprint 2		Sprint 3		Sprint 4		Total		% HP/HR
Area CMMI	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Planejado	Realizado	Total
RD - Desenvolvimento de Requisitos	138,5	139,27	140,75	120,5	143,25	130,23	139,42	109,98	561,92	499,98	89,0 %
PMC - Monitoramento e Controle de Projeto	28,42	33,57	28,42	35,42	28,42	33,8	27,75	47	113,01	149,79	132,5 %
DIV - Diversos*	19,92	24,08	17,67	20,65	17,67	19,55	17,92	30,42	73,18	94,7	129,4 %
REQM - Gestao de Requisitos	26,83	24,3	26,83	26,92	24,33	37,22	26,83	28,63	104,82	117,07	111,7 %
CM - Gerencia de Configuracao	0,5	6,75	0,5	14,88	0,5	8,27	0,5	10,3	2	40,2	2.010,0
PP - Planejamento de Projeto	0	0	0	0	0	0	1,75	1,48	1,75	1,48	84,6 %
PI - Integracao de Produto	4	0,33	4	0	4	0	4	0	16	0,33	2,1 %
PPQA - Garantia da Qualidade de Processo e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
OT - Treinamento na Organizacao	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %
Total Geral	218,17	228,3	218,17	218,37	218,17	229,07	218,17	227,81	872,68	903,55	103,5 %

% de Horas por Área do CMMI

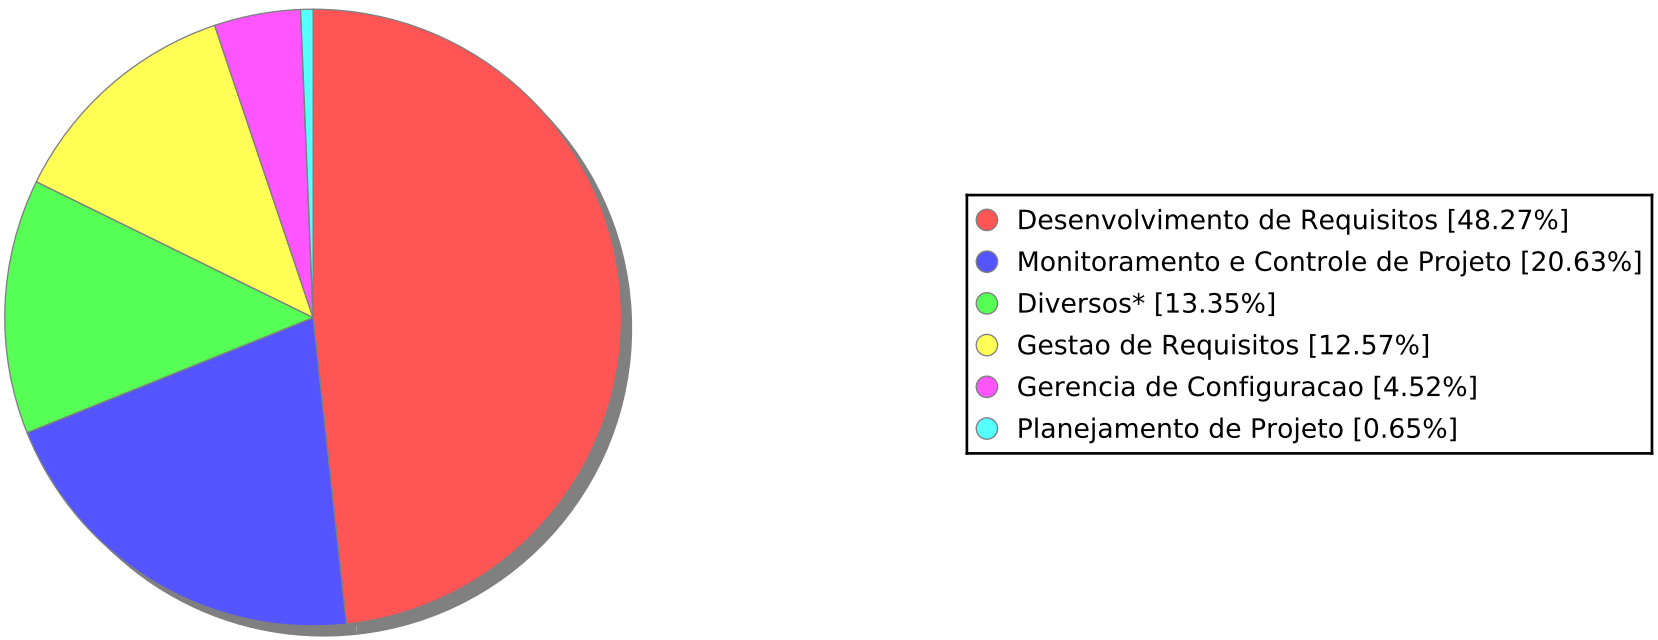

INDICADORES DO PROJETO

	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603
01. Horas planejadas de todas atividades	972h00m	880h00m	880h00m	712h00m	531h00m	624h00m	760h00m	880h00m
02. Horas realizadas de todas atividades	1031h19m	977h42m	945h46m	774h53m	588h21m	642h30m	772h50m	919h08m
03. Horas planejadas de desenvolvimento	687h30m	615h45m	610h47m	477h55m	362h10m	467h15m	562h08m	645h10m
04. Horas realizadas de desenvolvimento	609h08m	602h21m	544h09m	397h01m	349h29m	379h56m	503h09m	563h33m
05. Pontos planejados para o projeto	205,0	188,0	186,0	145,0	110,0	4,0	171,0	4,0
06. Pontos planejados	219,0	196,0	235,5	161,0	108,5	154,5	228,5	293,0
07. Pontos entregues	187,5	185	171,5	123,5	111,5	121,5	155	182
08. Pontos entregues (apenas Tarefa)	146,50	113,50	154,50	109,00	91,50	86,50	137,50	136,00
09. Pontos entregues (apenas NP)	41,00	71,50	17,00	14,50	20,00	35,00	17,50	46,00
10. Pontos entregues (apenas Erro)	9	0	3	0	2	0	0	0
11. Quantidade de tickets entregues (apenas Tarefa)	30	25	38	31	20	32	49	25
12. Quantidade de tickets entregues (apenas NP)	32	51	20	10	22	13	22	46
13. Quantidade de tickets entregues (apenas Erro)	3	0	1	0	1	0	0	0
14. Horas de correção de bug	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m	0h00m
15. Pontos de retrabalho	2,5	0	1	0	1	0	0	0
16. Produtividade planejada	0,319	0,319	0,386	0,337	0,300	0,331	0,407	0,455
17. Produtividade realizada	0,308	0,308	0,316	0,312	0,320	0,320	0,309	0,323
18. % Pontos entregues / Pontos planej. para o projeto	91,5	98,5	92,3	85,2	101,4	3037,5	90,7	4550
19. % Pontos NP / Pontos entregues	21,9	38,7	10	11,8	18	28,9	11,3	25,3

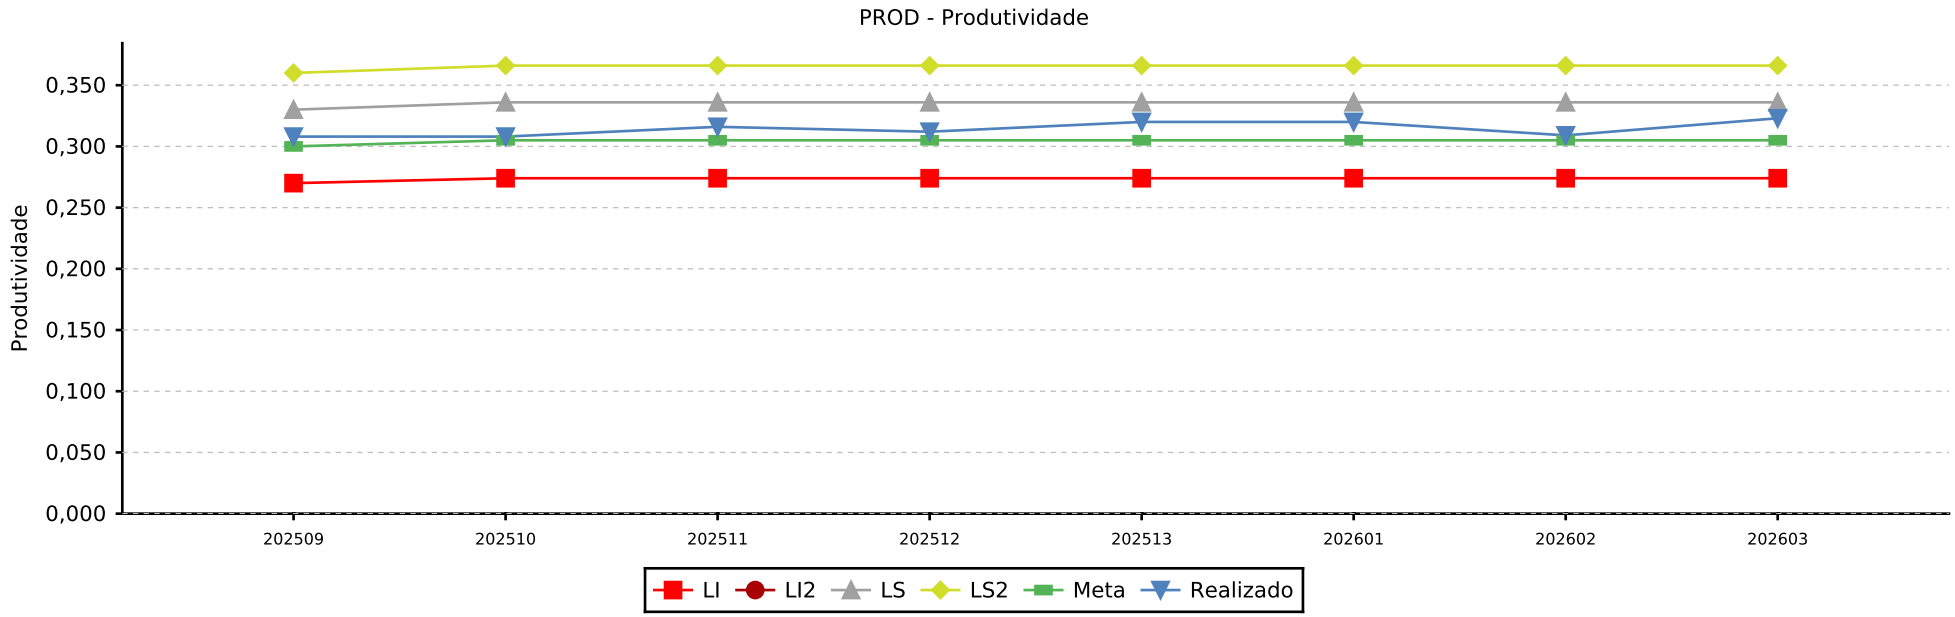

	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603
Realizado	0,308	0,308	0,316	0,312	0,320	0,320	0,309	0,323
Meta	0,300	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305	0,305
LS2	0,360	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366	0,366
LS	0,330	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336	0,336
LI2								
LI	0,270	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274	0,274

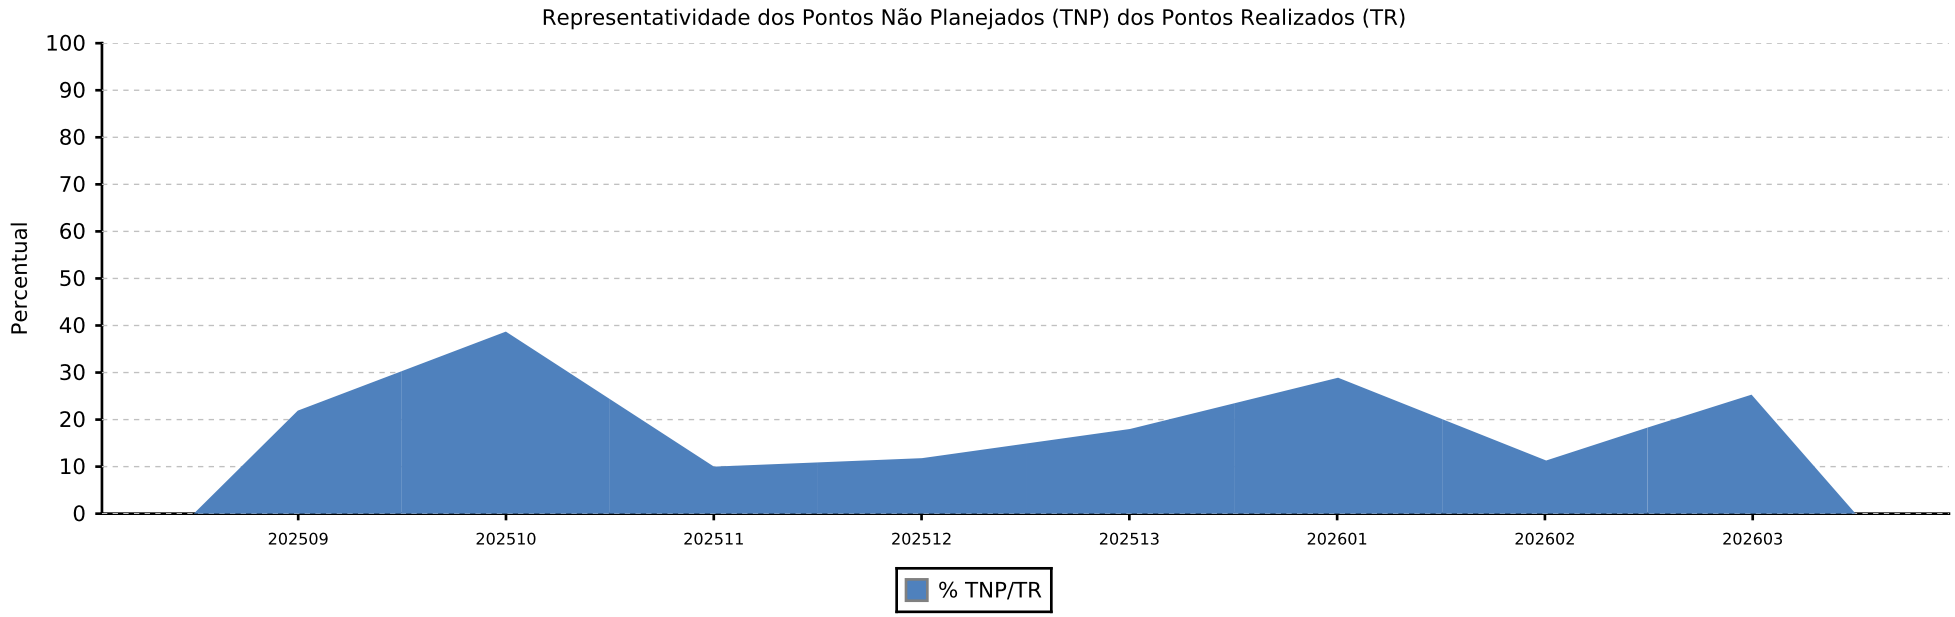

	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603
TR - Pontos Realizados	187.5	185	171.5	123.5	111.5	121.5	155	182
TNP - Pontos Não Planejados	41	71.5	17	14.5	20	35	17.5	46
% TNP/TR	21,9	38,7	10,0	11,8	18,0	28,9	11,3	25,3

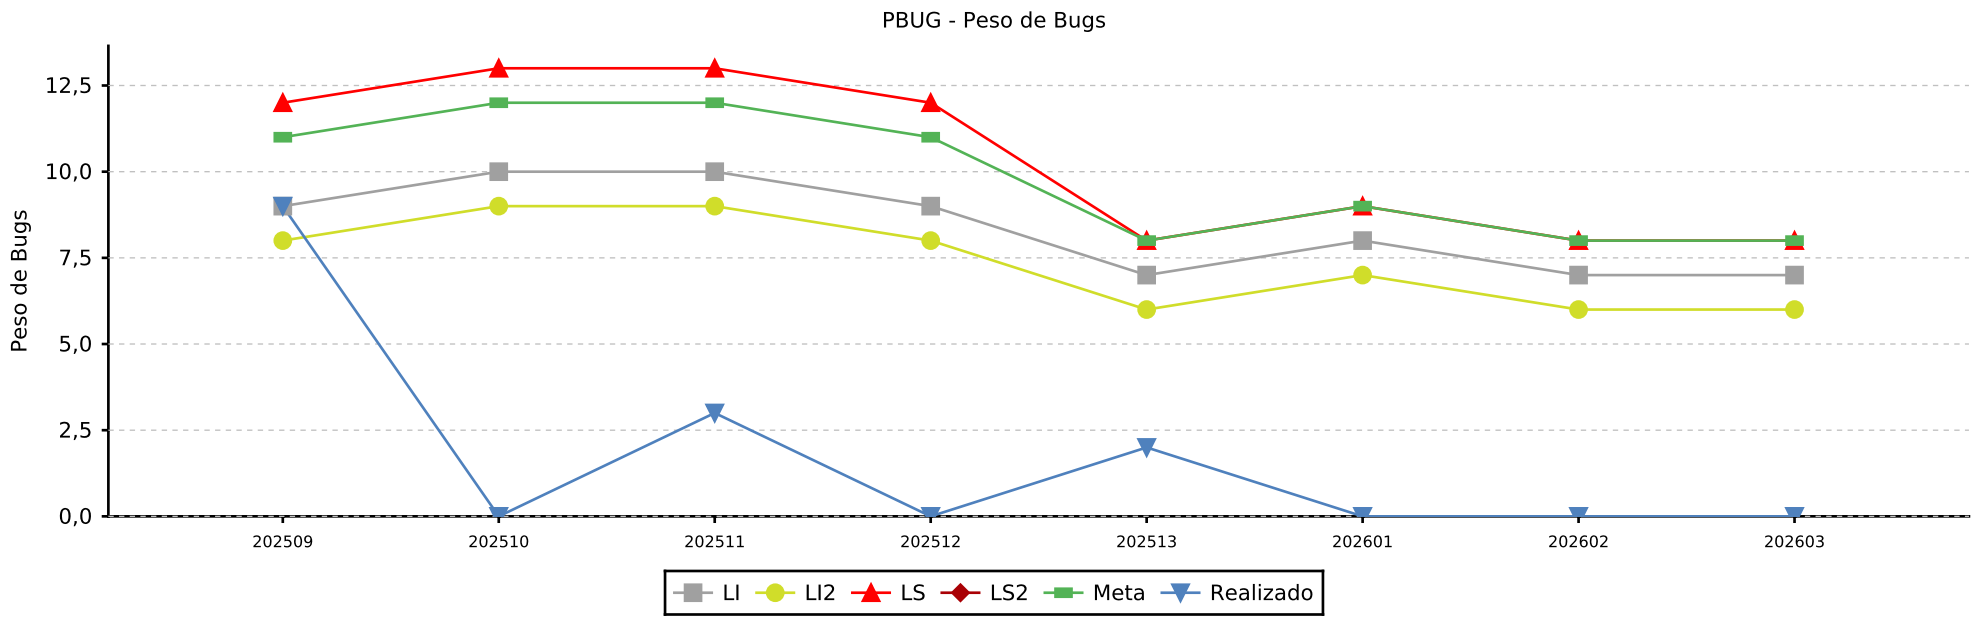

	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603
Realizado	9	0	3	0	2	0	0	0
Meta	11	12	12	11	8	9	8	8
LS2								
LS	12	13	13	12	8	9	8	8
LI2	8	9	9	8	6	7	6	6
LI	9	10	10	9	7	8	7	7
Pontos Entregues	187.5	185	171.5	123.5	111.5	121.5	155	182
% PBUG / TR	4,80	0,00	1,75	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00

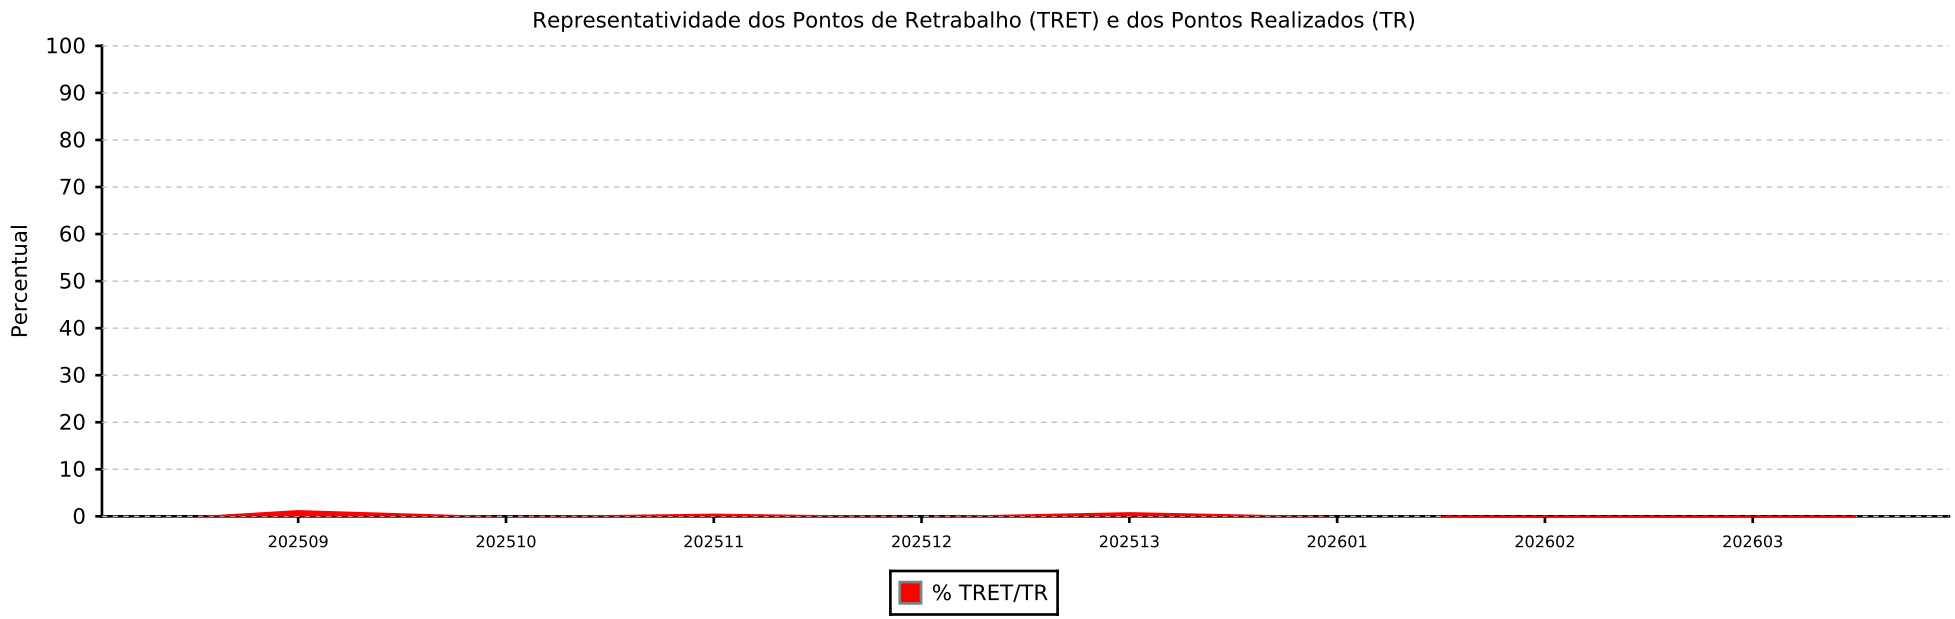

	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603
TR - Pontos Realizados	187.5	185	171.5	123.5	111.5	121.5	155	182
TRET - Pontos de Retrabalho	2.5	0	1	0	1	0	0	0
% TRET/TR	1,3	0,0	0,6	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0

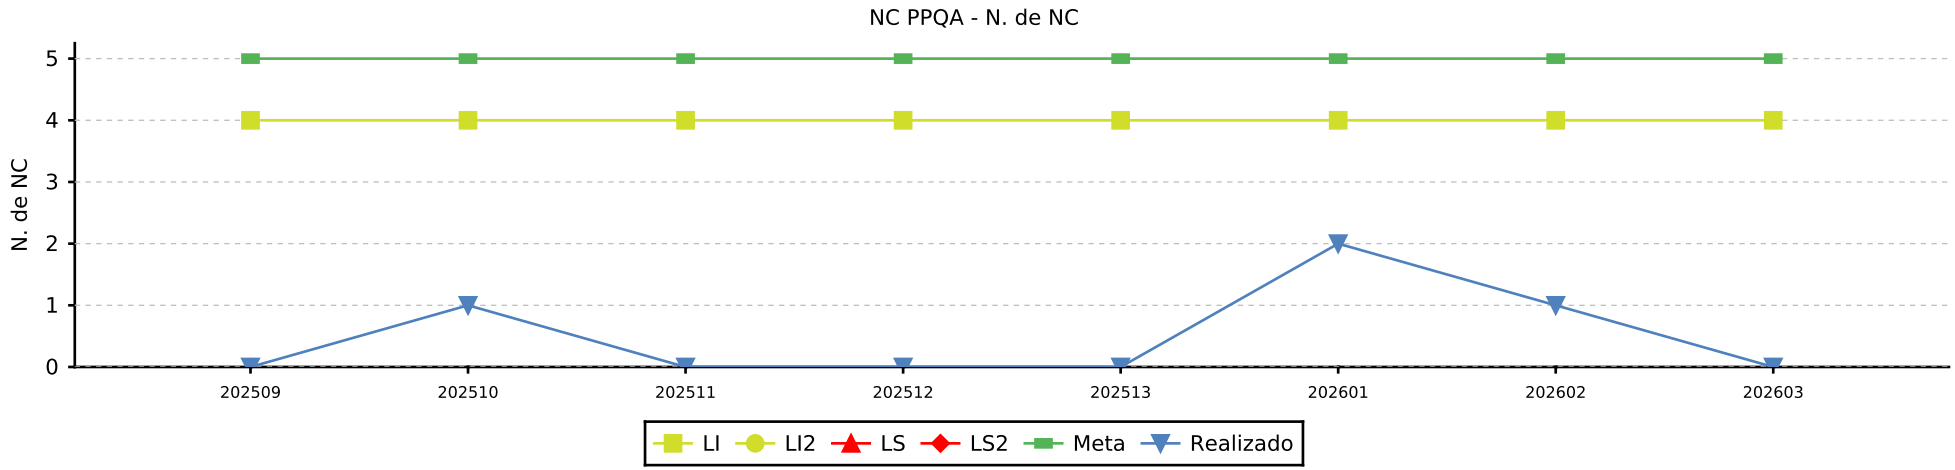

	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603
Realizado	0	1	0	0	0	2	1	0
Meta	5	5	5	5	5	5	5	5
LS2								
LS								
LI2								
LI	4	4	4	4	4	4	4	4

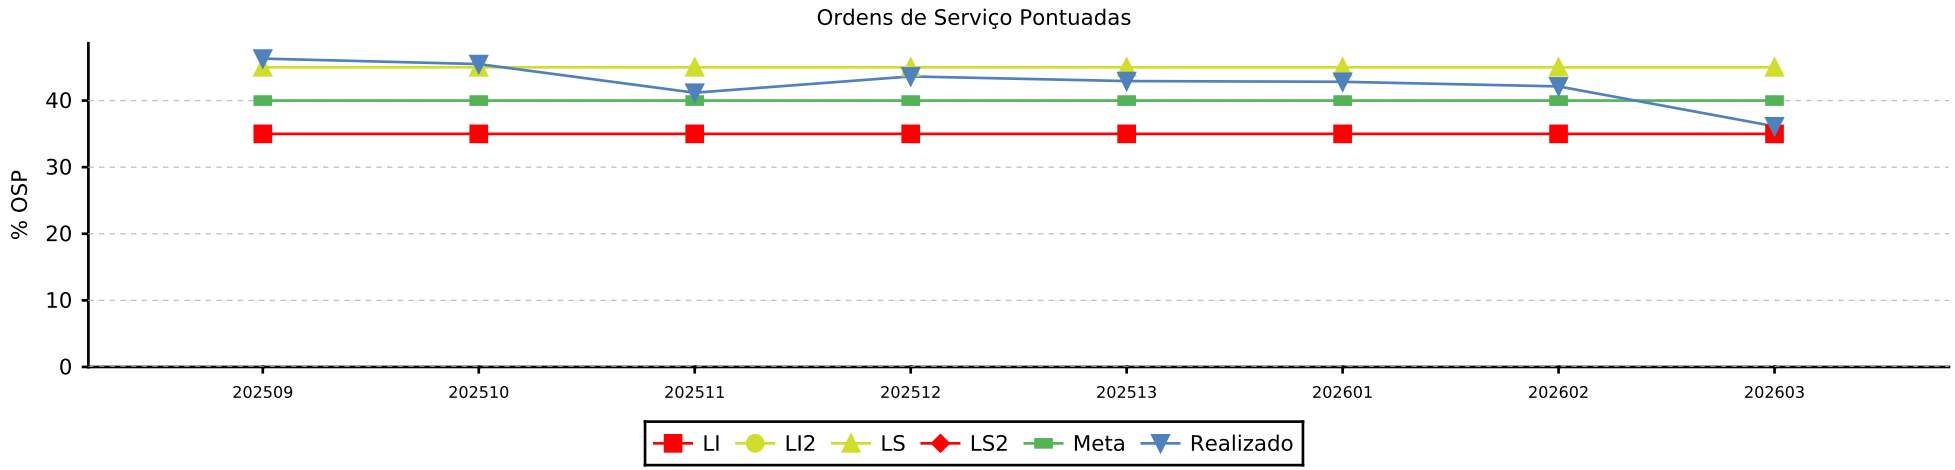

	202509	202510	202511	202512	202513	202601	202602	202603
Realizado	46.3	45.48	41.18	43.62	42.93	42.82	42.13	36.14
Meta	40	40	40	40	40	40	40	40
LS2	0	0	0	0	0	0	0	0
LS	45	45	45	45	45	45	45	45
LI2	0	0	0	0	0	0	0	0
LI	35	35	35	35	35	35	35	35

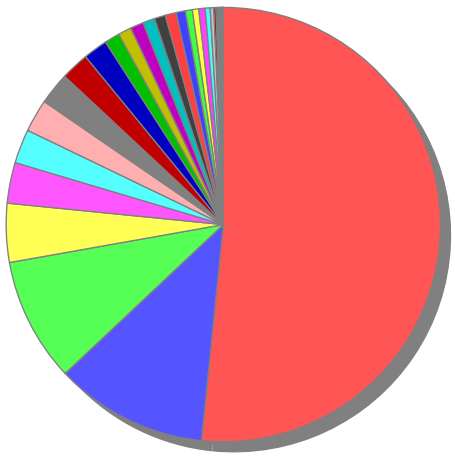

% de Horas por Atividade

- Desenvolvimento [51.6%]
- Code Review [11.38%]
- Analise de Sistema [9.22%]
- Compilacao de sistemas [4.37%]
- Ausencia [3.03%]
- Daily Scrum [2.54%]
- Cafe [2.44%]
- Retrospectiva [2.38%]
- Sprint Planning 1 [2.1%]
- Ginastica Laboral [1.81%]
- Criacao de Ambiente de Desenv. [1.13%]
- Clean Code [0.99%]
- Outros [0.98%]
- Auxilio ao Suporte e Implantacao [0.89%]
- Sprint Planning 2 [0.83%]
- Atestado [0.82%]
- Reuniao [0.68%]
- Sizing [0.52%]
- Manutenção de Servidores [0.48%]
- Auxílio Desenv. Outras Equipes [0.48%]
- Atividades Gerenciais [0.36%]
- Verificando apontamento [0.27%]
- Planejamento de Projeto [0.16%]
- Merge O.S. [0.11%]
- Correção de Erros Interno [0.11%]
- Particular [0.1%]
- Auxilio ao Desenvolvimento [0.09%]
- Analise Retorno O.S. [0.06%]
- Atualizacao de Versao [0.04%]
- Analise de O.S [0.03%]
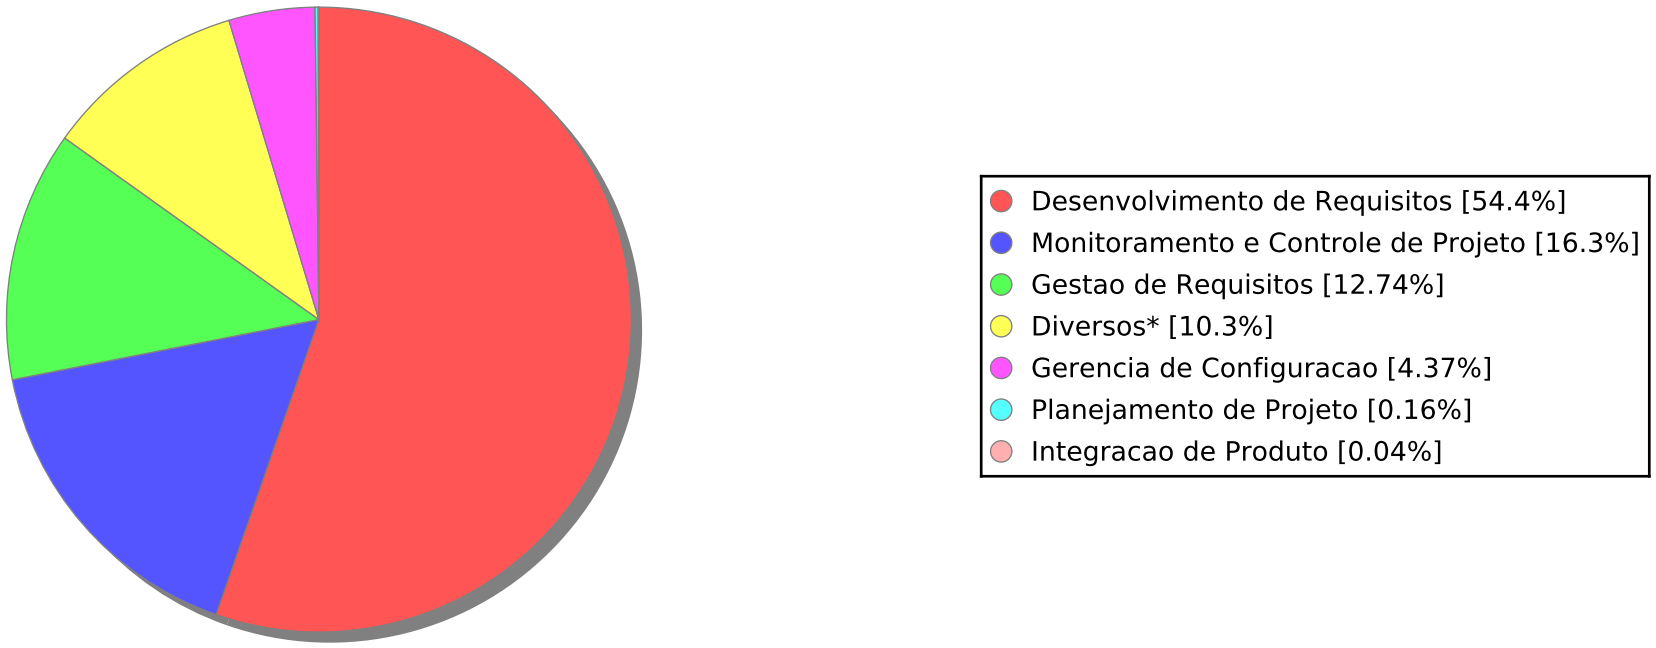
% de Horas por Área do CMMI
